

RAPPORT D'ESSAI D'ETANCHEITE N° PUI2510211530CR2

Commune : PUISSESGUIER
Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE
Numéro de dossier : PUI2510211530CR2
Date du chantier : 25/10/2021 et 26/10/2021

Maître d'ouvrage :
Maître d'oeuvre : ENTECH
Autorité responsable :
Entreprise T.P. : ROGER TP
Client : MAIRIE DE PUISSESGUIER

Objectif des contrôles : Réception de travaux
Nature des effluents : Eaux usées

Nombre de rapports : 13+7 Br	Nb de contrôles effectifs : 12+7 Br	Nombre d'anomalies : 0
- Canalisations : 6+7 Br	- Canalisations : 6+7 Br	- Canalisations : 0
- Branchements indiv. : 0	- Branchements indiv. : 0	- Branchements indiv. : 0
- Regards : 7	- Regards : 6	- Regards : 0
- Boîtes d'inspection : 0	- Boîtes d'inspection : 0	- Boîtes d'inspection : 0
- Boîtes de branch. : 0	- Boîtes de branch. : 0	- Boîtes de branch. : 0
- Joints : 0	- Joints : 0	- Joints : 0

Observations particulières :
Réception finale d'une nouvelle construction par essais d'étanchéité à l'air.
Aucune anomalie d'étanchéité constatée sur l'ensemble du réseau inspecté.
Pièce jointe : schéma de principe.

Approuvé par : K.CHRISTOL
Le : 02/11/2021
Visa :

RAPPORT D'ESSAIS N° PUI2510211530CR2

Client : MAIRIE DE PUISSEGUIER
Maître d'Ouvrage :
Maître d'Œuvre : ENTECH
Entrepreneur(s) TP : ROGER TP
Commune : PUISSEGUIER
Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE
Date des essais : 25/10/2021 et 26/10/2021

TABLEAU DE SYNTHESE DES ESSAIS

N°	Page N°	Ouvrage	Description				Date d'essai	Méthode		Résultat
			Dimensions/ Diam.(mm)	Longueur testée/totale	Matériau	Branchements Nb Long(m)		Air	Eau	
1	3	Cana. R1 - R2	200	5.30/6.90ml	PVC-U	1 2.80	25/10/2021	LC		CONFORME
2	4	Cana. R2 - R3	200	32.10/33.70ml	PVC-U	4 6.10	25/10/2021	LC		CONFORME
3	5	Cana. R3 - R4	200	42.40/44.00ml	PVC-U	1 2.30	26/10/2021	LC		CONFORME
4	6	Cana. R4 - R5	200	43.10/44.70ml	PVC-U	0 0.00	26/10/2021	LC		CONFORME
5	7	Cana. R6 - R5	200	44.80/46.40ml	PVC-U	1 2.00	26/10/2021	LC		CONFORME
6	8	Cana. R6 - R7	200	60.20/61.80ml	PVC-U	0 0.00	26/10/2021	LC		CONFORME
7	10	Regard R1	800	1.20/1.50m	Béton	0 0.00	26/10/2021	LB		CONFORME
8	12	Regard R2	800	1.10/1.40m	Béton	0 0.00	26/10/2021	LB		CONFORME
9	14	Regard R3	800	0.77/1.07m	Béton	0 0.00	26/10/2021	LB		CONFORME
10	16	Regard R4	800	0.82/1.12m	Béton	0 0.00	26/10/2021	LB		CONFORME
11	18	Regard R5	800	0.81/1.11m	Béton	0 0.00	26/10/2021	LB		CONFORME
12	20	Regard R6	800	0.95/1.25m	Béton	0 0.00	26/10/2021	LB		CONFORME
13	22	Regard R7	800	1.20/1.49m	Béton	0 0.00	26/10/2021	LB		ARRETE

Nombre de tronçons testés selon EN1610* : 6 soit 237.50m avec 7 branchements en culotte soit 13.20m
 Nombre de regards testés* : 7 soit 8.94m
 Nombre de boîtes d'inspection testées* : 0 soit 0.00m
 Nombre de boîtes de branchements testées* : 0 soit 0.00m
 Nombre de branchements sur collecteurs* : 0 soit 0.00m
 Nombre de branchements en regards* : 0 soit 0.00m
 Nombre de tronçons testés à haute pression : 0 soit 0.00m
 Nombre de joints testés : 0
 Nombre total : 13 soit 246.44m avec 7 branchements soit 13.20m

*Sauf cas des tests "Non Standards", les essais ont été réalisés suivant
 la norme européenne retranscrite en norme française NF EN1610 d'octobre 2015
 "Mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs d'assainissement"
 Méthode "L" pour les contrôles d'étanchéité à l'air.
 (Rappel : LA = 10mB-7,5mB LB = 50mB-40mB LC = 100mB-85mB LD = 200mB-185mB)

NON FAIT = Non réalisé
 NON CONF. = Non conforme
 PRESS IMP. = Pressurisation impossible
 ARRETE = Interruption par l'opérateur
 NON REA. = Non réalisable
 URGENCE = Non conforme - Arrêt d'urgence


ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 1
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai :	25/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	16:28:07	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DE LA CANALISATION R1 - R2

Protocole :	LC 100mBar	Branch.	Long.(m)	Diam.(mm)	Matériau	Dist.(m)	Position
Pression de départ :	100 mBar	B1	2.80	160	PVC		12 h
Chute de pression tolérée :	15.0 mBar						
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s						
Durée du test prévue :	180 s						
Durée du test effective :	180 s						
Pression finale :	99.5 mBar						
Nature des effluents :	Eaux usées						
Type de réseau :	Gravitaire						
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé						
Matériau :	PVC-U						
Diamètre :	200 mm						
Distance du regard de départ :	6.90 mètres						
Branchement(s) raccordé(s) :	1 unité						
Emplacement :	Sous une route						
Ouvrage sous nappe :	Non						
Etat de la voirie :	Voirie existante						
Etat du remblai :	Terminé						
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)						
Opérateur :	F. GOSP						

Résultat de l'essai : **CONFORME**

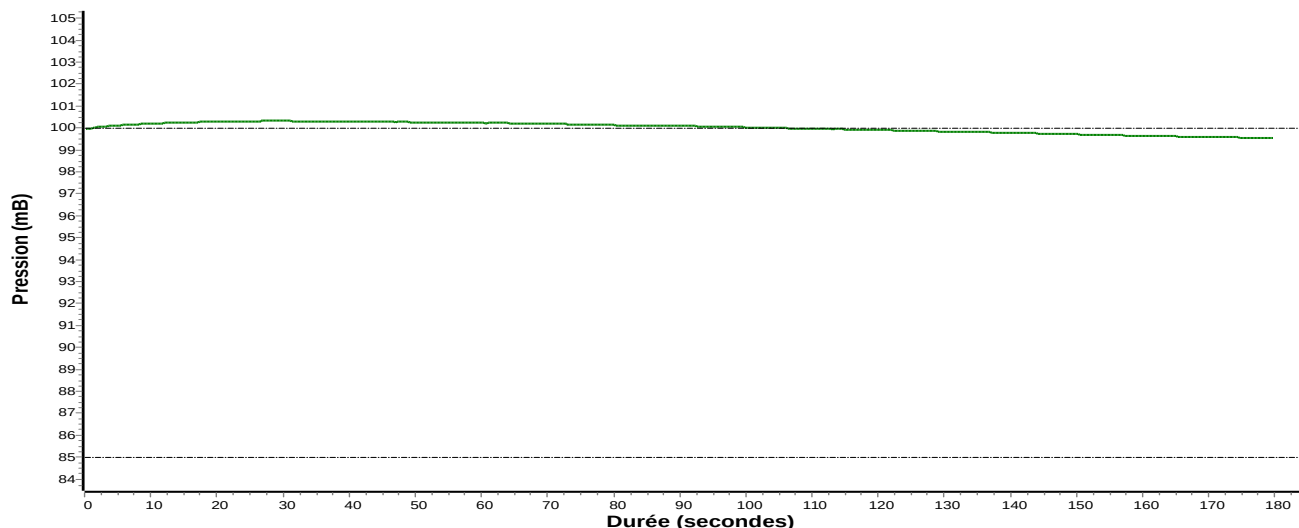


ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 2
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai :	25/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	16:45:10	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DE LA CANALISATION R2 - R3

Protocole :	LC 100mBar	Branch.	Long.(m)	Diam.(mm)	Matériau	Dist.(m)	Position
Pression de départ :	100 mBar	B2	0.90	160	PVC		12 h
Chute de pression tolérée :	15.0 mBar	B3	2.20	160	PVC		12 h
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s	B4	2.30	160	PVC		12 h
Durée du test prévue :	180 s	B5	0.70	160	PVC		12 h
Durée du test effective :	180 s						
Pression finale :	96.7 mBar						
Nature des effluents :	Eaux usées						
Type de réseau :	Gravitaire						
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé						
Matériau :	PVC-U						
Diamètre :	200 mm						
Distance du regard de départ :	33.70 mètres						
Branchement(s) raccordé(s) :	4 unités						
Emplacement :	Sous une route						
Ouvrage sous nappe :	Non						
Etat de la voirie :	Voirie existante						
Etat du remblai :	Terminé						
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)						
Opérateur :	F. GOSP						

Résultat de l'essai : **CONFORME**

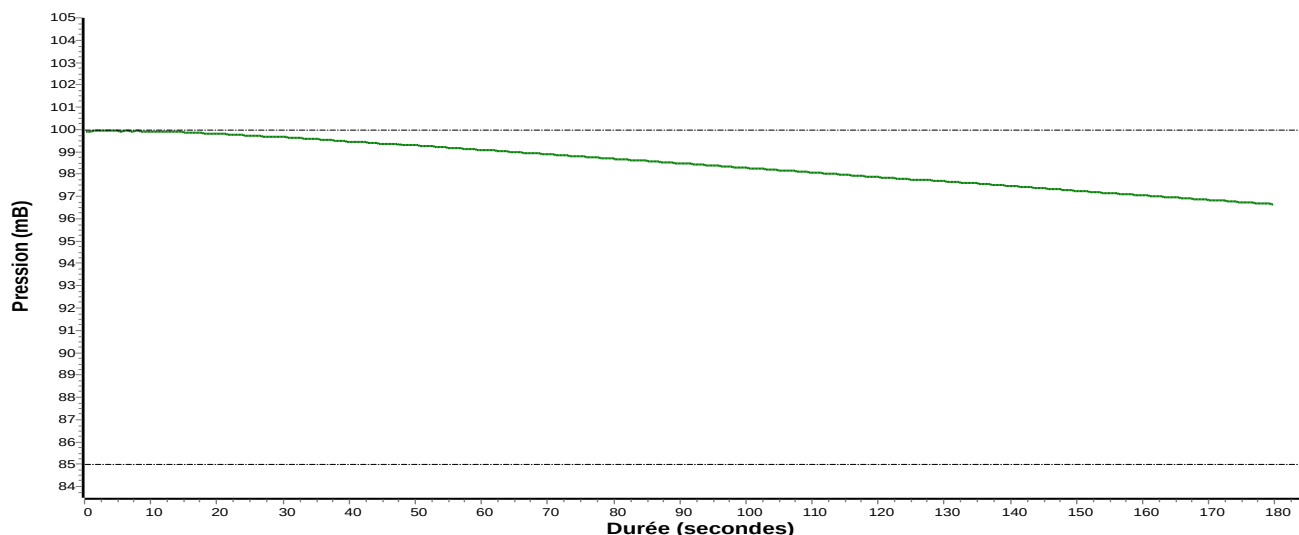


ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 3
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	09:28:02	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DE LA CANALISATION R3 - R4

Protocole :	LC 100mBar	Branch.	Long.(m)	Diam.(mm)	Matériau	Dist.(m)	Position
Pression de départ :	100 mBar	B6	2.30	160	PVC		12 h
Chute de pression tolérée :	15.0 mBar						
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s						
Durée du test prévue :	180 s						
Durée du test effective :	180 s						
Pression finale :	100.3 mBar						
Nature des effluents :	Eaux usées						
Type de réseau :	Gravitaire						
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé						
Matériau :	PVC-U						
Diamètre :	200 mm						
Distance du regard de départ :	44.00 mètres						
Branchement(s) raccordé(s) :	1 unité						
Emplacement :	Sous une route						
Ouvrage sous nappe :	Non						
Etat de la voirie :	Voirie existante						
Etat du remblai :	Terminé						
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)						
Opérateur :	F. GOSP						

Résultat de l'essai : **CONFORME**

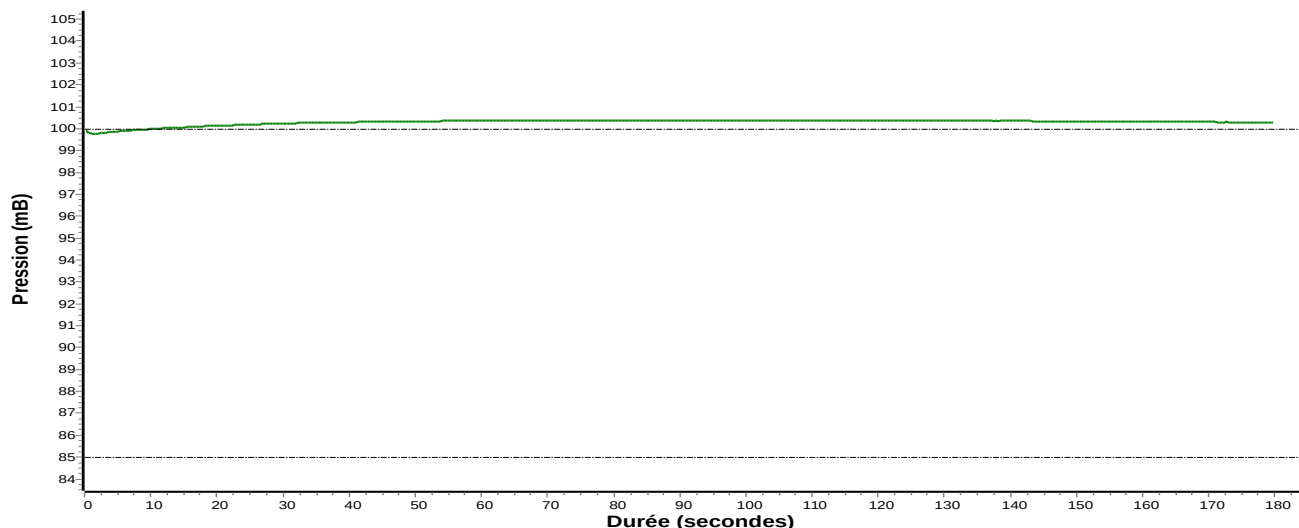


Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	09:58:42	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DE LA CANALISATION R4 - R5

Protocole :	LC 100mBar
Pression de départ :	100 mBar
Chute de pression tolérée :	15.0 mBar
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s
Durée du test prévue :	180 s
Durée du test effective :	180 s
Pression finale :	100.4 mBar
Nature des effluents :	Eaux usées
Type de réseau :	Gravitaire
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé
Matériau :	PVC-U
Diamètre :	200 mm
Distance du regard de départ :	44.70 mètres
Branchement(s) raccordé(s) :	Aucun
Emplacement :	Sous une route
Ouvrage sous nappe :	Non
Etat de la voirie :	Voirie existante
Etat du remblai :	Terminé
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)
Opérateur :	F. GOSP

Résultat de l'essai : **CONFORME**

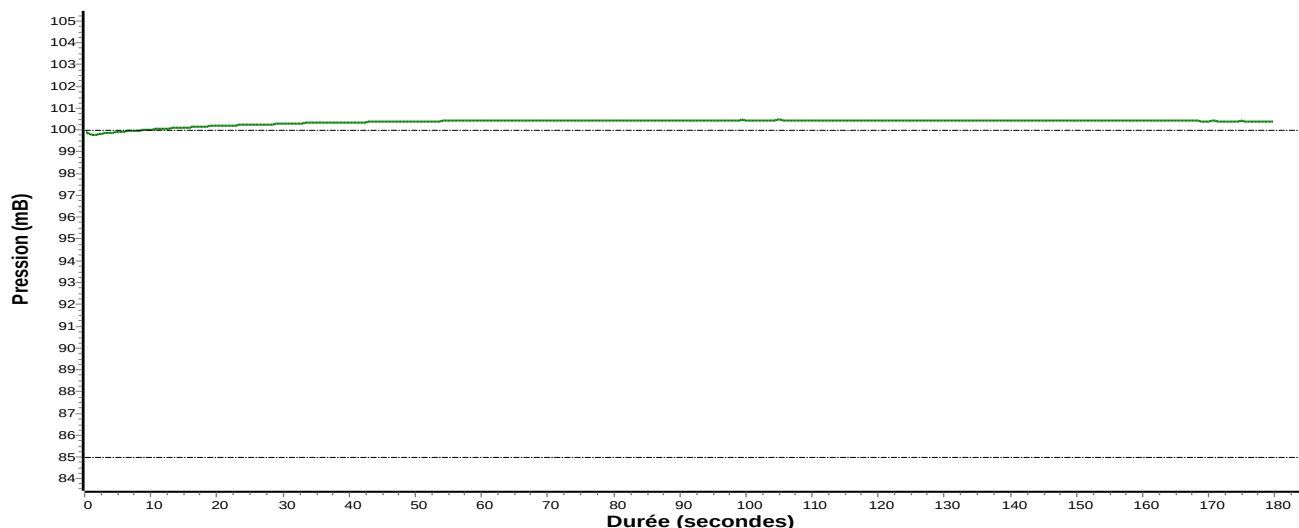


ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 5
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	10:33:03	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DE LA CANALISATION R6 - R5

Protocole :	LC 100mBar	Branch.	Long.(m)	Diam.(mm)	Matériau	Dist.(m)	Position
Pression de départ :	100 mBar	B7	2.00	160	PVC		12 h
Chute de pression tolérée :	15.0 mBar						
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s						
Durée du test prévue :	180 s						
Durée du test effective :	180 s						
Pression finale :	100.2 mBar						
Nature des effluents :	Eaux usées						
Type de réseau :	Gravitaire						
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé						
Matériau :	PVC-U						
Diamètre :	200 mm						
Distance du regard de départ :	46.40 mètres						
Branchement(s) raccordé(s) :	1 unité						
Emplacement :	Sous une route						
Ouvrage sous nappe :	Non						
Etat de la voirie :	Voirie existante						
Etat du remblai :	Terminé						
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)						
Opérateur :	F. GOSP						

Résultat de l'essai : **CONFORME**

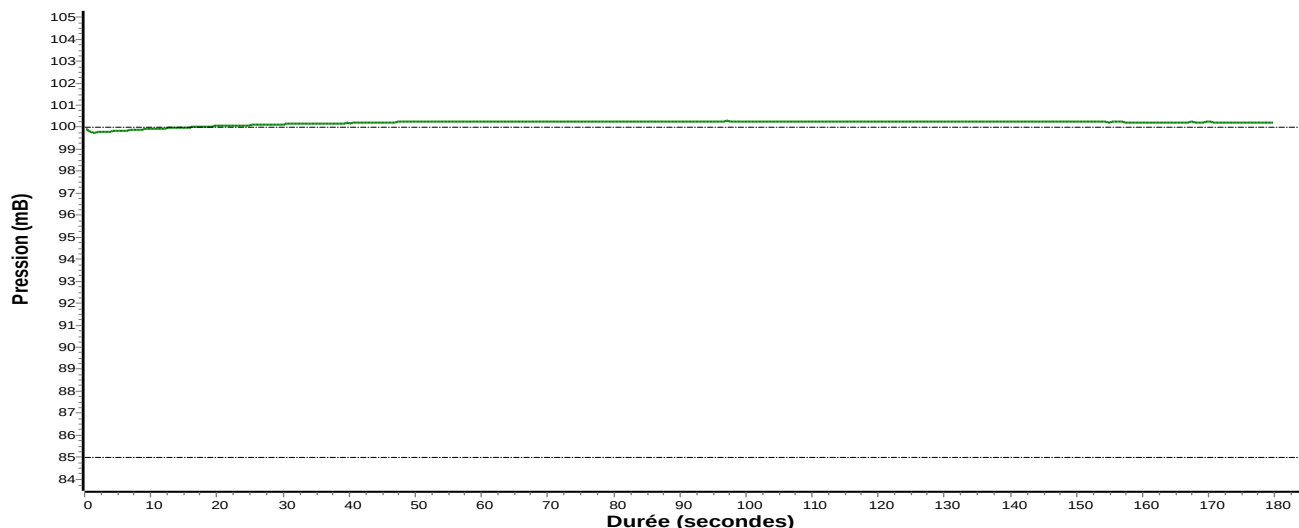


Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	10:56:15	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DE LA CANALISATION R6 - R7

Protocole :	LC 100mBar
Pression de départ :	100 mBar
Chute de pression tolérée :	15.0 mBar
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s
Durée du test prévue :	180 s
Durée du test effective :	180 s
Pression finale :	100.5 mBar
Nature des effluents :	Eaux usées
Type de réseau :	Gravitaire
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé
Matériau :	PVC-U
Diamètre :	200 mm
Distance du regard de départ :	61.80 mètres
Branchement(s) raccordé(s) :	Aucun
Emplacement :	Sous une route
Ouvrage sous nappe :	Non
Etat de la voirie :	Voirie existante
Etat du remblai :	Terminé
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)
Opérateur :	F. GOSP

Résultat de l'essai : **CONFORME**

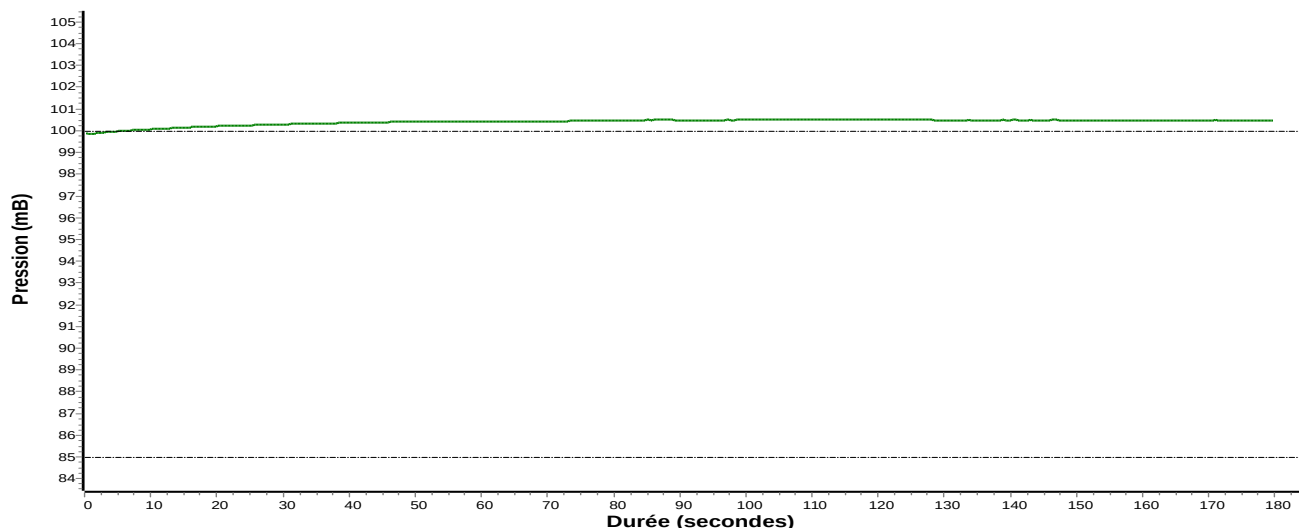


ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 7
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	13:27:54	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R1

Protocole :	LB 50mBar
Pression de départ :	50 mBar
Chute de pression tolérée :	10.0 mBar
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s
Durée du test prévue :	330 s
Durée du test effective :	330 s
Pression finale :	49.4 mBar
Nature des effluents :	Eaux usées
Type de réseau :	Gravitaire
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé
Matériau :	Béton
Imprégnation :	Sans
Diamètre :	800 mm
Profondeur testée/totale :	1.20/1.50 mètres
Branchement(s) raccordé(s) :	Aucun
Emplacement :	Sous une route
Ouvrage sous nappe :	Non
Etat de la voirie :	Voirie existante
Etat du remblai :	Terminé
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)
Opérateur :	F. GOSP
Observations :	
Testé sur réhausse conique.	



Résultat de l'essai : **CONFORME**

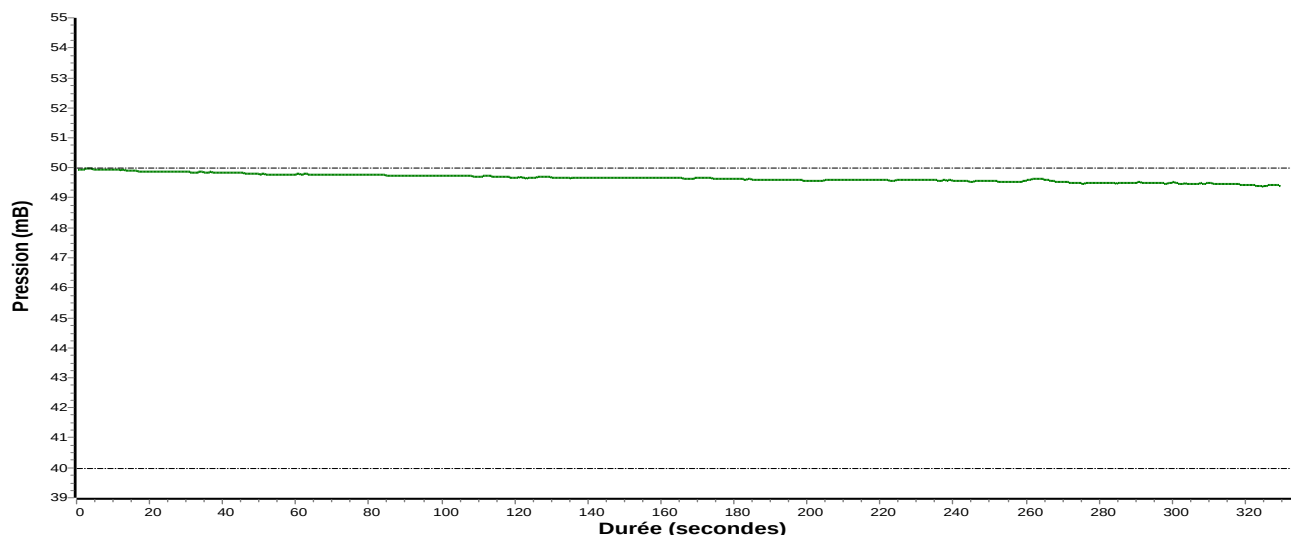

Date de l'essai : 26/10/2021
Heure de l'essai : 13:27:54
Date de saisie : N/A
Commune : PUISSESGUIER
Latitude :
Maître d'oeuvre : ENTECH
Entreprise T.P. : ROGER TP

Numéro de console : 487-1706
Numéro de capteur : 106630/19
Etalonnage le : 19/10/2020
Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE
Longitude :
Maître d'ouvrage :
Client : MAIRIE DE PUISSESGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R1

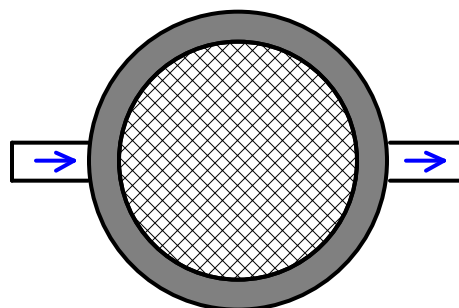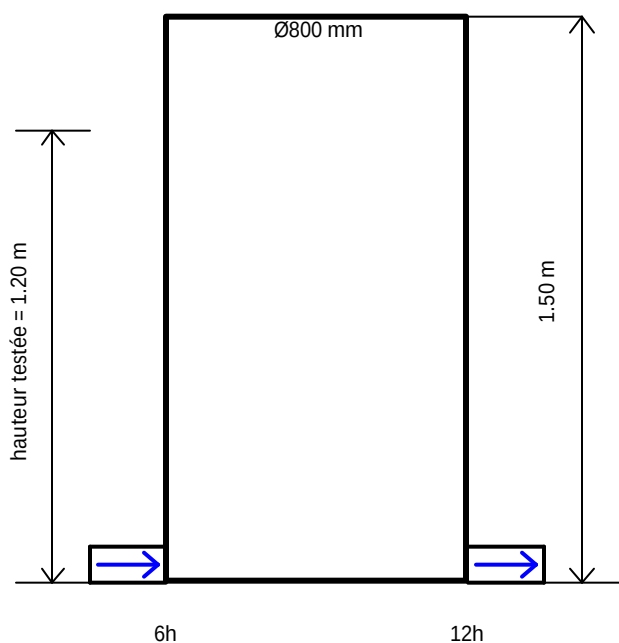


ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 8
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	13:04:07	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R2

Protocole :	LB 50mBar
Pression de départ :	50 mBar
Chute de pression tolérée :	10.0 mBar
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s
Durée du test prévue :	330 s
Durée du test effective :	330 s
Pression finale :	49.3 mBar
Nature des effluents :	Eaux usées
Type de réseau :	Gravitaire
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé
Matériau :	Béton
Imprégnation :	Sans
Diamètre :	800 mm
Profondeur testée/totale :	1.10/1.40 mètres
Branchement(s) raccordé(s) :	Aucun
Emplacement :	Sous une route
Ouvrage sous nappe :	Non
Etat de la voirie :	Voirie existante
Etat du remblai :	Terminé
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)
Opérateur :	F. GOSP
Observations :	
Testé sur réhausse conique.	



Résultat de l'essai : **CONFORME**

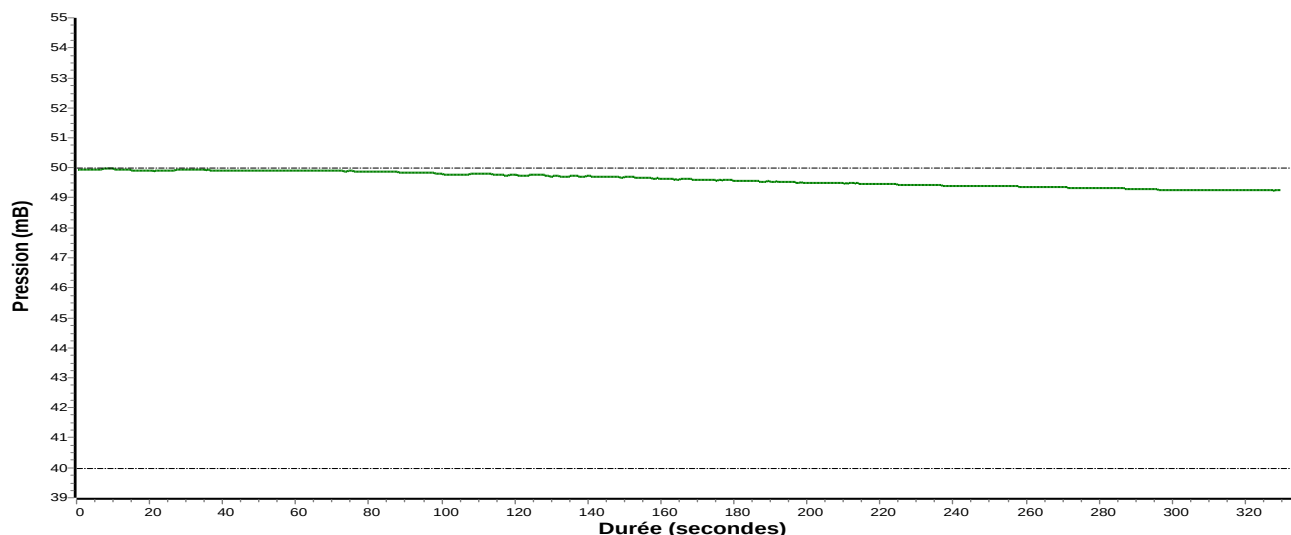

Date de l'essai : 26/10/2021
Heure de l'essai : 13:04:07
Date de saisie : N/A
Commune : PUISSESGUIER
Latitude :
Maître d'oeuvre : ENTECH
Entreprise T.P. : ROGER TP

Numéro de console : 487-1706
Numéro de capteur : 106630/19
Etalonnage le : 19/10/2020
Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE
Longitude :
Maître d'ouvrage :
Client : MAIRIE DE PUISSESGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R2

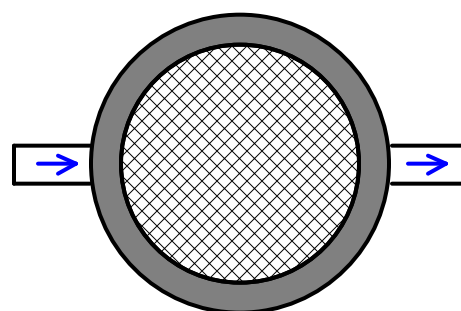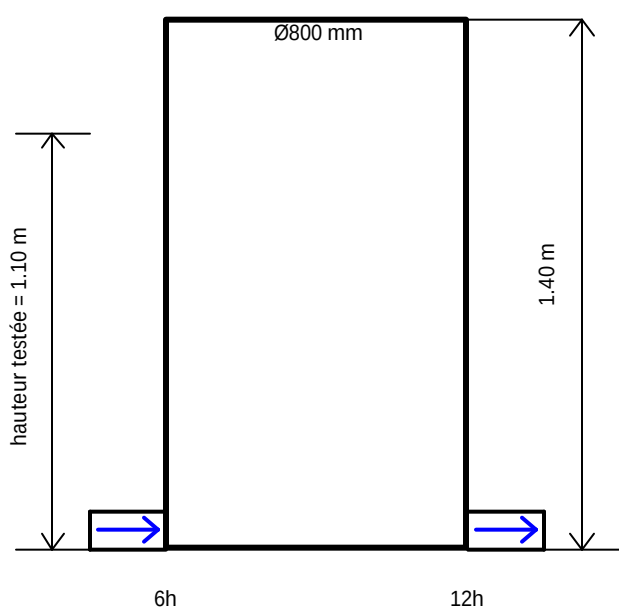


Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	12:38:45	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R3

Protocole :	LB 50mBar
Pression de départ :	50 mBar
Chute de pression tolérée :	10.0 mBar
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s
Durée du test prévue :	330 s
Durée du test effective :	330 s
Pression finale :	49.4 mBar
Nature des effluents :	Eaux usées
Type de réseau :	Gravitaire
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé
Matériau :	Béton
Imprégnation :	Sans
Diamètre :	800 mm
Profondeur testée/totale :	0.77/1.07 mètres
Branchement(s) raccordé(s) :	Aucun
Emplacement :	Sous une route
Ouvrage sous nappe :	Non
Etat de la voirie :	Voirie existante
Etat du remblai :	Terminé
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)
Opérateur :	F. GOSP
Observations :	Testé sur réhausse conique.

Résultat de l'essai : **CONFORME**


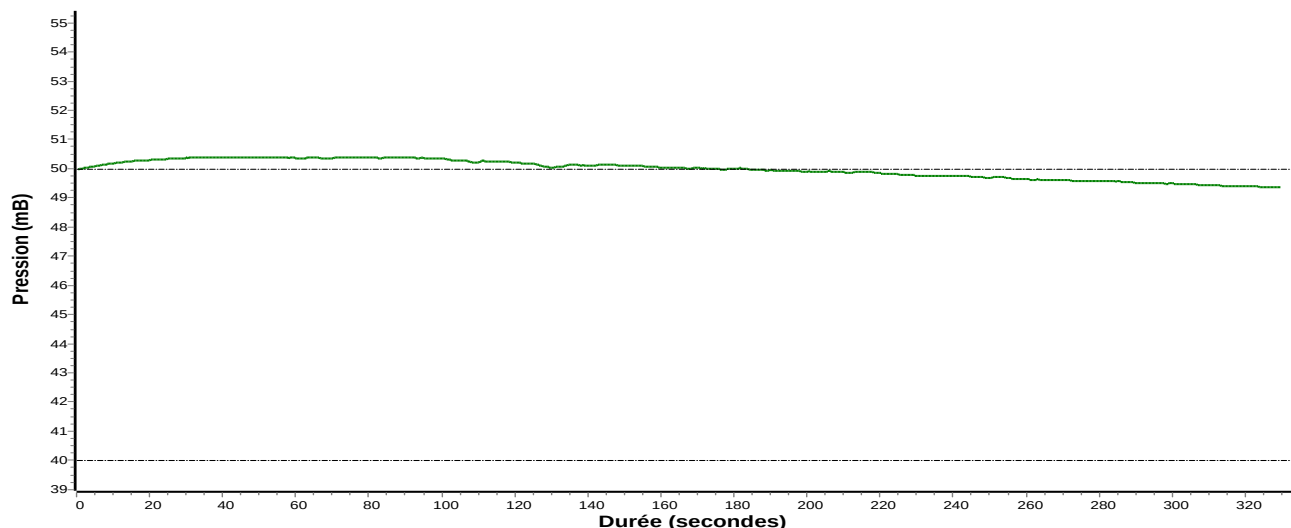


ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 9
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai : 26/10/2021
Heure de l'essai : 12:38:45
Date de saisie : N/A
Commune : PUISSESGUIER
Latitude :
Maître d'oeuvre : ENTECH
Entreprise T.P. : ROGER TP

Numéro de console : 487-1706
Numéro de capteur : 106630/19
Etalonnage le : 19/10/2020
Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE
Longitude :
Maître d'ouvrage :
Client : MAIRIE DE PUISSESGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R3

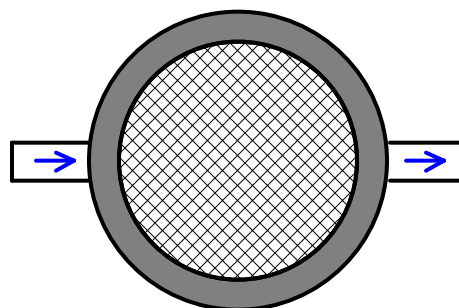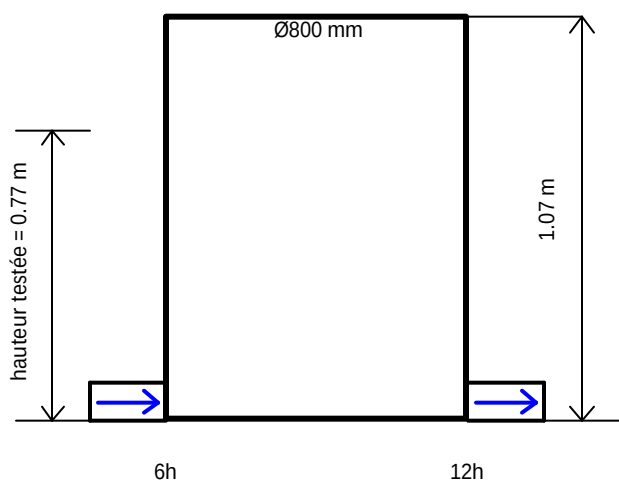


ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 10
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	12:23:33	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R4

Protocole :	LB 50mBar
Pression de départ :	50 mBar
Chute de pression tolérée :	10.0 mBar
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s
Durée du test prévue :	330 s
Durée du test effective :	330 s
Pression finale :	49.5 mBar
Nature des effluents :	Eaux usées
Type de réseau :	Gravitaire
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé
Matériau :	Béton
Imprégnation :	Sans
Diamètre :	800 mm
Profondeur testée/totale :	0.82/1.12 mètres
Branchement(s) raccordé(s) :	Aucun
Emplacement :	Sous une route
Ouvrage sous nappe :	Non
Etat de la voirie :	Voirie existante
Etat du remblai :	Terminé
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)
Opérateur :	F. GOSP
Observations :	Testé sur réhausse conique.

Résultat de l'essai : **CONFORME**


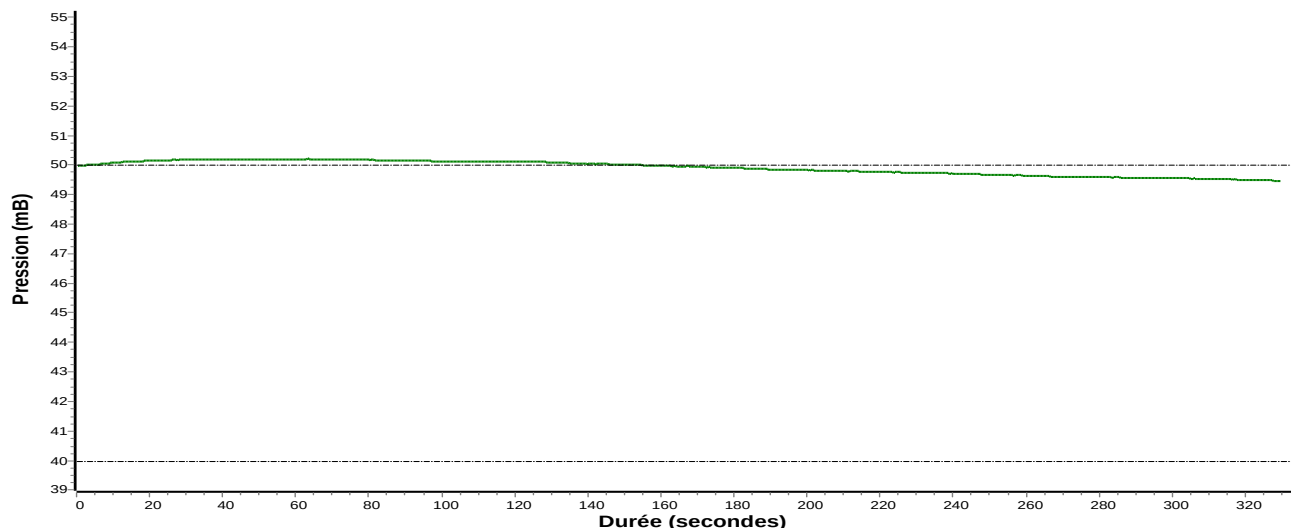


ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 10
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai : 26/10/2021
Heure de l'essai : 12:23:33
Date de saisie : N/A
Commune : PUISSERGUIER
Latitude :
Maître d'oeuvre : ENTECH
Entreprise T.P. : ROGER TP

Numéro de console : 487-1706
Numéro de capteur : 106630/19
Etalonnage le : 19/10/2020
Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE
Longitude :
Maître d'ouvrage :
Client : MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R4

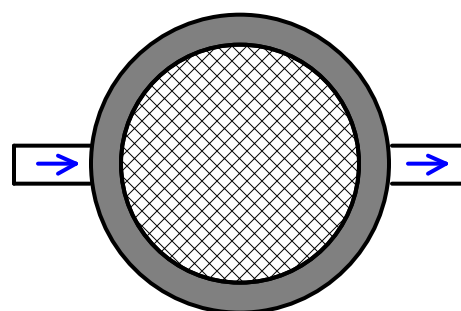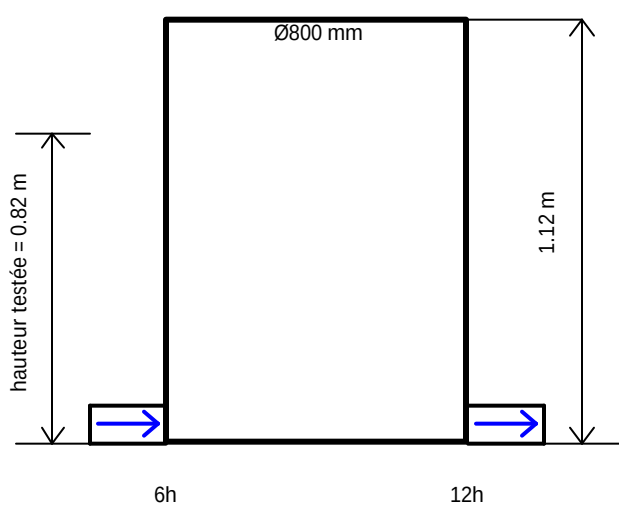


Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	12:04:09	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R5

Protocole :	LB 50mBar
Pression de départ :	50 mBar
Chute de pression tolérée :	10.0 mBar
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s
Durée du test prévue :	330 s
Durée du test effective :	330 s
Pression finale :	49.4 mBar
Nature des effluents :	Eaux usées
Type de réseau :	Gravitaire
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé
Matériau :	Béton
Imprégnation :	Sans
Diamètre :	800 mm
Profondeur testée/totale :	0.81/1.11 mètres
Branchement(s) raccordé(s) :	Aucun
Emplacement :	Sous une route
Ouvrage sous nappe :	Non
Etat de la voirie :	Voirie existante
Etat du remblai :	Terminé
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)
Opérateur :	F. GOSP
Observations :	
Testé sur réhausse conique.	



Résultat de l'essai : **CONFORME**

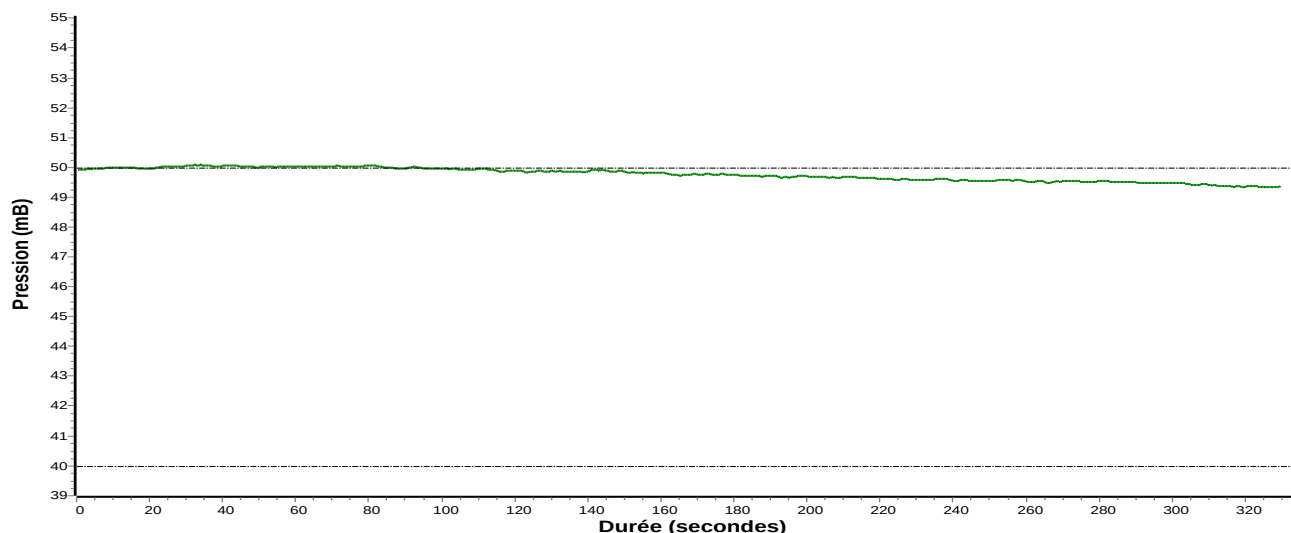

Date de l'essai : 26/10/2021
Heure de l'essai : 12:04:09
Date de saisie : N/A
Commune : PUISSERGUIER
Latitude :
Maître d'oeuvre : ENTECH
Entreprise T.P. : ROGER TP

Numéro de console : 487-1706
Numéro de capteur : 106630/19
Etalonnage le : 19/10/2020
Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE
Longitude :
Maître d'ouvrage :
Client : MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R5

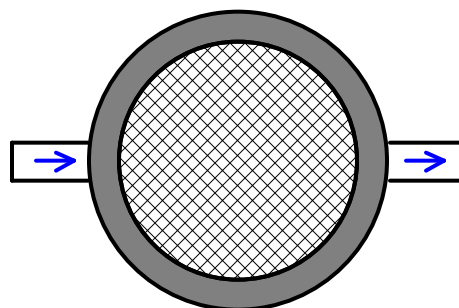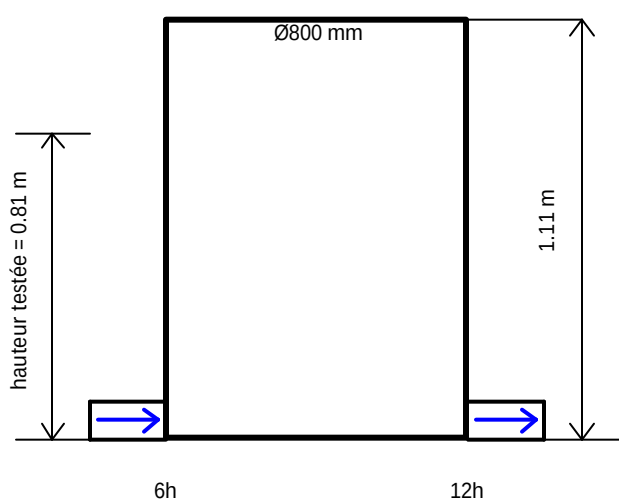


ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 12
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	11:43:49	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R6

Protocole :	LB 50mBar
Pression de départ :	50 mBar
Chute de pression tolérée :	10.0 mBar
Saturation (5min 0s prévues) :	5 mn 0 s
Durée du test prévue :	330 s
Durée du test effective :	330 s
Pression finale :	50.5 mBar
Nature des effluents :	Eaux usées
Type de réseau :	Gravitaire
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé
Matériau :	Béton
Imprégnation :	Sans
Diamètre :	800 mm
Profondeur testée/totale :	0.95/1.25 mètres
Branchement(s) raccordé(s) :	Aucun
Emplacement :	Sous une route
Ouvrage sous nappe :	Non
Etat de la voirie :	Voirie existante
Etat du remblai :	Terminé
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)
Opérateur :	F. GOSP
Observations :	Testé sur réhausse conique.



Résultat de l'essai : **CONFORME**

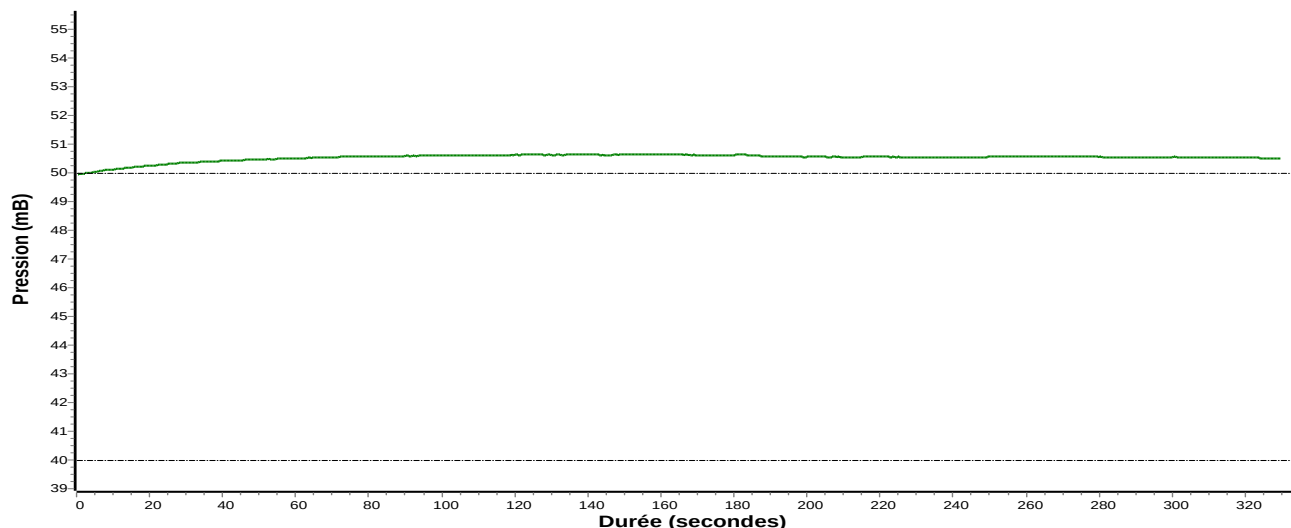

Date de l'essai : 26/10/2021
Heure de l'essai : 11:43:49
Date de saisie : N/A
Commune : PUISSESGUIER
Latitude :
Maître d'oeuvre : ENTECH
Entreprise T.P. : ROGER TP

Numéro de console : 487-1706
Numéro de capteur : 106630/19
Etalonnage le : 19/10/2020
Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE
Longitude :
Maître d'ouvrage :
Client : MAIRIE DE PUISSESGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R6

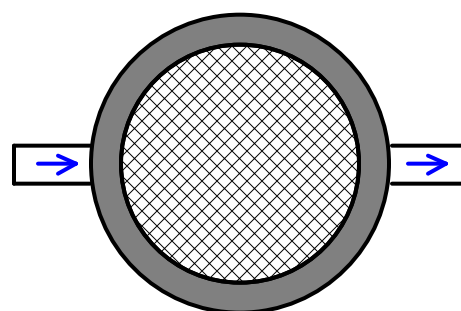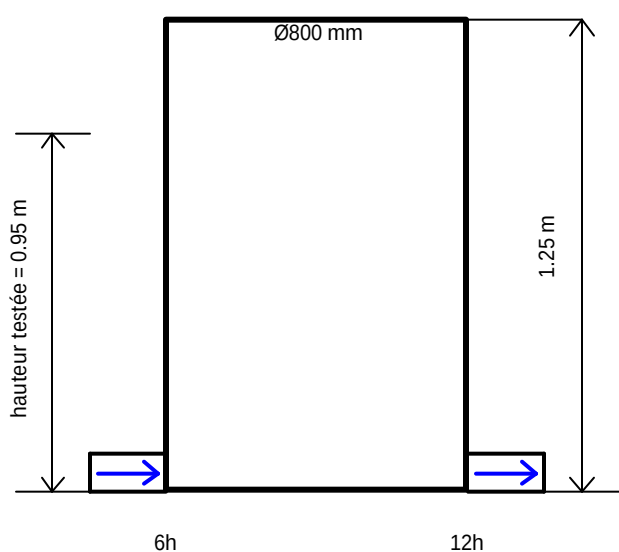


Date de l'essai :	26/10/2021	Numéro de console :	487-1706
Heure de l'essai :	16:08:03	Numéro de capteur :	106630/19
Date de saisie :	N/A	Etalonnage le :	19/10/2020
Commune :	PUISSERGUIER	Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Latitude :		Longitude :	
Maître d'oeuvre :	ENTECH	Maître d'ouvrage :	
Entreprise T.P. :	ROGER TP	Client :	MAIRIE DE PUISSERGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R7

Protocole :	LB 50mBar
Pression de départ :	50 mBar
Chute de pression tolérée :	10.0 mBar
Saturation (5min 0s prévues) :	0 mn 0 s
Durée du test prévue :	330 s
Durée du test effective :	0 s
Pression finale :	6.0 mBar
Nature des effluents :	Eaux usées
Type de réseau :	Gravitaire
Conditions d'écoulement :	Réseau non raccordé
Matériau :	Béton
Imprégnation :	Sans
Diamètre :	800 mm
Profondeur testée/totale :	1.20/1.49 mètres
Branchement(s) raccordé(s) :	Aucun
Emplacement :	Sous une route
Ouvrage sous nappe :	Non
Etat de la voirie :	Voirie existante
Etat du remblai :	Terminé
Météo :	Pas de précipitations (>0°C)
Opérateur :	F. GOSP
Observations :	Testé sur réhausse conique.

Résultat de l'essai : **ARRETE PAR L'OPERATEUR**

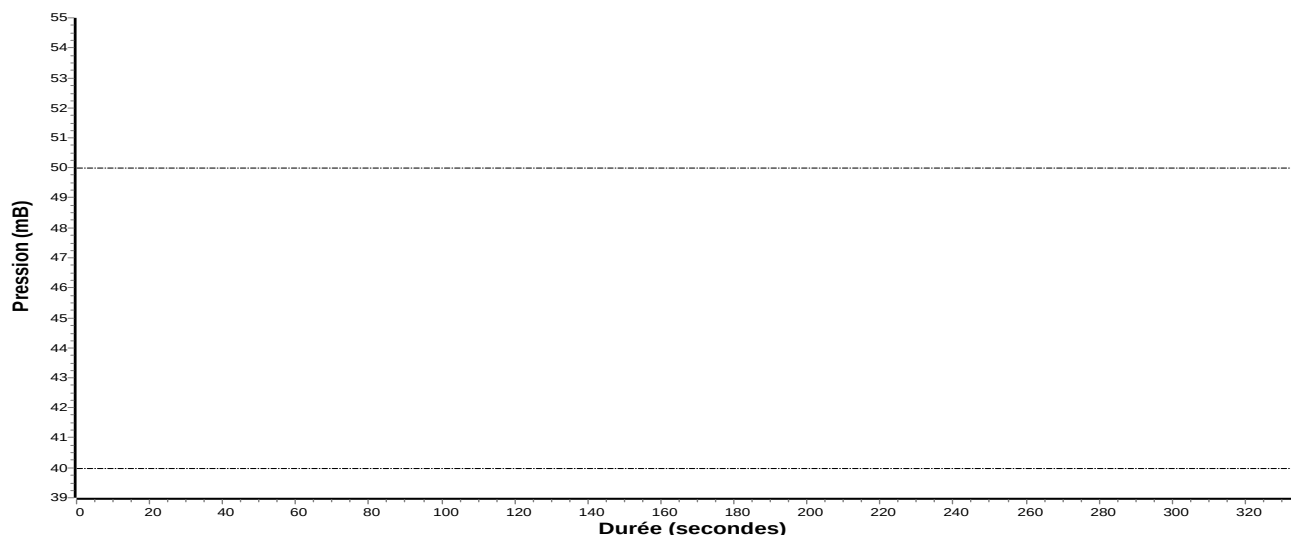

ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ N° 13
RAPPORT N° PUI2510211530CR2

Date de l'essai : 26/10/2021
Heure de l'essai : 16:08:03
Date de saisie : N/A
Commune : PUISSESGUIER
Latitude :
Maître d'oeuvre : ENTECH
Entreprise T.P. : ROGER TP

Numéro de console : 487-1706
Numéro de capteur : 106630/19
Etalonnage le : 19/10/2020
Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE
Longitude :
Maître d'ouvrage :
Client : MAIRIE DE PUISSESGUIER

TEST A L'AIR DU REGARD OCCASIONNELLEMENT VISITABLE R7

