



INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

Client: MAMP	Chantier: Quartier du petit mas Entressen
Maitre d'oeuvre:	Maitre d'ouvrage:
Référence du dossier :	
Nom du rapport :	MAMP Entressen 151019 I
Date de l'inspection :	15/10/2019 - 15/10/2019
Distance totale inspectée :	101,22 + 128,53 = 229,75 m
Distance totale non inspectée :	0 m
Distance totale :	101,22 + 128,53 = 229,75 m

Etabli par: Mr Givry Date: 15/10/2019 Visa:	Vérifié par: Mr Pepin Date: 15/10/2019 Visa:	Approuvé par: Mr Pepin Date: 15/10/2019 Visa:
---	--	---

SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE
Tél.:04 90 42 09 78
Fax:04 90 53 61 90

SOMMAIRE

TRONÇON 01	4
R34 (1,1m) Vers R33 (1,4m)	
BRT5	11
BRT5 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	
BRT4	14
BRT4 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	
BRT3	17
BRT3 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	
BRT2	20
BRT2 (0,8m) Vers TRONÇON 01 (0,8m)	
BRT1	23
BRT1 (0,9m) Vers TRONÇON 01 (0,9m)	
TRONÇON 02	26
R35 (1,5m) Vers R34 (1,1m)	
BRT13	35
BRT13 (0,9m) Vers TRONÇON 02 (0,9m)	
BRT12	38
BRT12 (0,9m) Vers TRONÇON 02 (0,9m)	
BRT11	41
BRT11 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	
BRT10	44
BRT10 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	
BRT9	47
BRT9 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	
BRT8	50
BRT8 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	
BRT7	53
BRT7 (1,0m) Vers TRONÇON 02 (1,0m)	
BRT6	56
BRT6 (1,0m) Vers TRONÇON 02 (1,0m)	
TRONÇON 03	59
R35 (1,5m) Vers R35BIS (1,3m)	
TRONÇON 04	64
BRT14 (0,6m) Vers R35BIS (1,3m)	
TRONÇON 05	68
BRT15 (0,7m) Vers R35BIS (1,3m)	
TRONÇON 06	72
BRT16 (0,7m) Vers R35 (1,5m)	

SECTION Fenouil


Nom du réseau:

Quartier du petit mas

Usage: eaux usées

Entresen

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

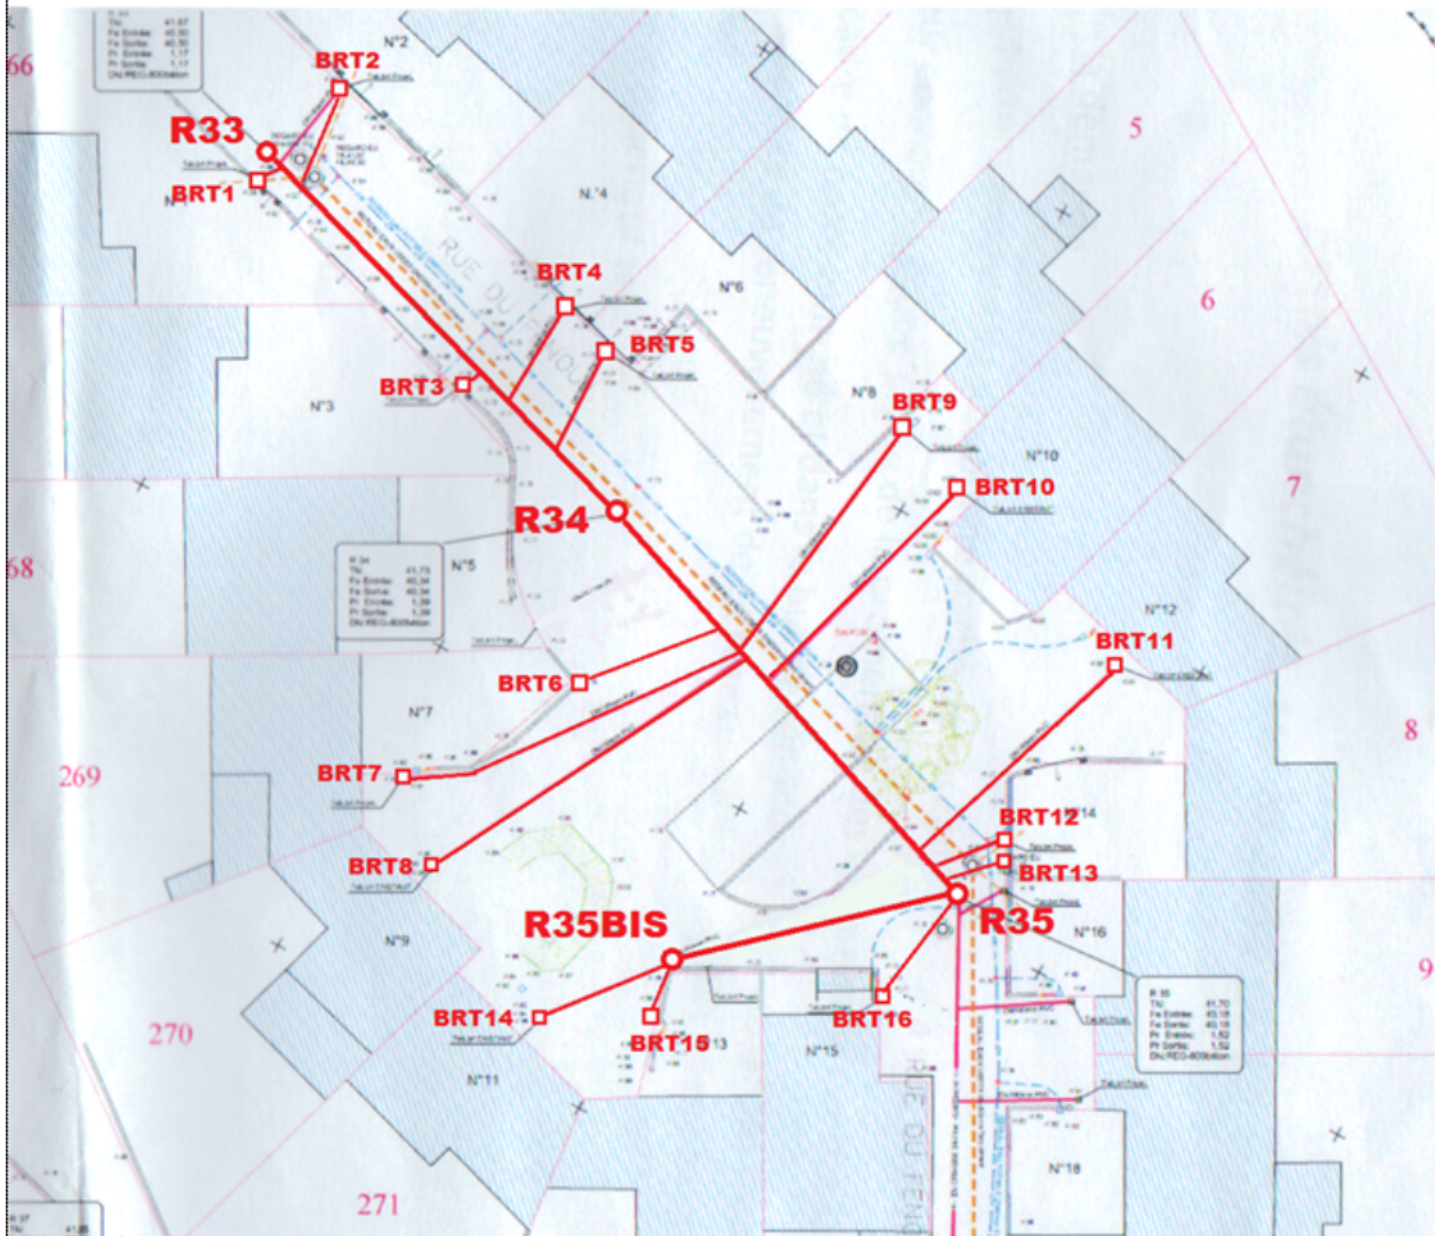

Client : MAMP
Chantier : Quartier du petit mas

Entresen

Rapport
MAMP Entresen 151019 I

TRONÇON 01		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R34	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	R33	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R33 Vers R34	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de Fenouil
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	30,94 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	30,94 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	



Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1183.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R34	Référence	R33
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,1 m	Profondeur:	1,43 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

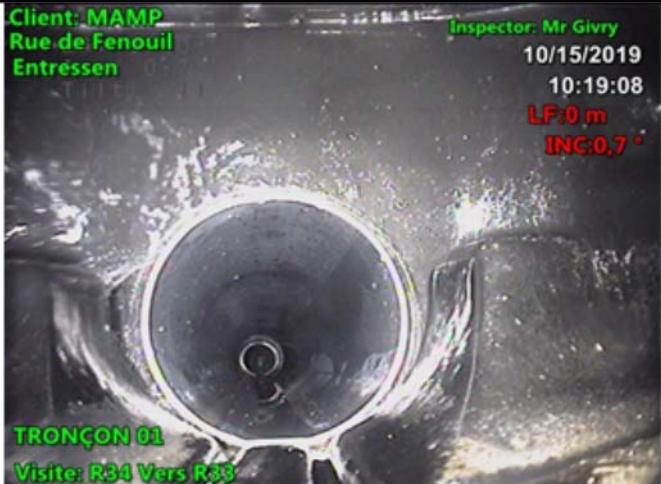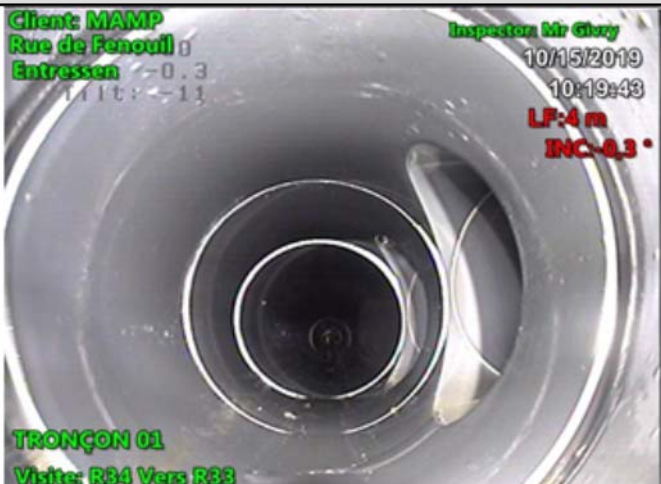TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R33 Vers R34	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R34 (1,1m) Vers R33 (1,4m)	Longueur inspectée: 30,94 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 30,94 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	3840.jpg	
0,00				
(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE Départ de l'inspection				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	3841.jpg	
0,50		00:00:08		
(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R34 Liaison regard - canalisation				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	3842.jpg	
4,00		00:00:43		
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT5 Position: 03H				

Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen		


TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R33 Vers R34	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 30,94 m
Matériau:	PVC		R34 (1,1m) Vers R33 (1,4m)	Longueur mesurée: 30,94 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	3843.jpg	
4,31		00:01:04		
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT4 Position: 03H				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	3844.jpg	
13,47		00:01:56		
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT3 Position: 10H				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	3845.jpg	
24,43		00:02:58		
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT2 Position: 03H				

Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen		

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R33 Vers R34	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 30,94 m
Matériau:	PVC		R34 (1,1m) Vers R33 (1,4m)	Longueur mesurée: 30,94 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	3846.jpg
27,72		00:03:32	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT1
Position: 10H

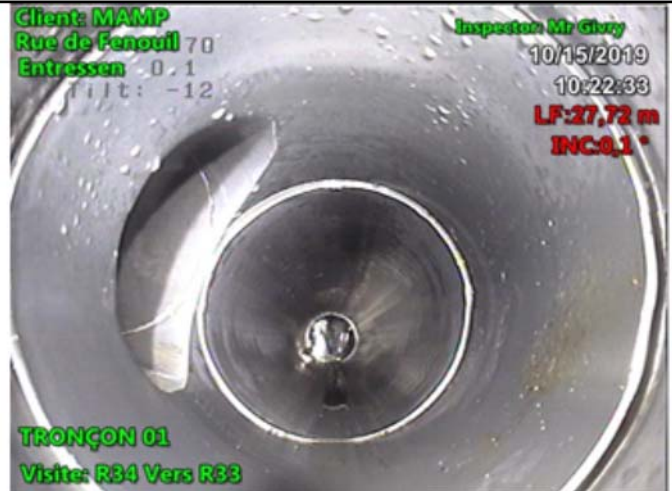

Distance	Fil d'eau	Vidéo	3847.jpg
30,44		00:04:01	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE
regard de visite :R33
Liaison canalisation - regard



Distance	Fil d'eau	Vidéo	3848.jpg
30,94		00:04:23	


(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Fin de l'inspection



Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R33 Vers R34	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R34 (1,1m) Vers R33 (1,4m)	Longueur inspectée: 30,94 m	Longueur mesurée: 30,94 m
Matériau: PVC				

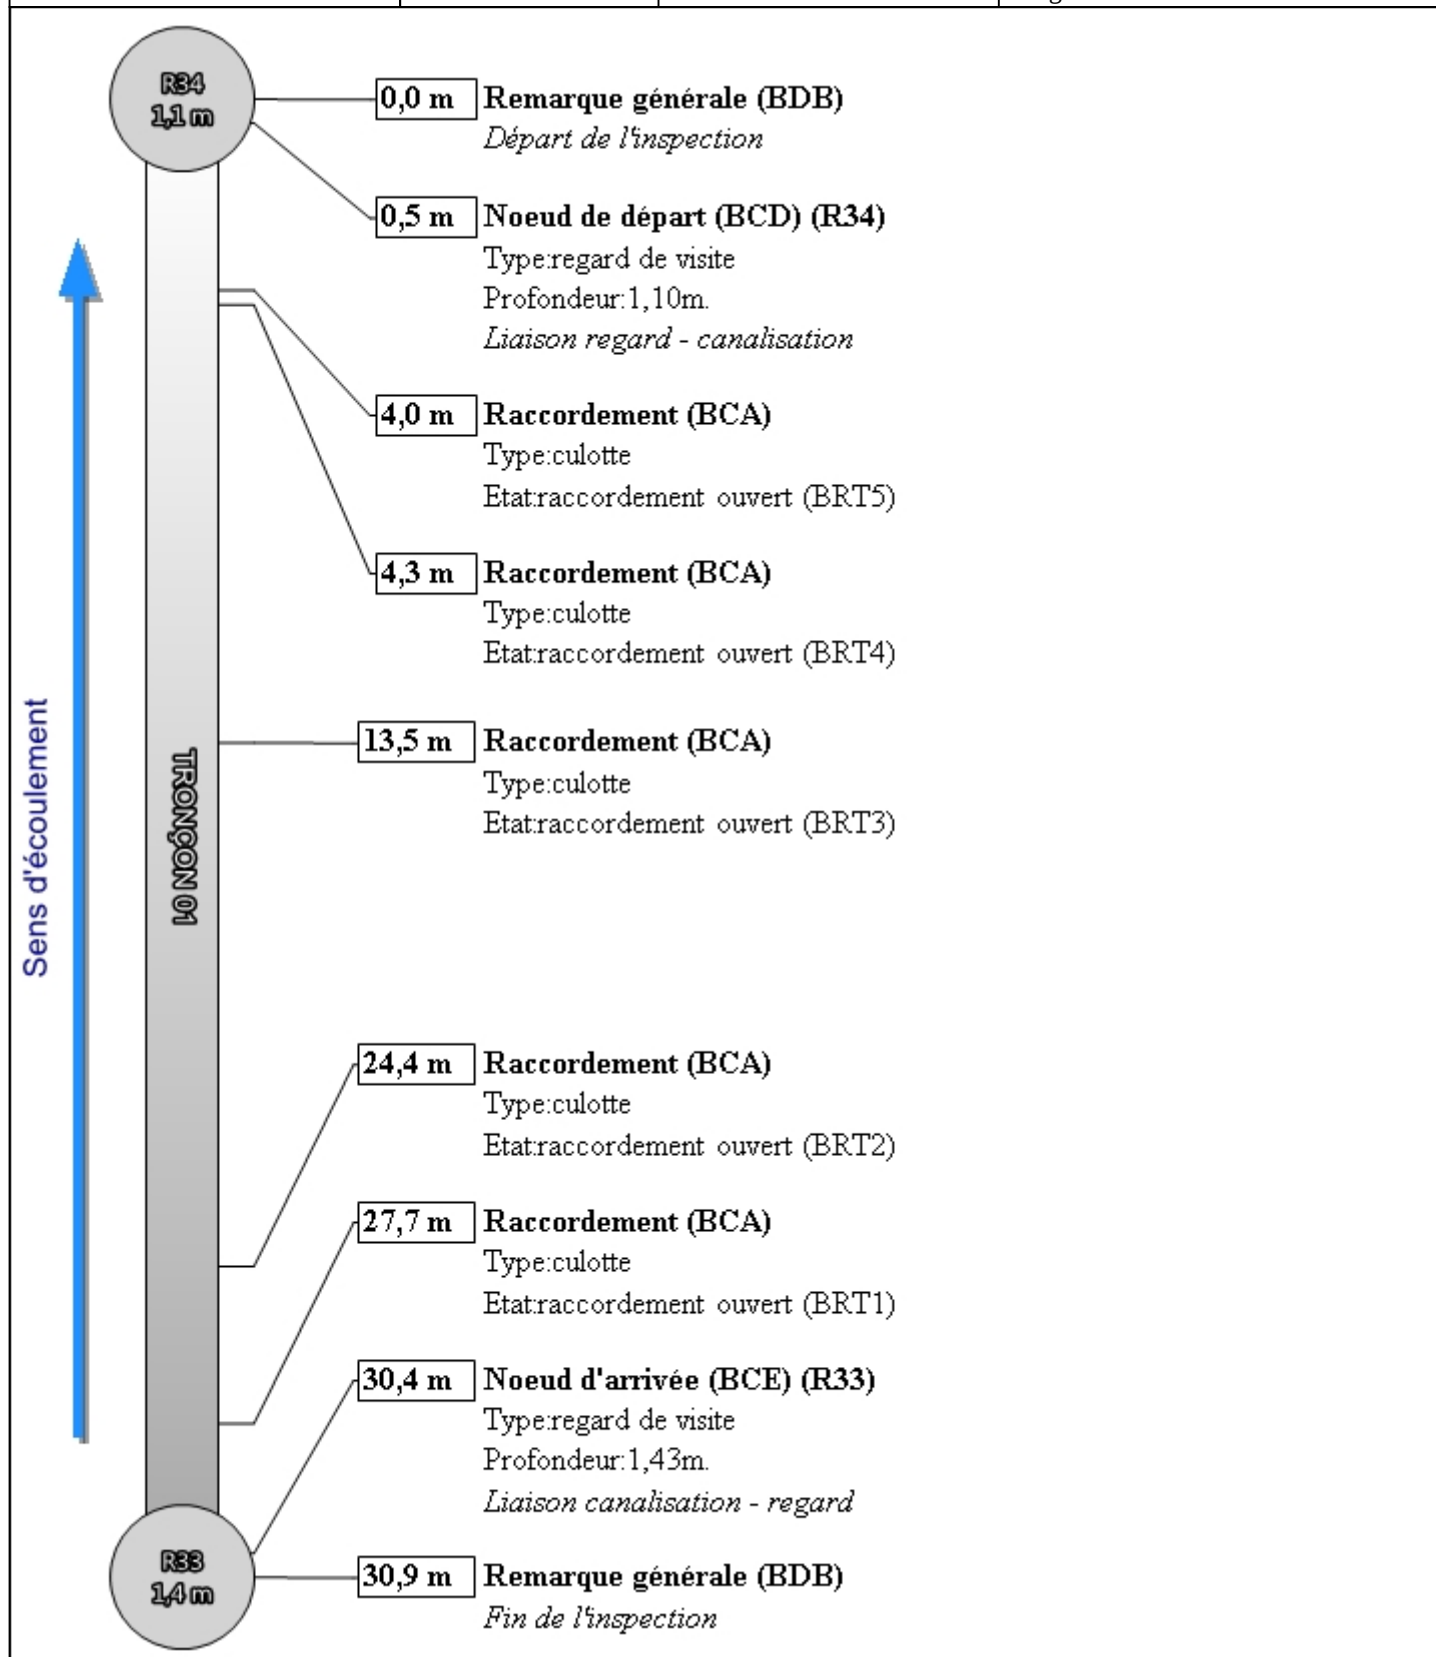


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R33 Vers R34	Date de l'inspection: 2019-10-15	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R34 (1,1m) Vers R33 (1,4m)	Longueur inspectée:	30,94 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée:	30,94 m

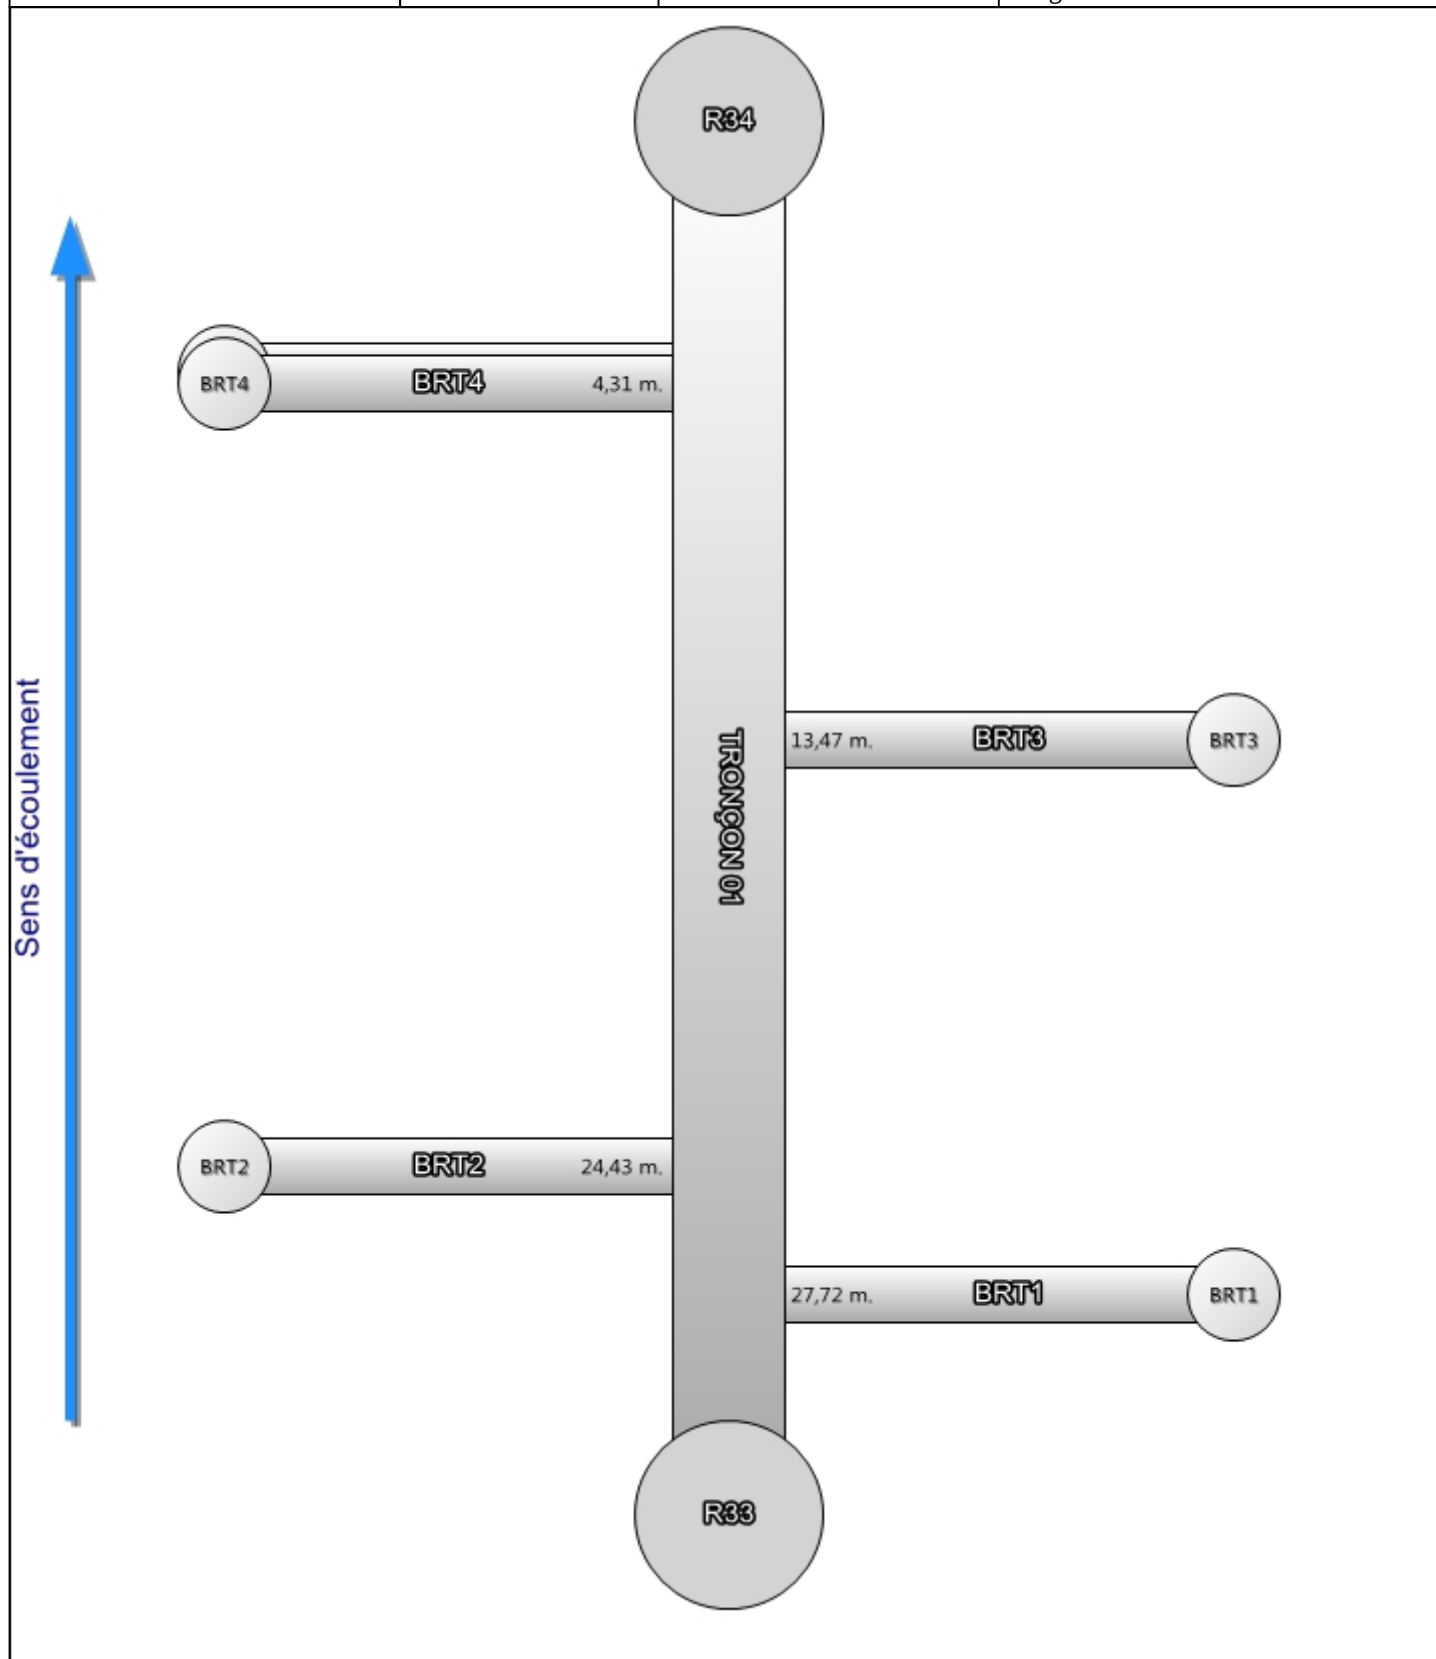

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Entressen 151019 I
Chantier :	Quartier du petit mas		
Entressen			

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R33 Vers R34	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R34 (1,1m) Vers R33 (1,4m)	Longueur inspectée: 30,94 m	Longueur mesurée: 30,94 m
Matériau: PVC				

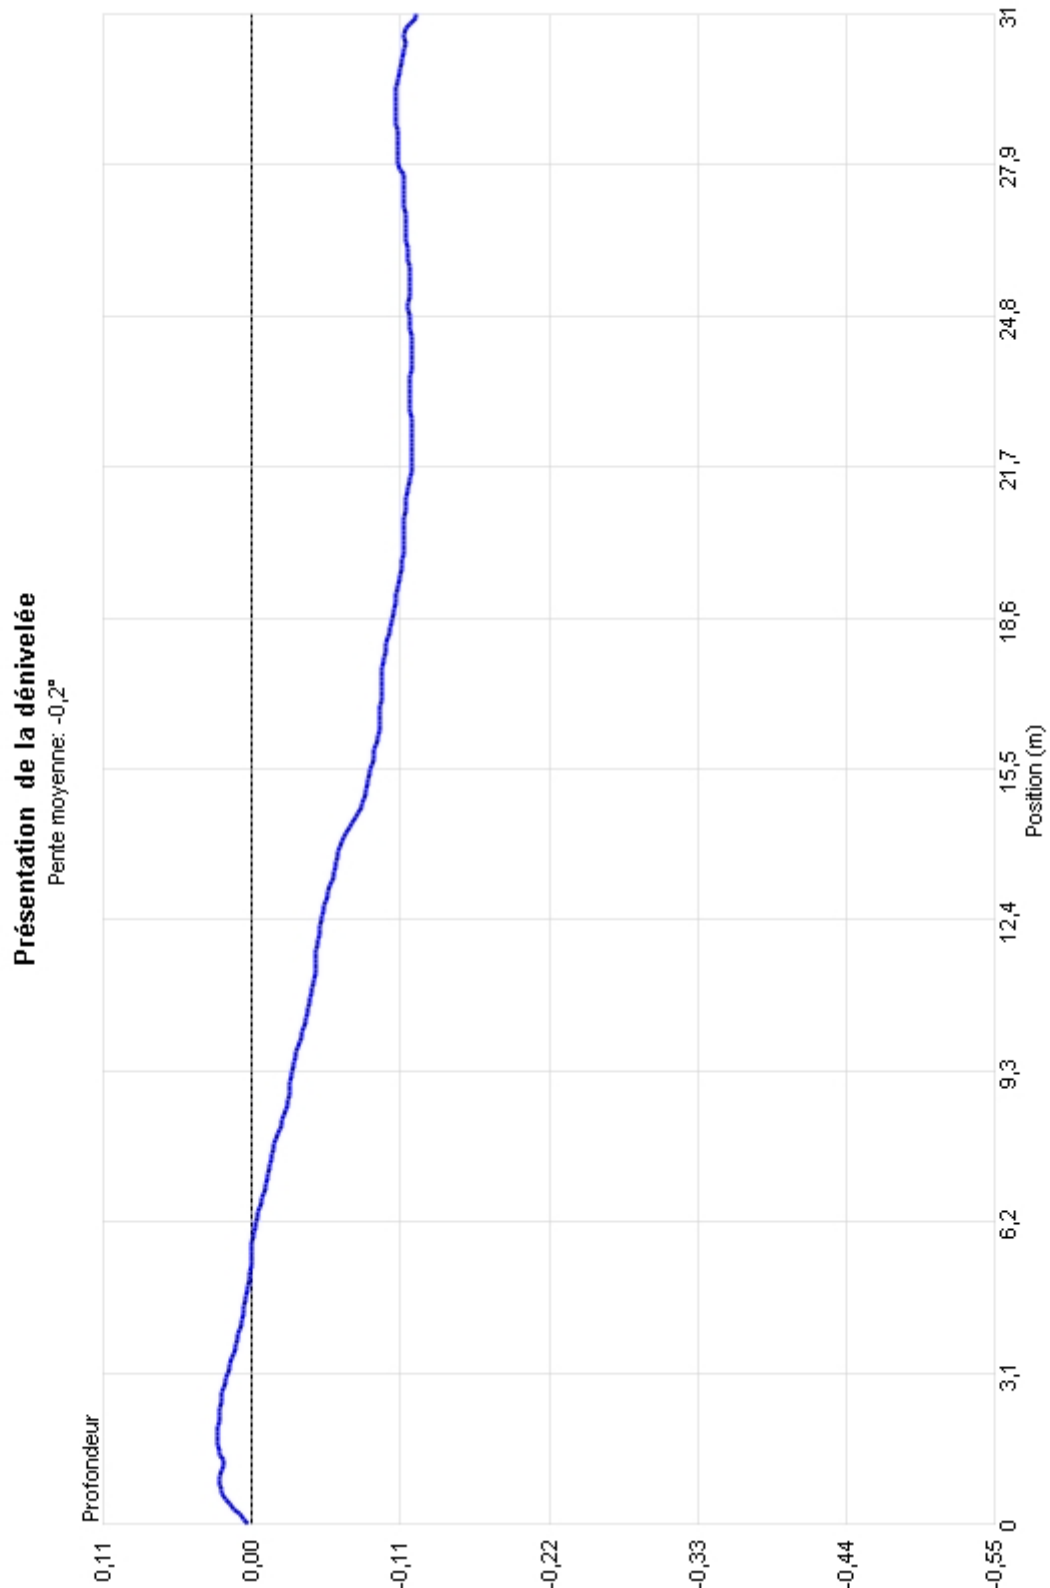

Client : MAMP
Chantier : Quartier du petit mas

Entressen

Rapport
MAMP Entressen 151019 I

BRT5		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT5	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 01	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT5 Vers TRONÇON 01	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	8,45 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	8,45 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT5.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT5	Référence	TRONÇON 01
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	1,02 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT5		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT5 Vers TRONÇON 01	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT5 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	Longueur inspectée: 8,45 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 8,45 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT4		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT4	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 01	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT4 Vers TRONÇON 01	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	8,47 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	8,47 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT4.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT4	Référence	TRONÇON 01
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,98 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

BRT4		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT4 Vers TRONÇON 01	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT4 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	Longueur inspectée: 8,47 m
Matériau:	PVC		Longueur mesurée: 8,47 m	
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT4

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4291.jpg
	8,47		<u>00:00:40</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	: MAMP
Chantier	: Quartier du petit mas

Entressen

Rapport

MAMP Entressen 151019 I



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT4		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT4 Vers TRONÇON 01	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT4 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	Longueur inspectée: 8,47 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 8,47 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT3		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT3	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 01	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT3 Vers TRONÇON 01	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	0,56 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	0,56 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT3.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT3	Référence	TRONÇON 01
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	1 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

BRT3		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT3 Vers TRONÇON 01	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT3 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	Longueur inspectée: 0,56 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 0,56 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT3

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4293.jpg
	0,56		<u>00:00:08</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	: MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier	: Quartier du petit mas	
Entressen		

Page 18 / 83



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT3		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT3 Vers TRONÇON 01	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT3 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	Longueur inspectée: 0,56 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 0,56 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT2		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT2	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 01	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT2 Vers TRONÇON 01	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	6,01 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	6,01 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT2.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT2	Référence	TRONÇON 01
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,82 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

BRT2		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT2 Vers TRONÇON 01	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 6,01 m
Matériau:	PVC		BRT2 (0,8m) Vers TRONÇON 01 (0,8m)	Longueur mesurée: 6,01 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT2

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4295.jpg
	6,01		<u>00:01:01</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité	-		+
Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :	Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I	
Entressen			Page 21 / 83



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT2		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT2 Vers TRONÇON 01	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT2 (0,8m) Vers TRONÇON 01 (0,8m)	Longueur inspectée: 6,01 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 6,01 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT1		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT1	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 01	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT1 Vers TRONÇON 01	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	1,02 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	1,02 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT1.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT1	Référence	TRONÇON 01
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,86 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT1		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT1 Vers TRONÇON 01	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT1 (0,9m) Vers TRONÇON 01 (0,9m)	Longueur inspectée: 1,02 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 1,02 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

TRONÇON 02		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R35	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	R34	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R34 Vers R35	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de Fenouil
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	29,27 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	29,27 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1182.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R35	Référence	R34
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,54 m	Profondeur:	1,1 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R34 Vers R35	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R35 (1,5m) Vers R34 (1,1m)	Longueur inspectée:	29,27 m
Matériau: PVC			Longueur mesurée:	29,27 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	3829.jpg
0,00			

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Départ de l'inspection



Distance	Fil d'eau	Vidéo	
0,50			

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART
regard de visite :R35
Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	3830.jpg
0,60			

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT13
Position: 03H



Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 02			Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R34 Vers R35	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: R35 (1,5m) Vers R34 (1,1m)		Longueur inspectée: 29,27 m
Matériau: PVC					Longueur mesurée: 29,27 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	3831.jpg	
	2,06		00:00:42	Client: MAMP Rue de Fenouil 5 Entressen -0.1 Tilt: -10 Inspector: Mr Glazy 10/15/2019 10:13:59 LF: 2.06 m INC: 0.1° TRONÇON 02 Visite: R35 Vers R34	
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT12 Position: 03H					

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	3832.jpg	
	2,46		00:01:05	Client: MAMP Rue de Fenouil 5 Entressen -0.1 Tilt: -10 Inspector: Mr Glazy 10/15/2019 10:14:22 LF: 2.46 m INC: 0.1° TRONÇON 02 Visite: R35 Vers R34	
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT11 Position: 03H					

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	3833.jpg	
	14,29		00:02:10	Client: MAMP Rue de Fenouil 25 Entressen 0.4 Tilt: -9 Inspector: Mr Glazy 10/15/2019 10:15:27 LF: 14.29 m INC: 0.4° TRONÇON 02 Visite: R35 Vers R34	
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT10 Position: 03H					


Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen		

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R34 Vers R35	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: R35 (1,5m) Vers R34 (1,1m)	Longueur inspectée: 29,27 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 29,27 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	3834.jpg	
14,62		00:02:34	 Client: MAMP Rue de Fenouil 60 Entressen 0.7 Tilt: -9 Inspector: Mr Givry 10/15/2019 10:15:51 LF: 14.62 m INC: 0.7° TRONÇON 02 Visite: R35 Vers R34	
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT9 Position: 03H				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	3835.jpg	
17,90		00:03:07	 Client: MAMP Rue de Fenouil 60 Entressen -0.3 Tilt: -9 Inspector: Mr Givry 10/15/2019 10:16:24 LF: 17.9 m INC: 0.3° TRONÇON 02 Visite: R35 Vers R34	
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT8 Position: 09H				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	3836.jpg	
18,28		00:03:27	 Client: MAMP Rue de Fenouil 25 Entressen -0.6 Tilt: -9 Inspector: Mr Givry 10/15/2019 10:16:44 LF: 18.28 m INC: 0.6° TRONÇON 02 Visite: R35 Vers R34	
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT7 Position: 09H				

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	


Page 30 / 83

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R34 Vers R35	Date de l'inspection: 2019-10-15	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R35 (1,5m) Vers R34 (1,1m)	Longueur inspectée:	29,27 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée:	29,27 m

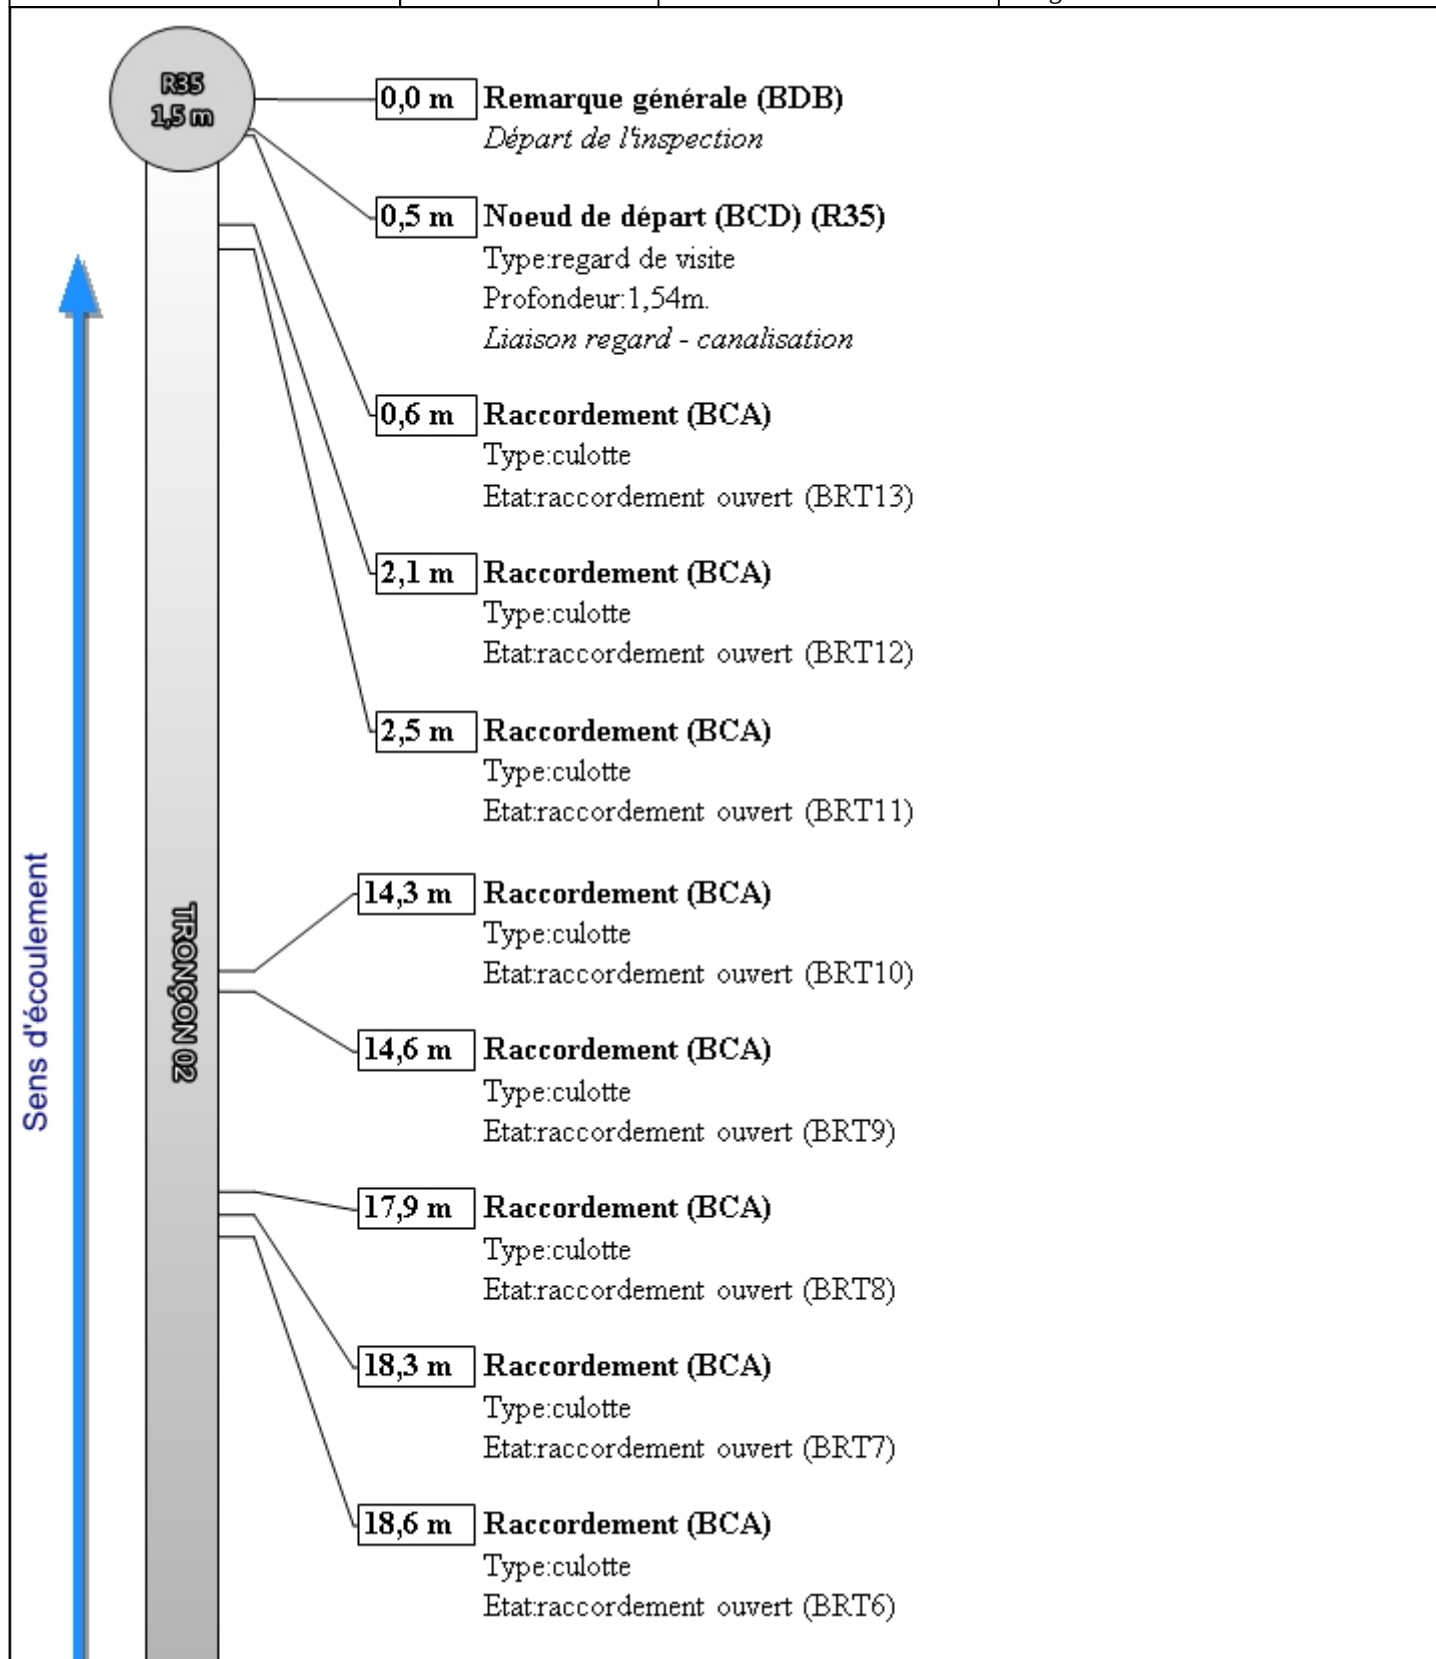


Client :	MAMP	Rapport :	MAMP Entressen 151019 I
Chantier :	Quartier du petit mas		
Entressen			

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R34 Vers R35	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R35 (1,5m) Vers R34 (1,1m)	Longueur inspectée: 29,27 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 29,27 m	

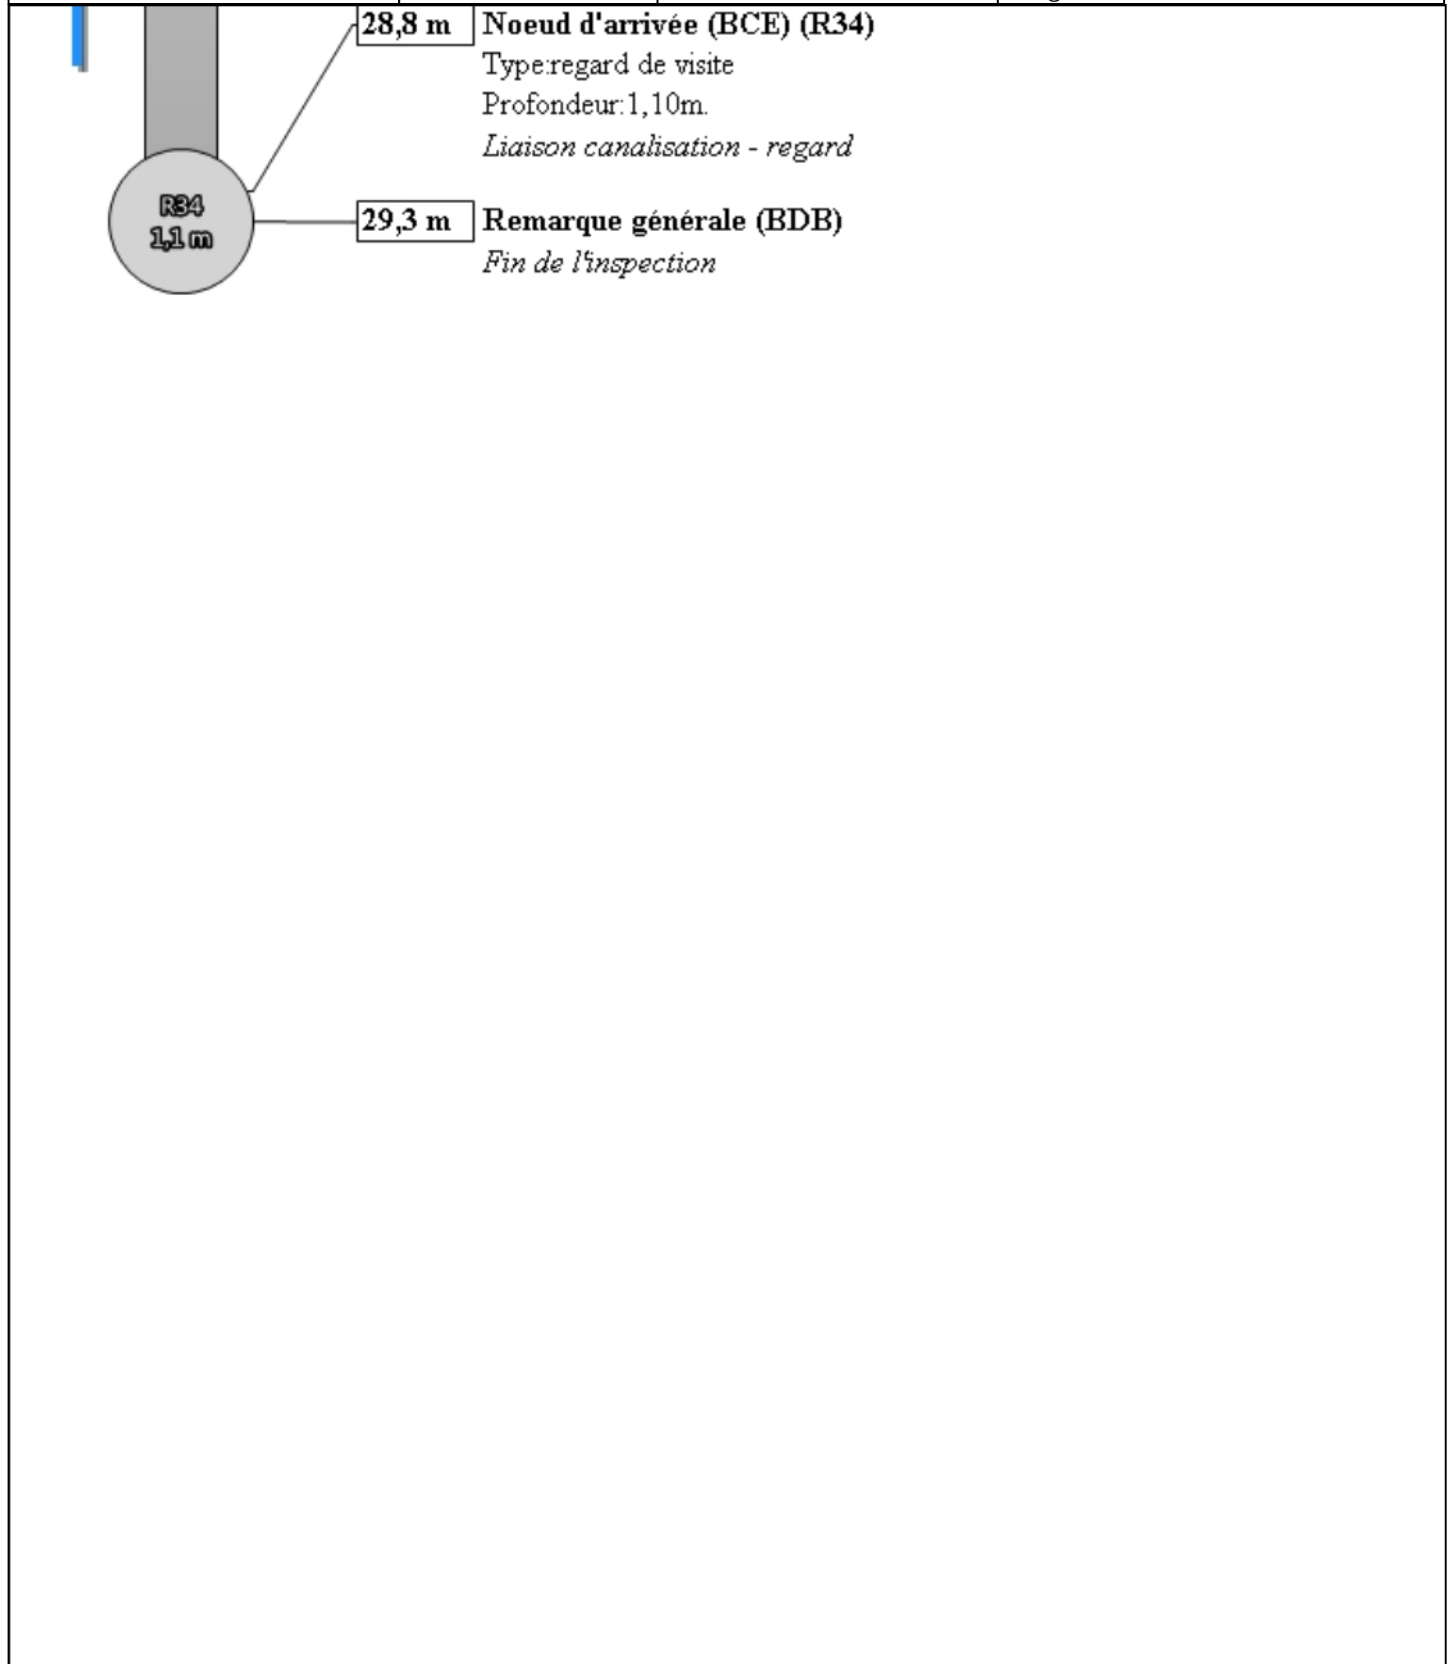

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R34 Vers R35	Date de l'inspection: 2019-10-15	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R35 (1,5m) Vers R34 (1,1m)	Longueur inspectée:	29,27 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée:	29,27 m

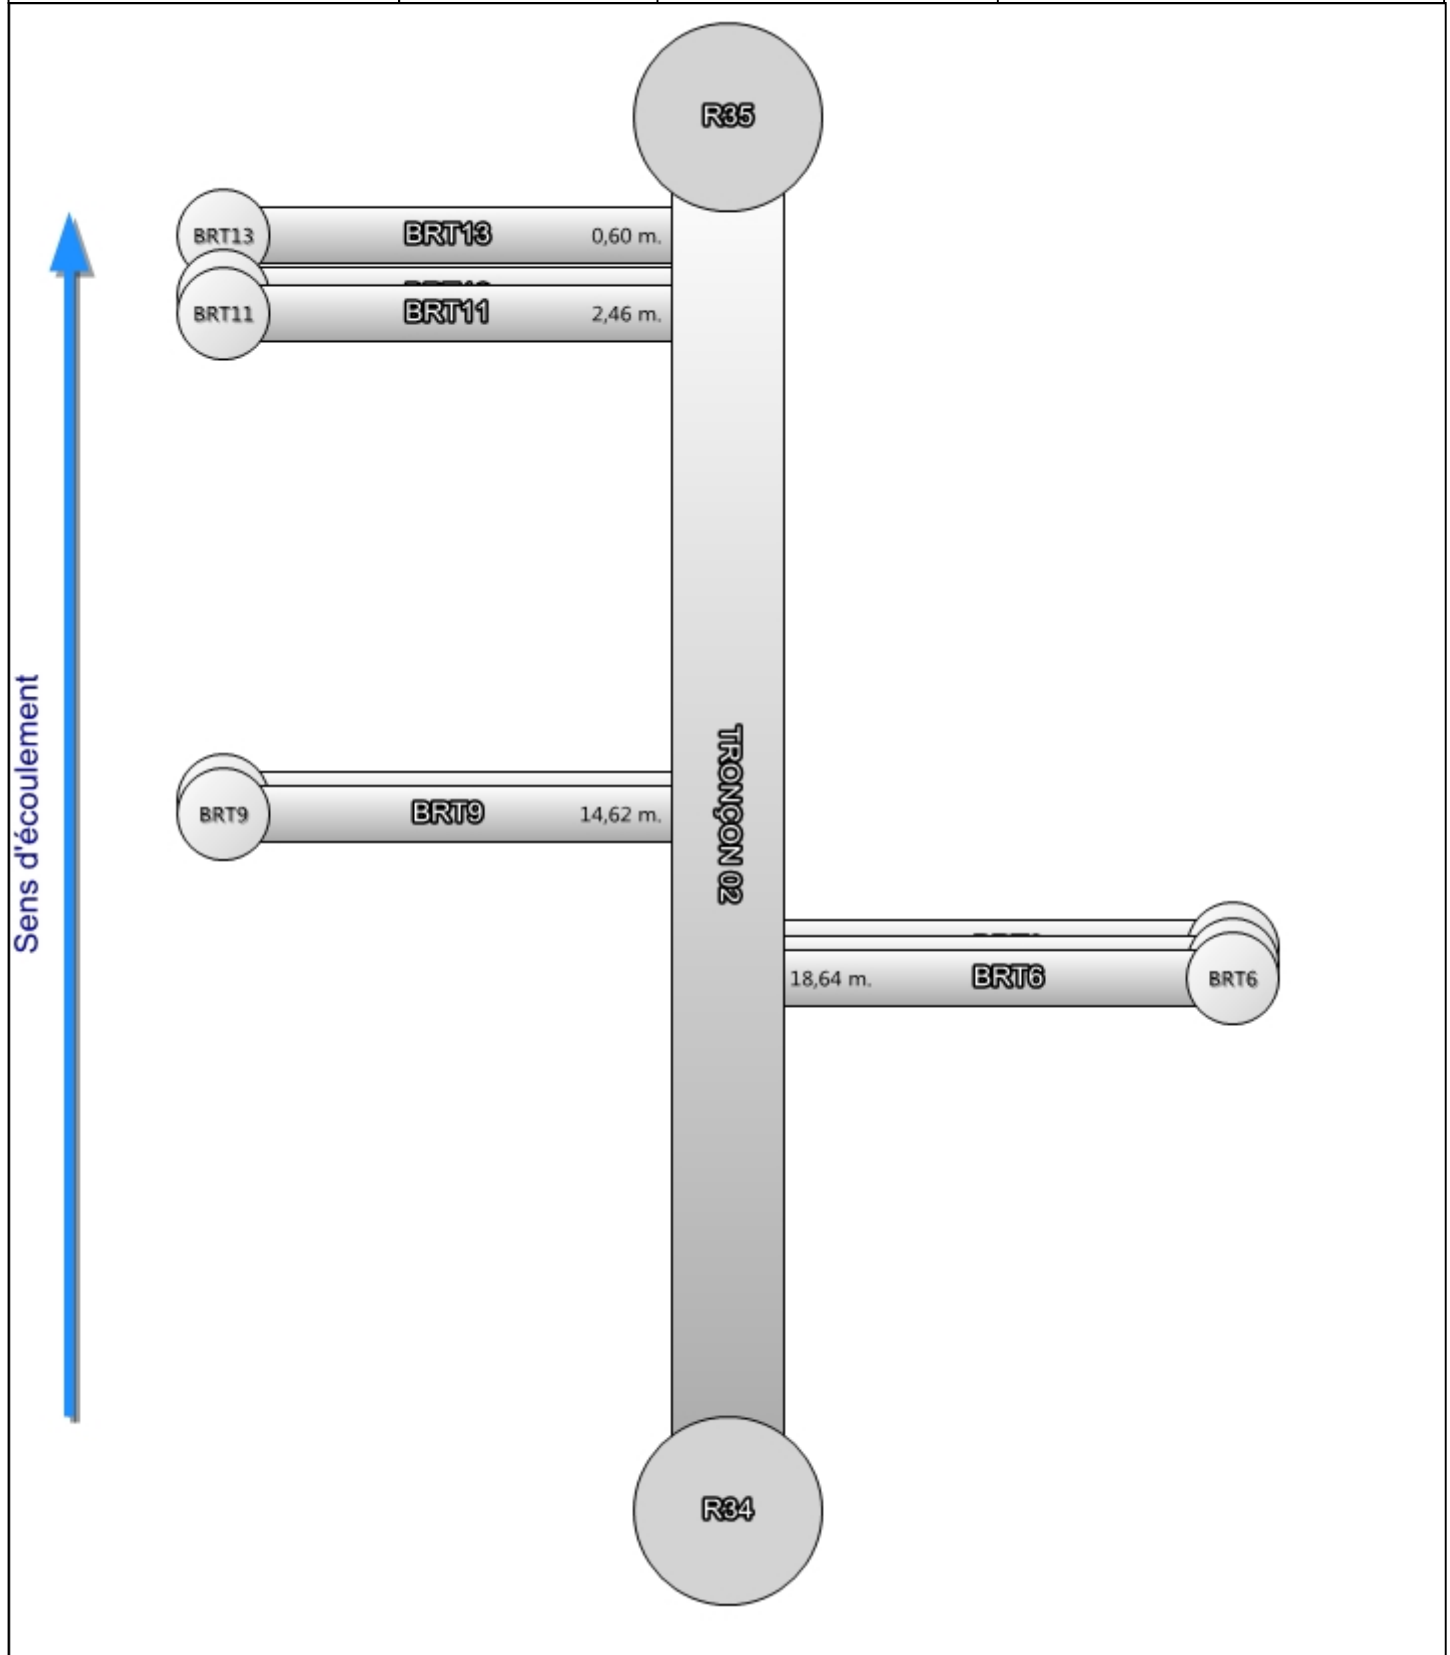


Client :	MAMP	Rapport :	MAMP Entressen 151019 I
Chantier :	Quartier du petit mas		
Entressen			

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R34 Vers R35	Date de l'inspection: 2019-10-15	
Réseau: eaux usées	Matériau: PVC	Longueur unitaire:	Sens de visite: R35 (1,5m) Vers R34 (1,1m)	Longueur inspectée:	29,27 m
				Longueur mesurée:	29,27 m

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: -0,3°

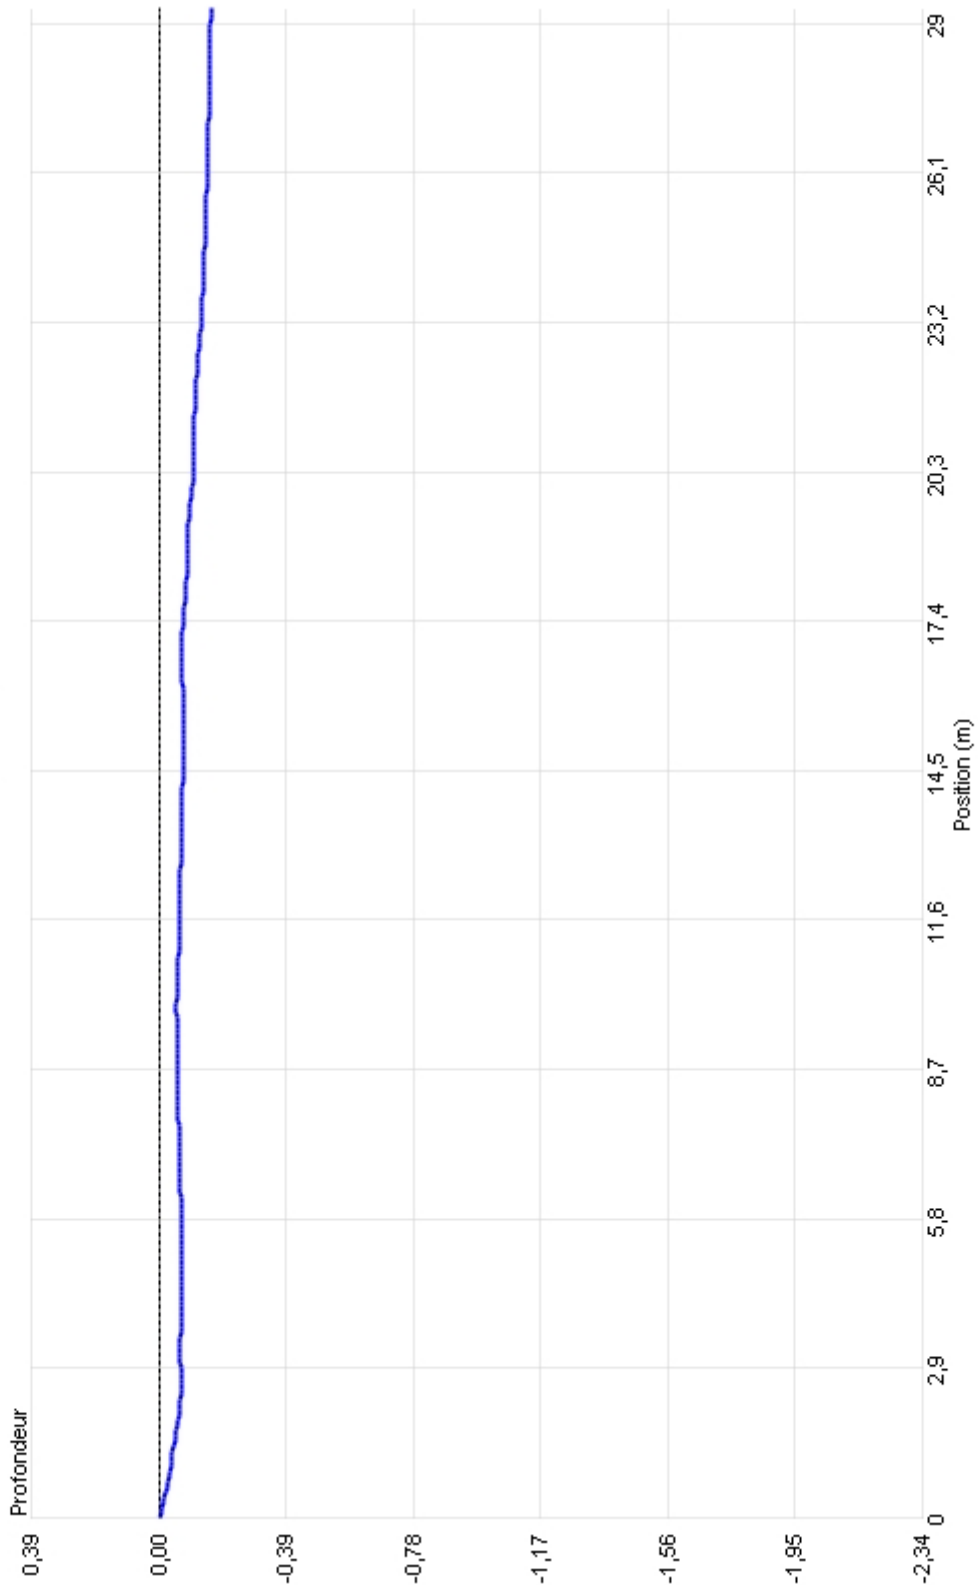

Client : MAMP
Chantier : Quartier du petit mas

Entressen

Rapport
MAMP Entressen 151019 I

BRT13		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT13	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT13 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	4,76 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	4,76 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT13.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT13	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,86 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

BRT13		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT13 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT13 (0,9m) Vers TRONÇON 02 (0,9m)	Longueur inspectée: 4,76 m
Matériau:	PVC		Longueur mesurée: 4,76 m	
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT13

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4313.jpg
	4,76		<u>00:00:23</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	-	:	MAMP	+
Chantier		:	Quartier du petit mas	

Entressen

Rapport

MAMP Entressen 151019 I



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT13		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT13 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:		Sens de visite: BRT13 (0,9m) Vers TRONÇON 02 (0,9m)	Longueur inspectée: 4,76 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 4,76 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT12		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT12	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT12 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	5,62 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	5,62 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT12.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT12	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,93 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT12		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT12 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT12 (0,9m) Vers TRONÇON 02 (0,9m)	Longueur inspectée: 5,62 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 5,62 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT11		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT11	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT11 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	16,44 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	16,44 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT11.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT11	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,67 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

BRT11		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT11 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT11 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur inspectée: 16,44 m
Matériau:	PVC		Longueur mesurée: 16,44 m	
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BRT11

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4309.jpg
	16,44		<u>00:02:14</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	: MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier	: Quartier du petit mas	
Entressen		



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT11		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT11 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:		Sens de visite: BRT11 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur inspectée: 16,44 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 16,44 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT10		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT10	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT10 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	16,69 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	16,69 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT10.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT10	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,69 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT10		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT10 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT10 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur inspectée: 16,69 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 16,69 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT9		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT9	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT9 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	19,89 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	19,89 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT9.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT9	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,7 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

BRT9		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT9 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT9 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur inspectée: 19,89 m
Matériau:	PVC		Longueur mesurée: 19,89 m	
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT9

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4305.jpg
	19,89		<u>00:01:16</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	-	:	MAMP	+
Chantier		:	Quartier du petit mas	

Entressen

Rapport

MAMP Entressen 151019 I



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT9		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT9 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT9 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur inspectée: 19,89 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 19,89 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT8		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT8	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT8 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	22,11 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	22,11 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT8.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT8	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,66 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

BRT8		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT8 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 22,11 m
Matériau:	PVC		BRT8 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur mesurée: 22,11 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT8

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4303.jpg
	22,11		<u>00:04:07</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	: MAMP
Chantier	: Quartier du petit mas

Entressen

Rapport

MAMP Entressen 151019 I



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT8		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT8 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT8 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur inspectée: 22,11 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 22,11 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT7		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT7	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT7 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	10,12 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	10,12 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT7.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT7	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	1,01 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

BRT7		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT7 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT7 (1,0m) Vers TRONÇON 02 (1,0m)	Longueur inspectée: 10,12 m
Matériau:	PVC		Longueur mesurée: 10,12 m	
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT7

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4301.jpg
	10,12		<u>00:00:37</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	: MAMP
Chantier	: Quartier du petit mas

Entressen

Rapport

MAMP Entressen 151019 I



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT7		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT7 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT7 (1,0m) Vers TRONÇON 02 (1,0m)	Longueur inspectée: 10,12 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 10,12 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

BRT6		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT6	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT6 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	8,39 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	8,39 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT6.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT6	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,96 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

BRT6		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT6 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 8,39 m
Matériau:	PVC		BRT6 (1,0m) Vers TRONÇON 02 (1,0m)	Longueur mesurée: 8,39 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT6

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4299.jpg
	8,39		<u>00:00:35</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen			Page 57 / 83



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT6		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT6 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT6 (1,0m) Vers TRONÇON 02 (1,0m)	Longueur inspectée: 8,39 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 8,39 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

TRONÇON 03		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R35	Date d'inspection:	15/10/2019
Noeud d'arrivée:	R35BIS	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R35BIS Vers R35	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de Fenouil
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	14,93 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	14,93 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1184.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R35	Référence	R35BIS
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,54 m	Profondeur:	1,34 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R35BIS Vers R35	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R35 (1,5m) Vers R35BIS (1,3m)	Longueur inspectée: 14,93 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 14,93 m	

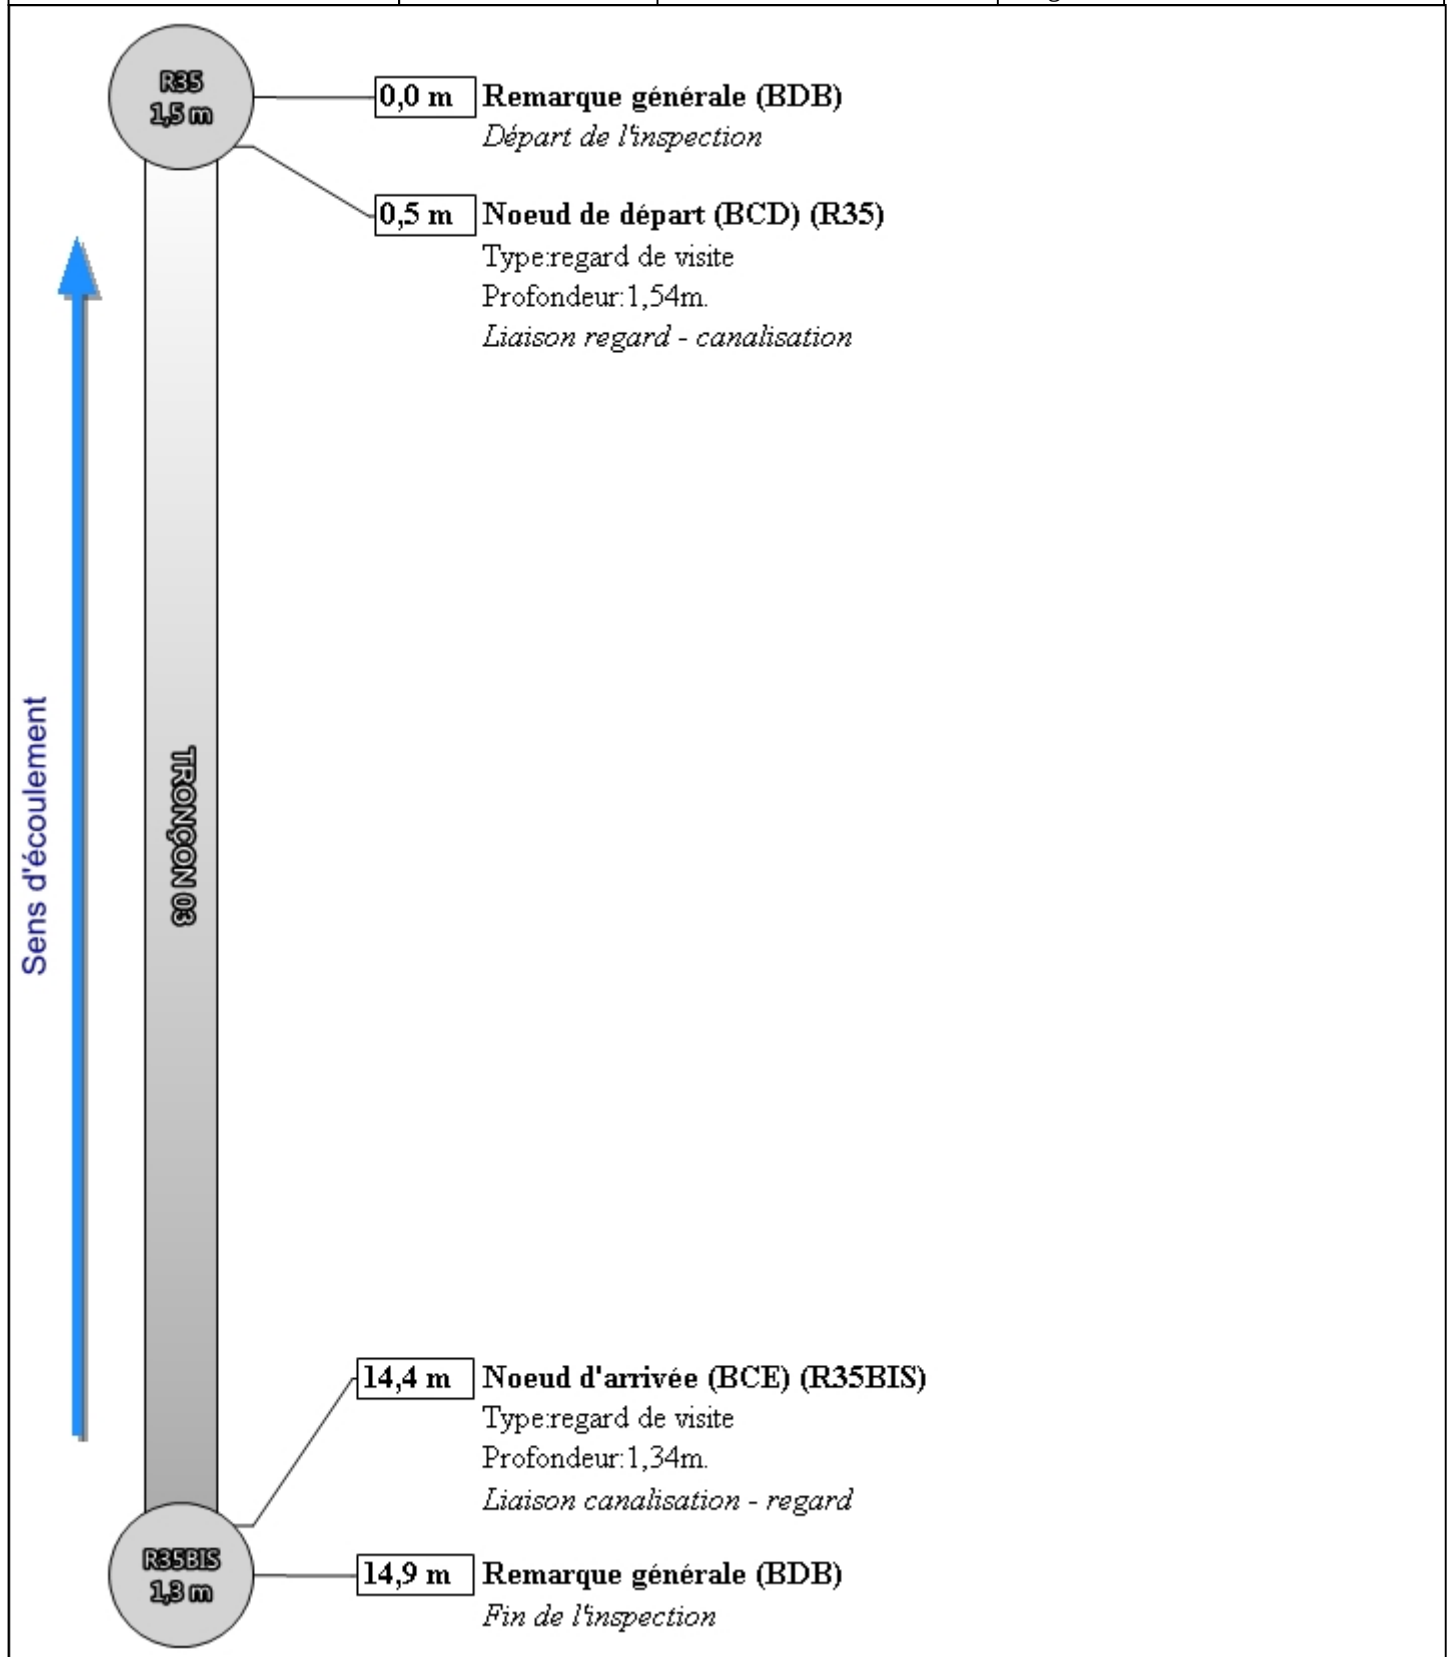

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R35BIS Vers R35	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Longueur unitaire:	Sens de visite: R35 (1,5m) Vers R35BIS (1,3m)	Longueur inspectée: 14,93 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 14,93 m

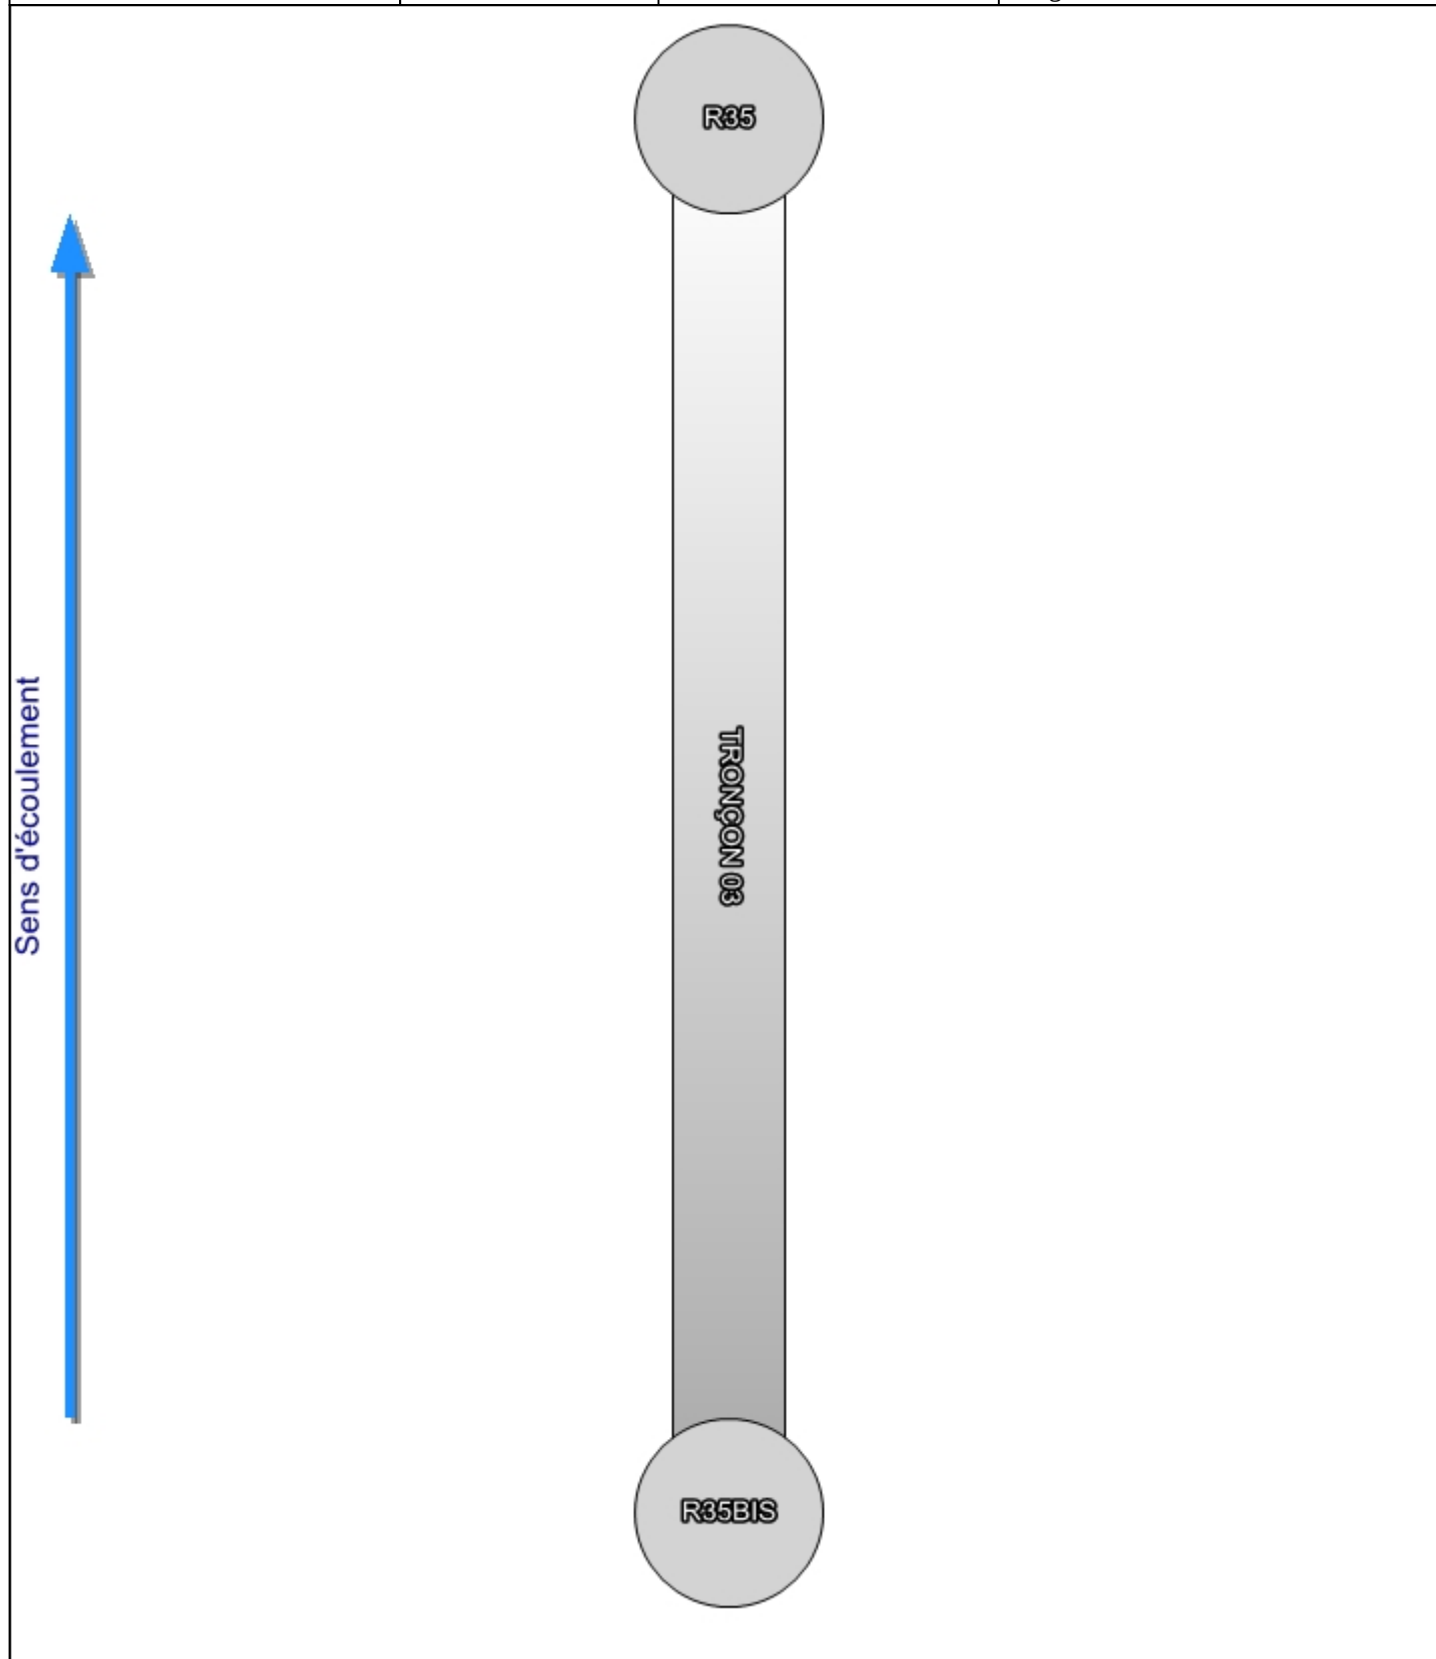


Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R35BIS Vers R35	Date de l'inspection: 2019-10-15
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R35 (1,5m) Vers R35BIS (1,3m)	Longueur inspectée: 14,93 m	Longueur mesurée: 14,93 m
Matériau: PVC				

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 0,2°

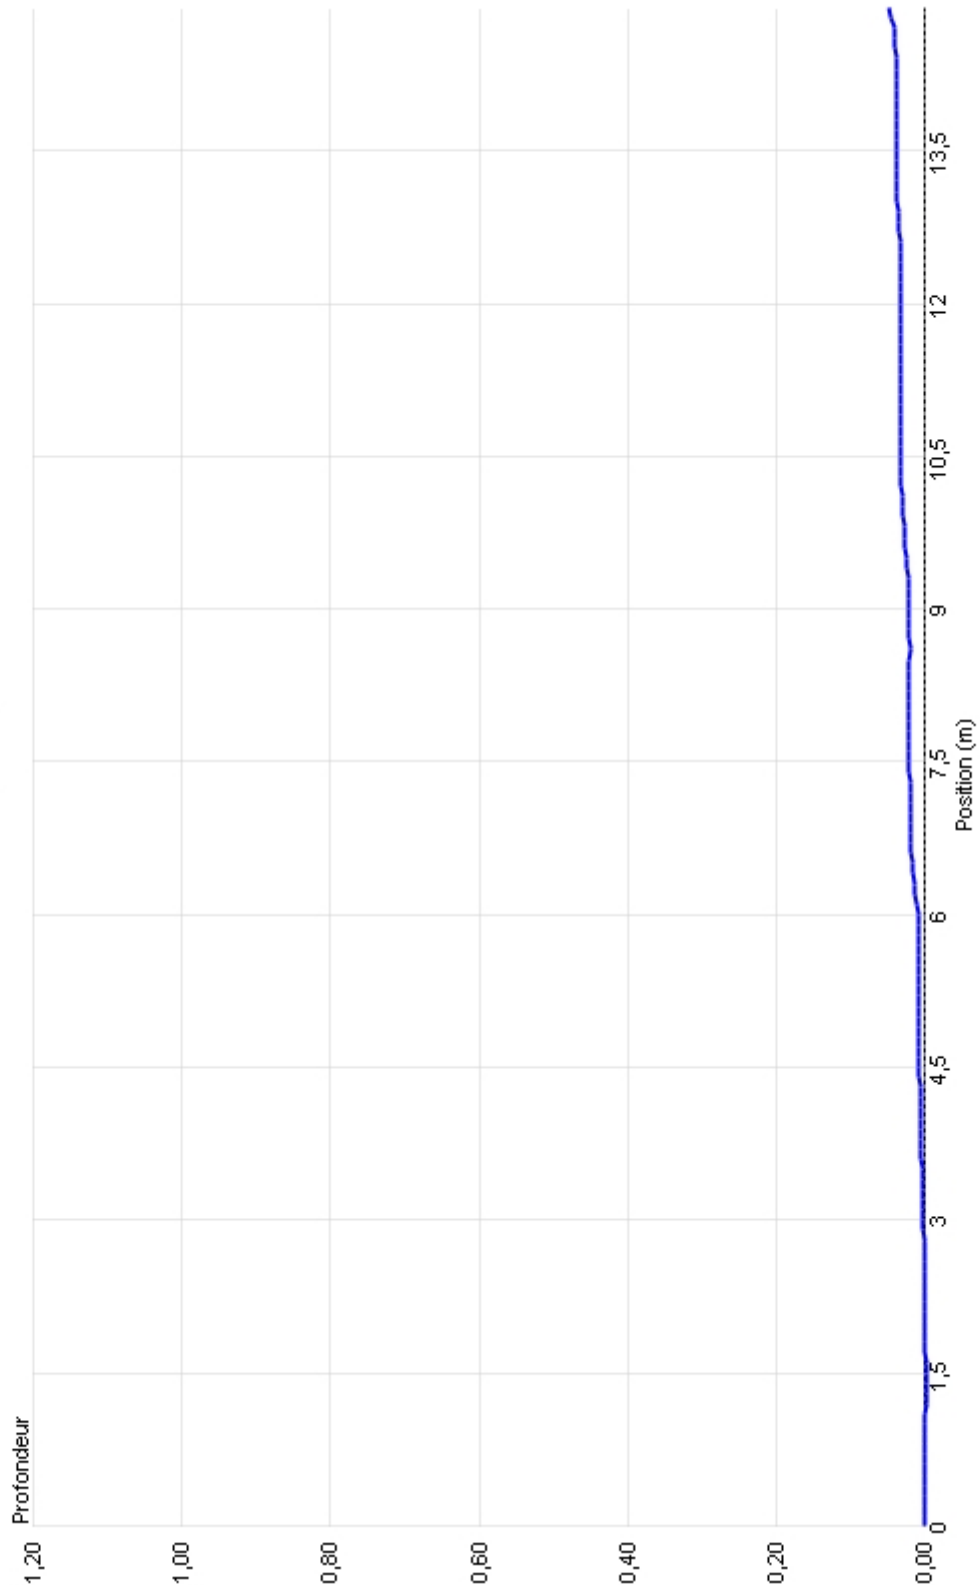

Client : MAMP
Chantier : Quartier du petit mas

Entressen

Rapport
MAMP Entressen 151019 I

TRONÇON 04		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT14	Date d'inspection:	22/11/2019
Noeud d'arrivée:	R35BIS	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT14 Vers R35BIS	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de Fenouil
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	9,63 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	9,63 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT14.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT14	Référence	R35BIS
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,64 m	Profondeur:	1,34 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 04		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT14 Vers R35BIS	Date de l'inspection: 2019-11-22
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT14 (0,6m) Vers R35BIS (1,3m)	Longueur inspectée: 9,63 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 9,63 m	

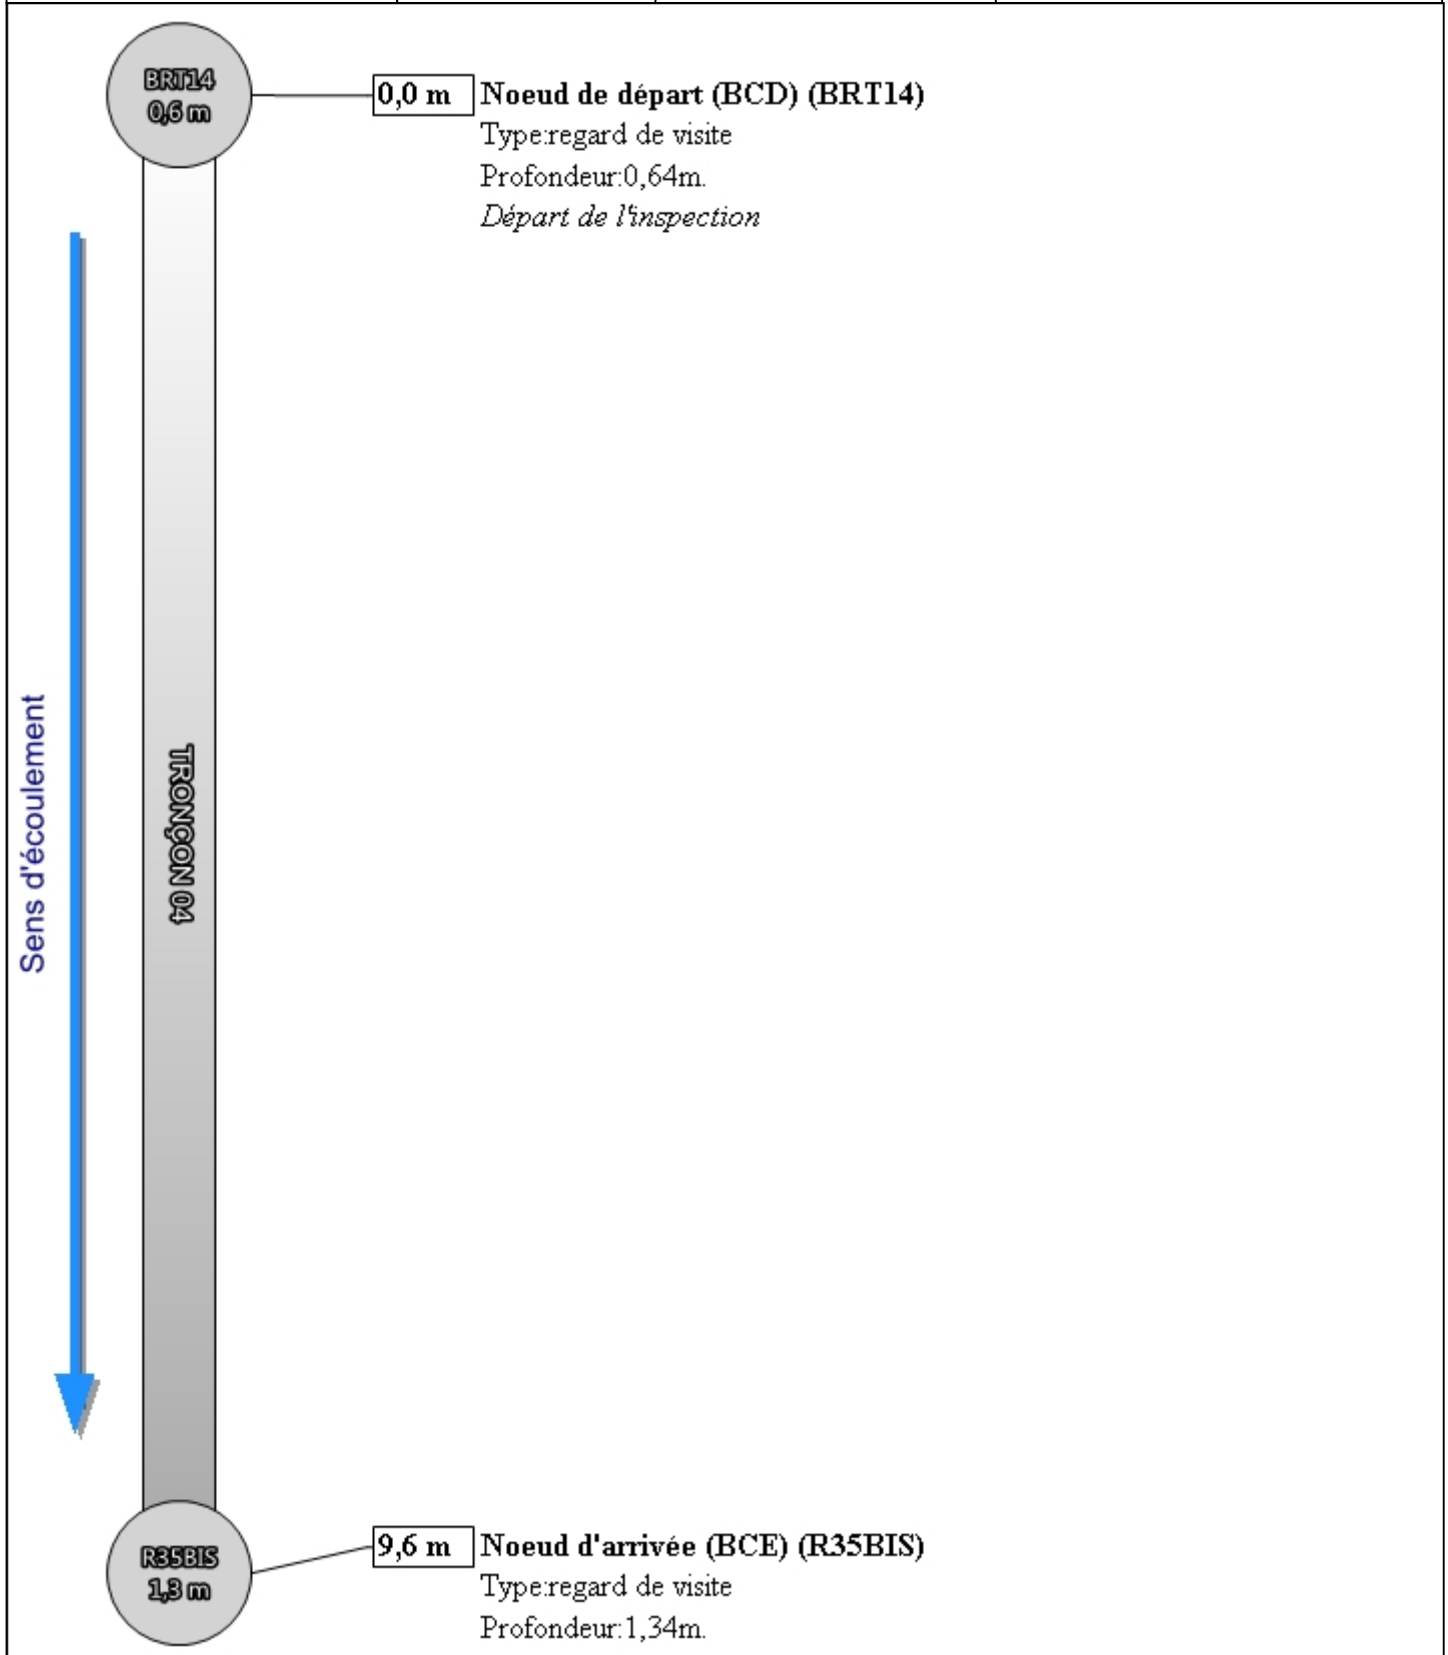

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 04		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT14 Vers R35BIS	Date de l'inspection: 2019-11-22
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT14 (0,6m) Vers R35BIS (1,3m)		Longueur inspectée: 9,63 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 9,63 m

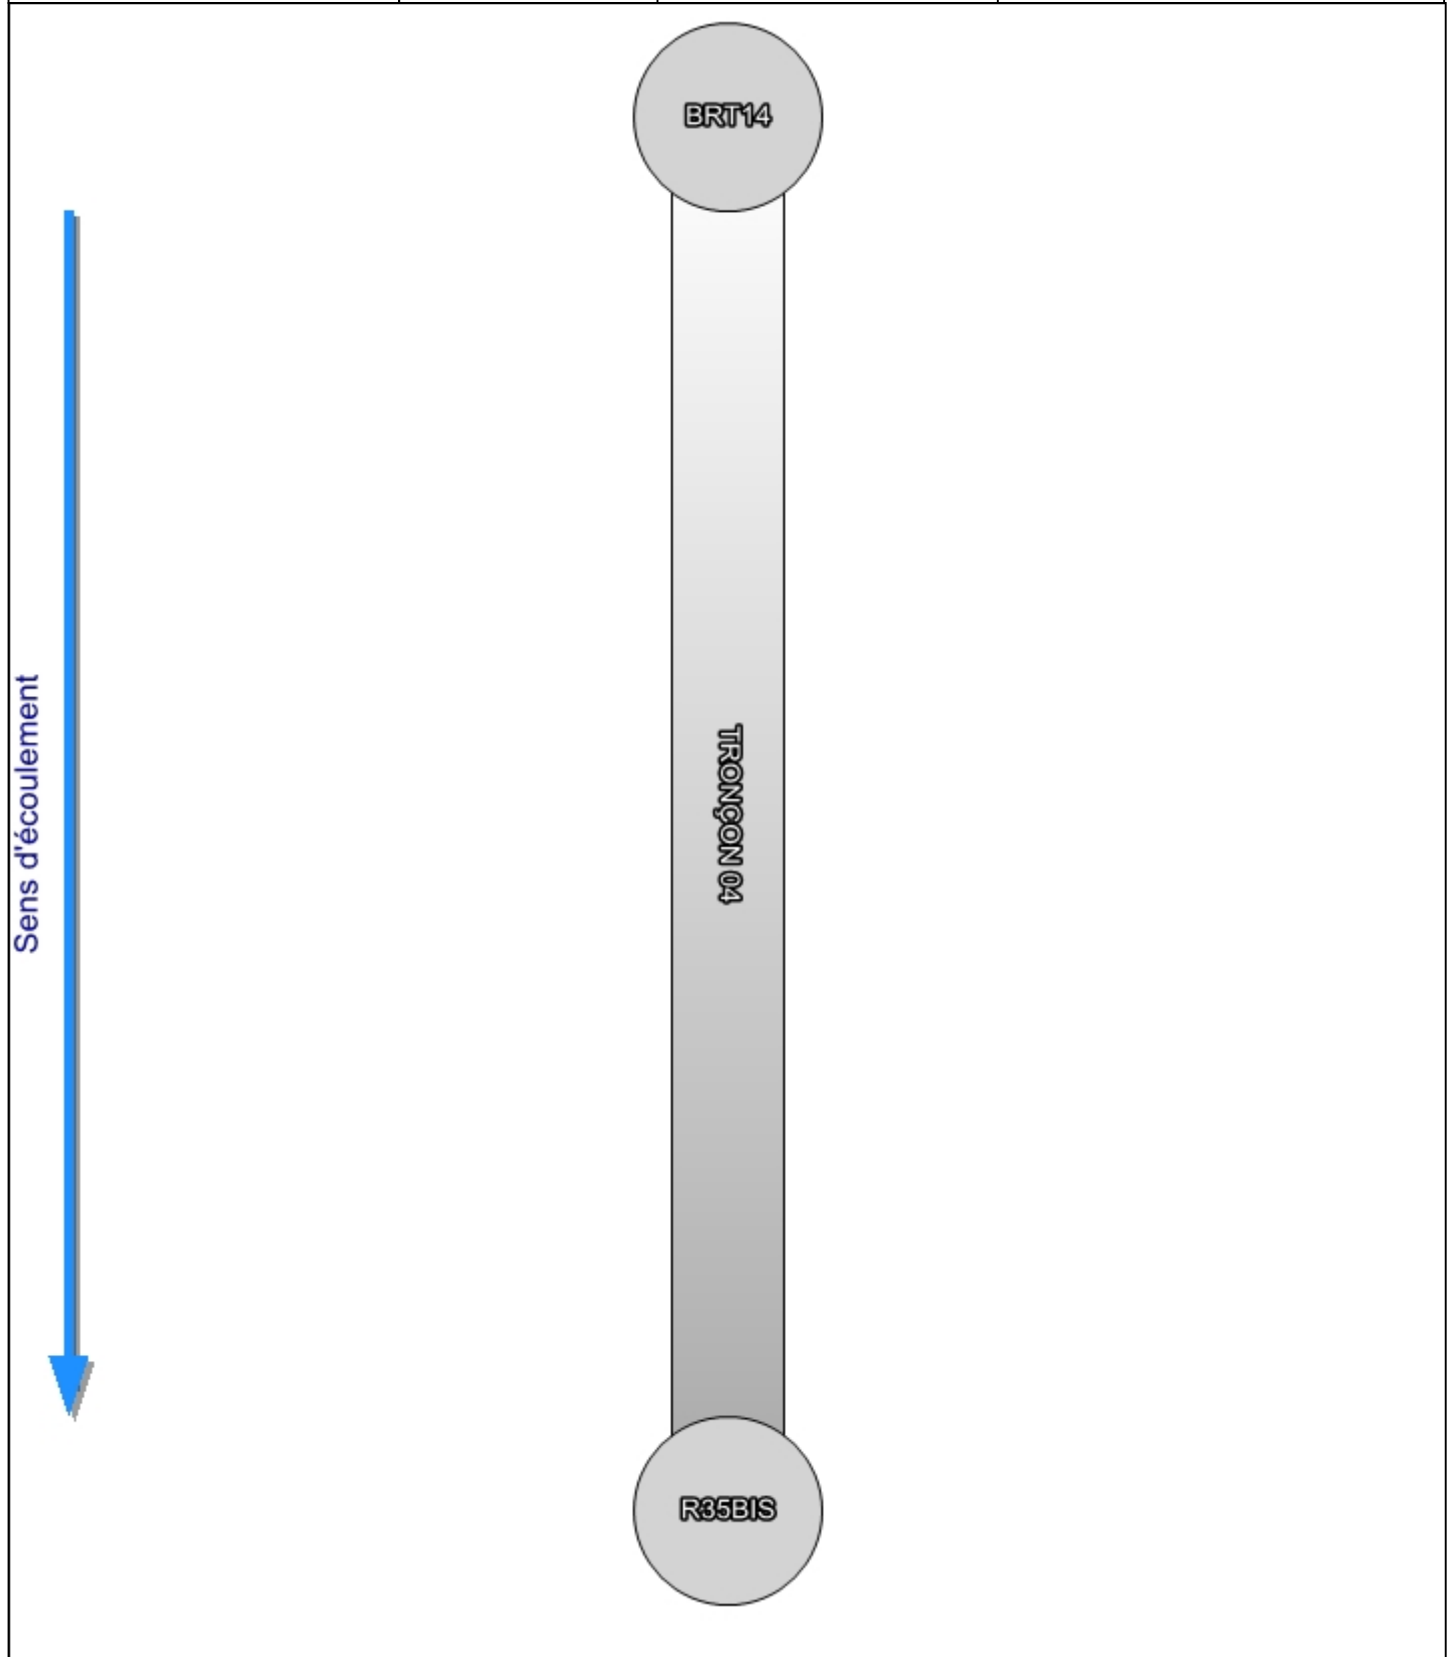

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 05		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT15	Date d'inspection:	22/11/2019
Noeud d'arrivée:	R35BIS	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT15 Vers R35BIS	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de Fenouil
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	7,48 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	7,48 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT15.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT15	Référence	R35BIS
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,7 m	Profondeur:	1,34 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 05		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT15 Vers R35BIS	Date de l'inspection: 2019-11-22
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT15 (0,7m) Vers R35BIS (1,3m)	Longueur inspectée: 7,48 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 7,48 m	

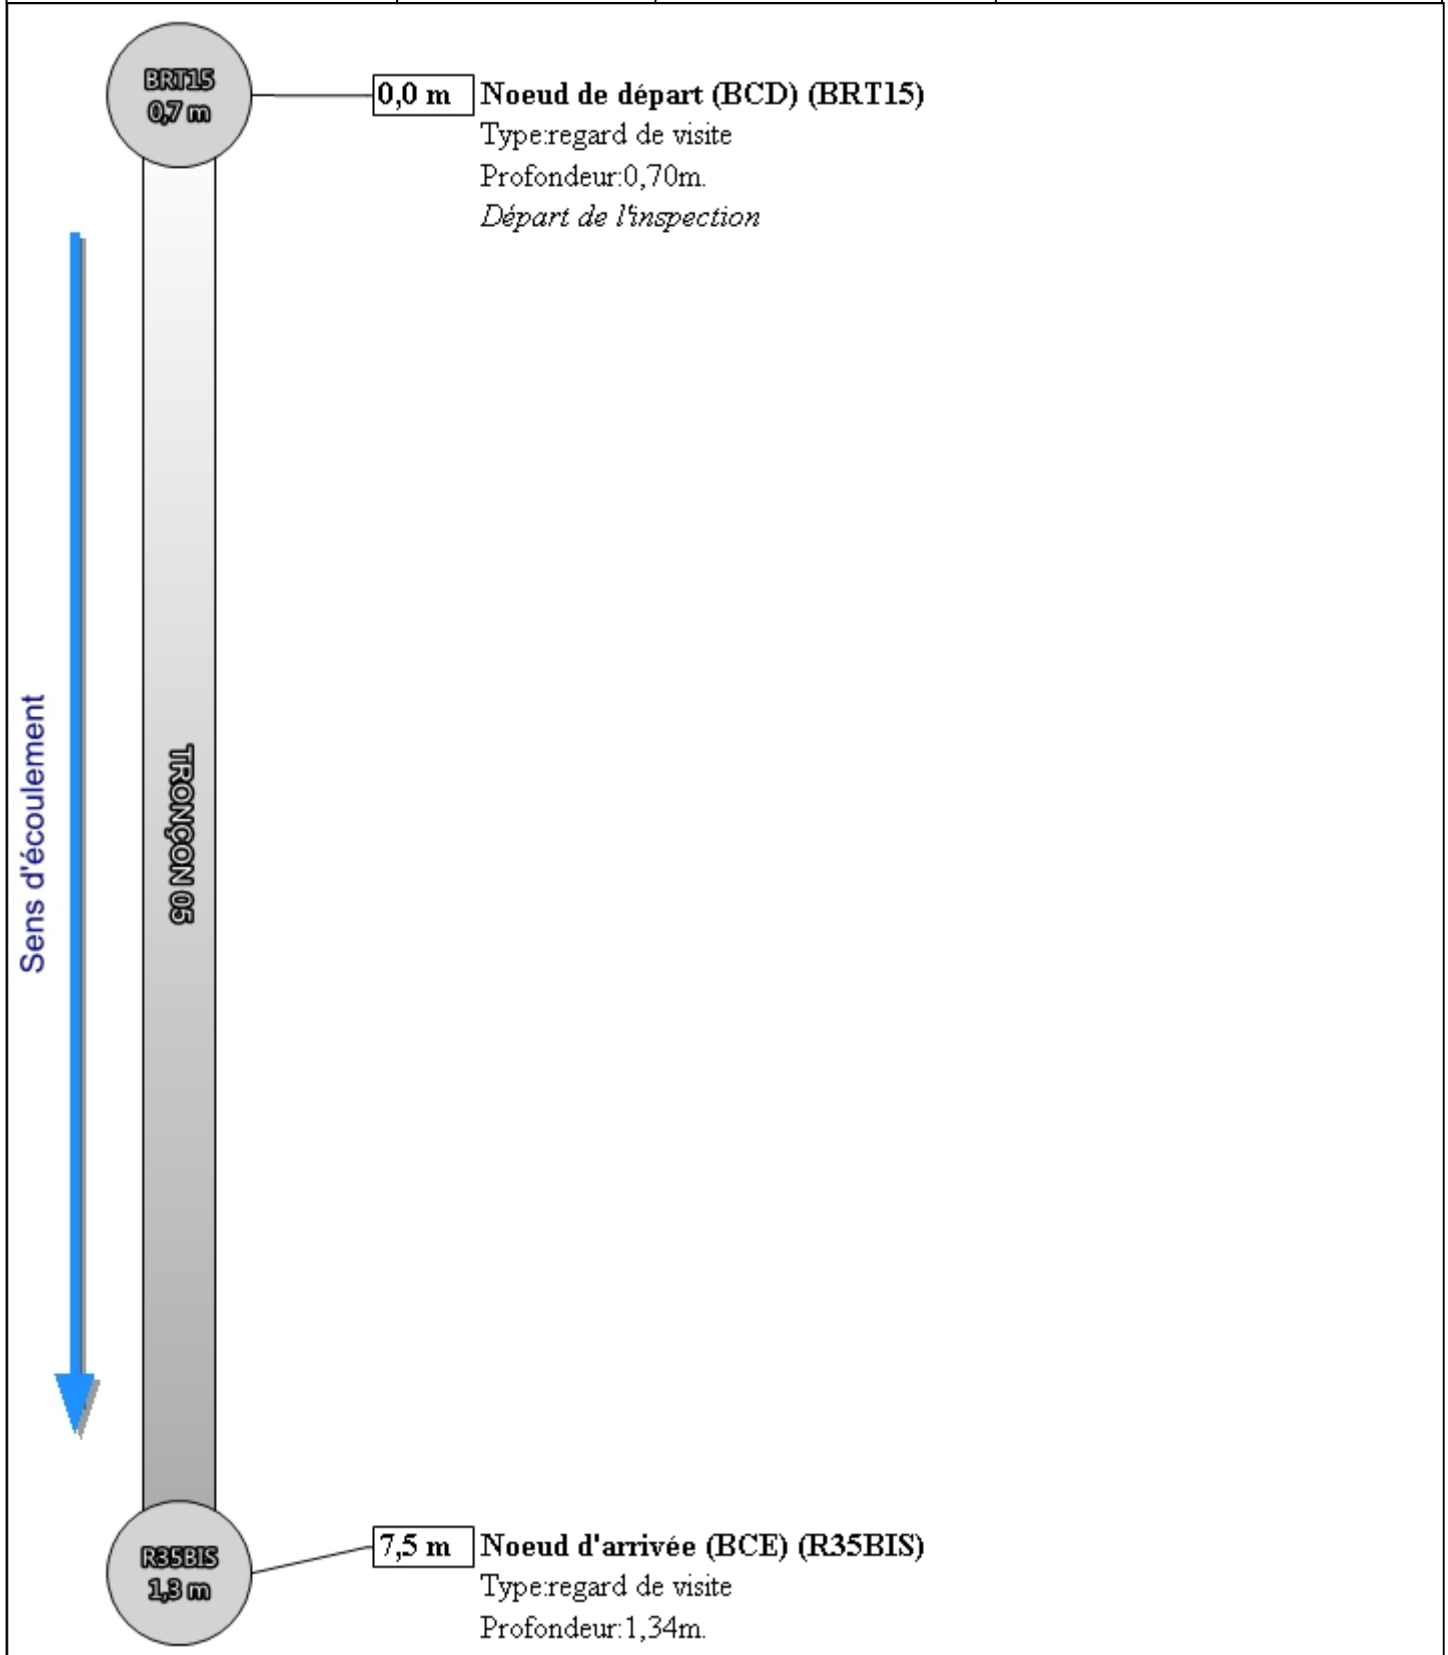

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 05		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT15 Vers R35BIS	Date de l'inspection: 2019-11-22
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT15 (0,7m) Vers R35BIS (1,3m)		Longueur inspectée: 7,48 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 7,48 m

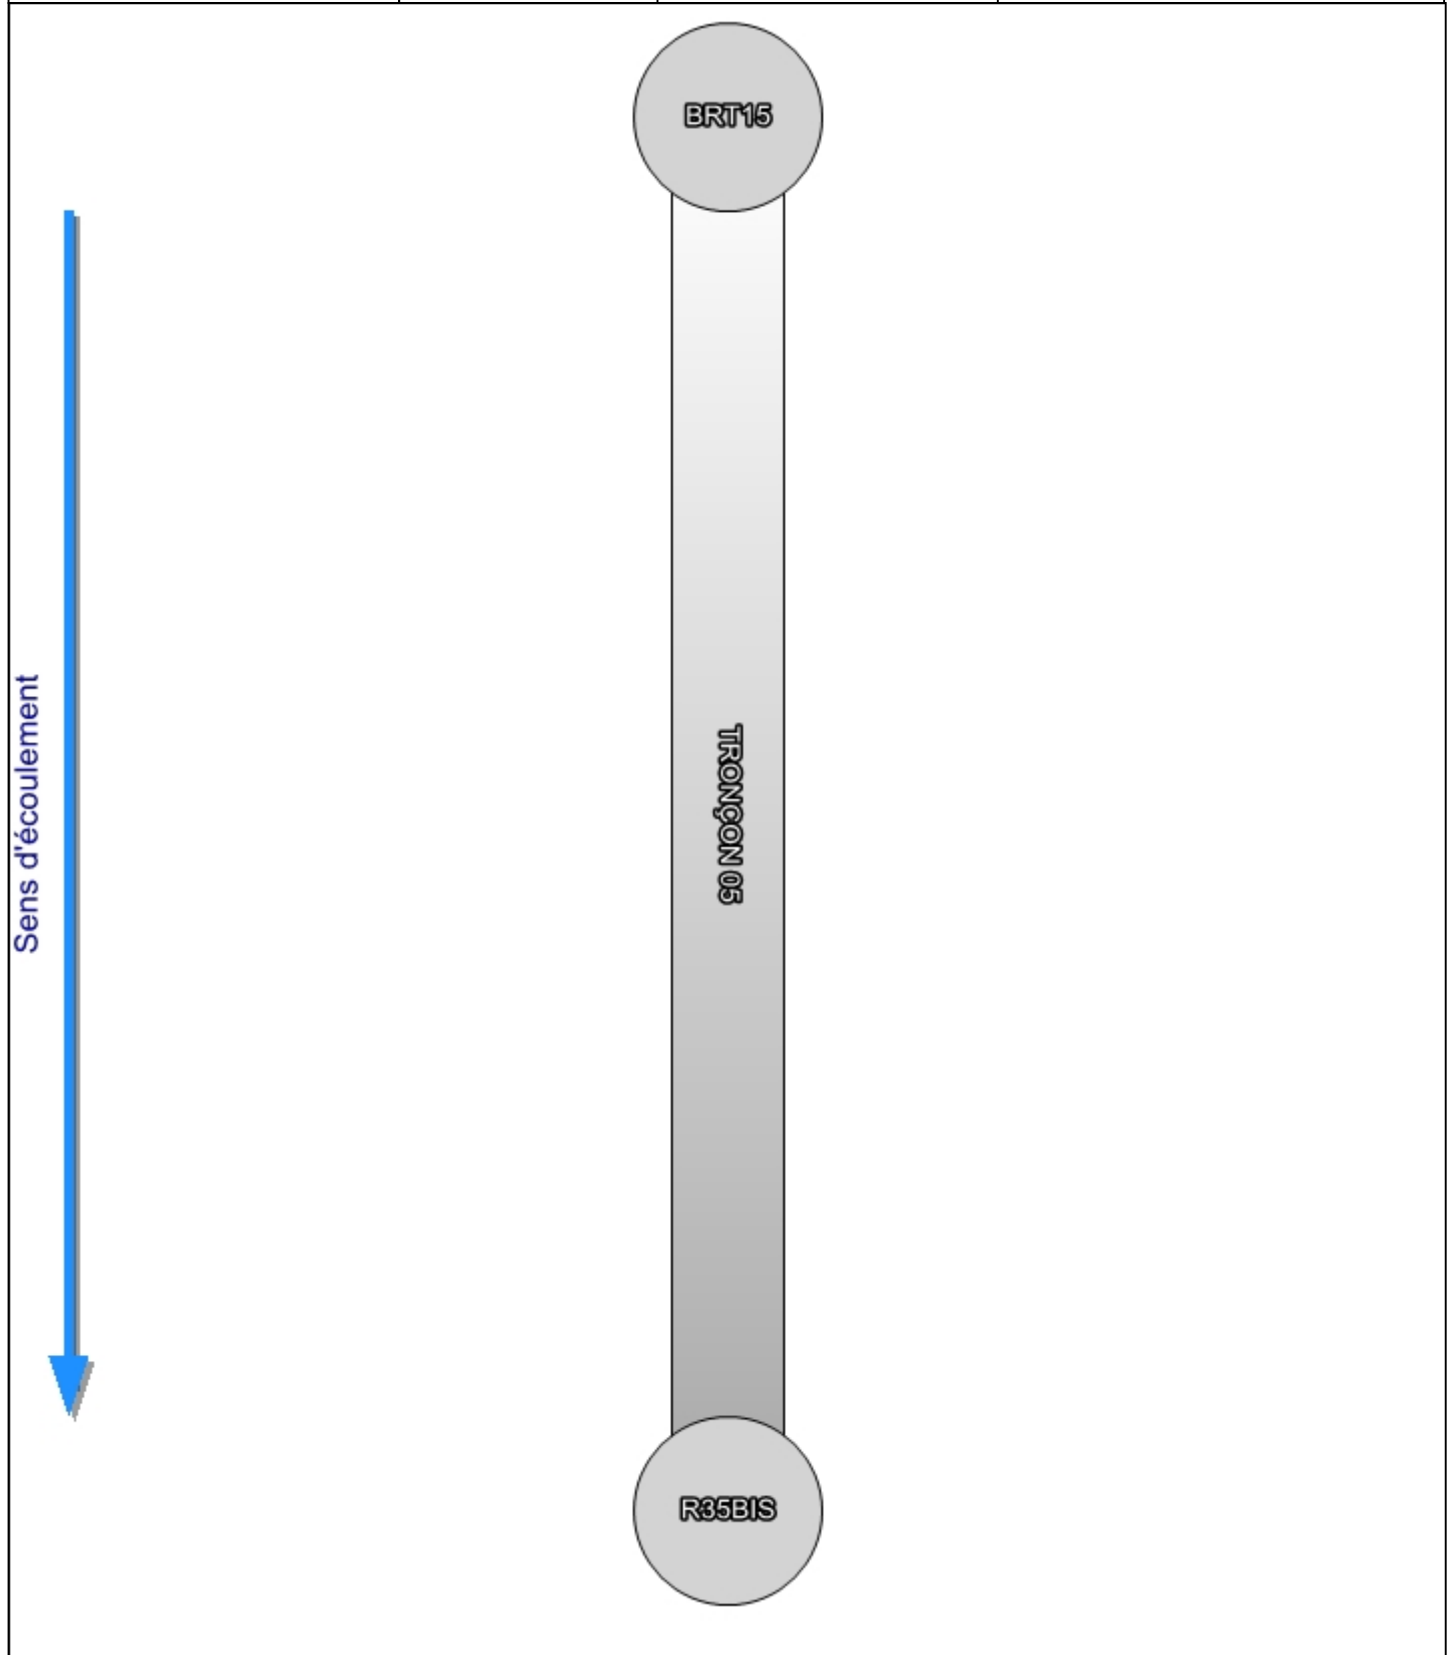

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 06		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT16	Date d'inspection:	22/11/2019
Noeud d'arrivée:	R35	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT16 Vers R35	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de Fenouil
Mise en service:		Quartier:	Quartier du petit mas
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	8,97 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	8,97 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Givry	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryBRT16.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT16	Référence	R35
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,71 m	Profondeur:	1,54 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

TRONÇON 06			Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT16 Vers R35	Date de l'inspection: 2019-11-22
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT16 (0,7m) Vers R35 (1,5m)	Longueur inspectée: 8,97 m
Matériau: PVC					Longueur mesurée: 8,97 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo		
	0,00				

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :BRT16

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4319.jpg
	8,97		<u>00:00:28</u>	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :R35



Gravité


Client	: MAMP
Chantier	: Quartier du petit mas

Entressen

Rapport

MAMP Entressen 151019 I


TRONÇON 06		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT16 Vers R35	Date de l'inspection: 2019-11-22
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT16 (0,7m) Vers R35 (1,5m)	Longueur inspectée: 8,97 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 8,97 m	

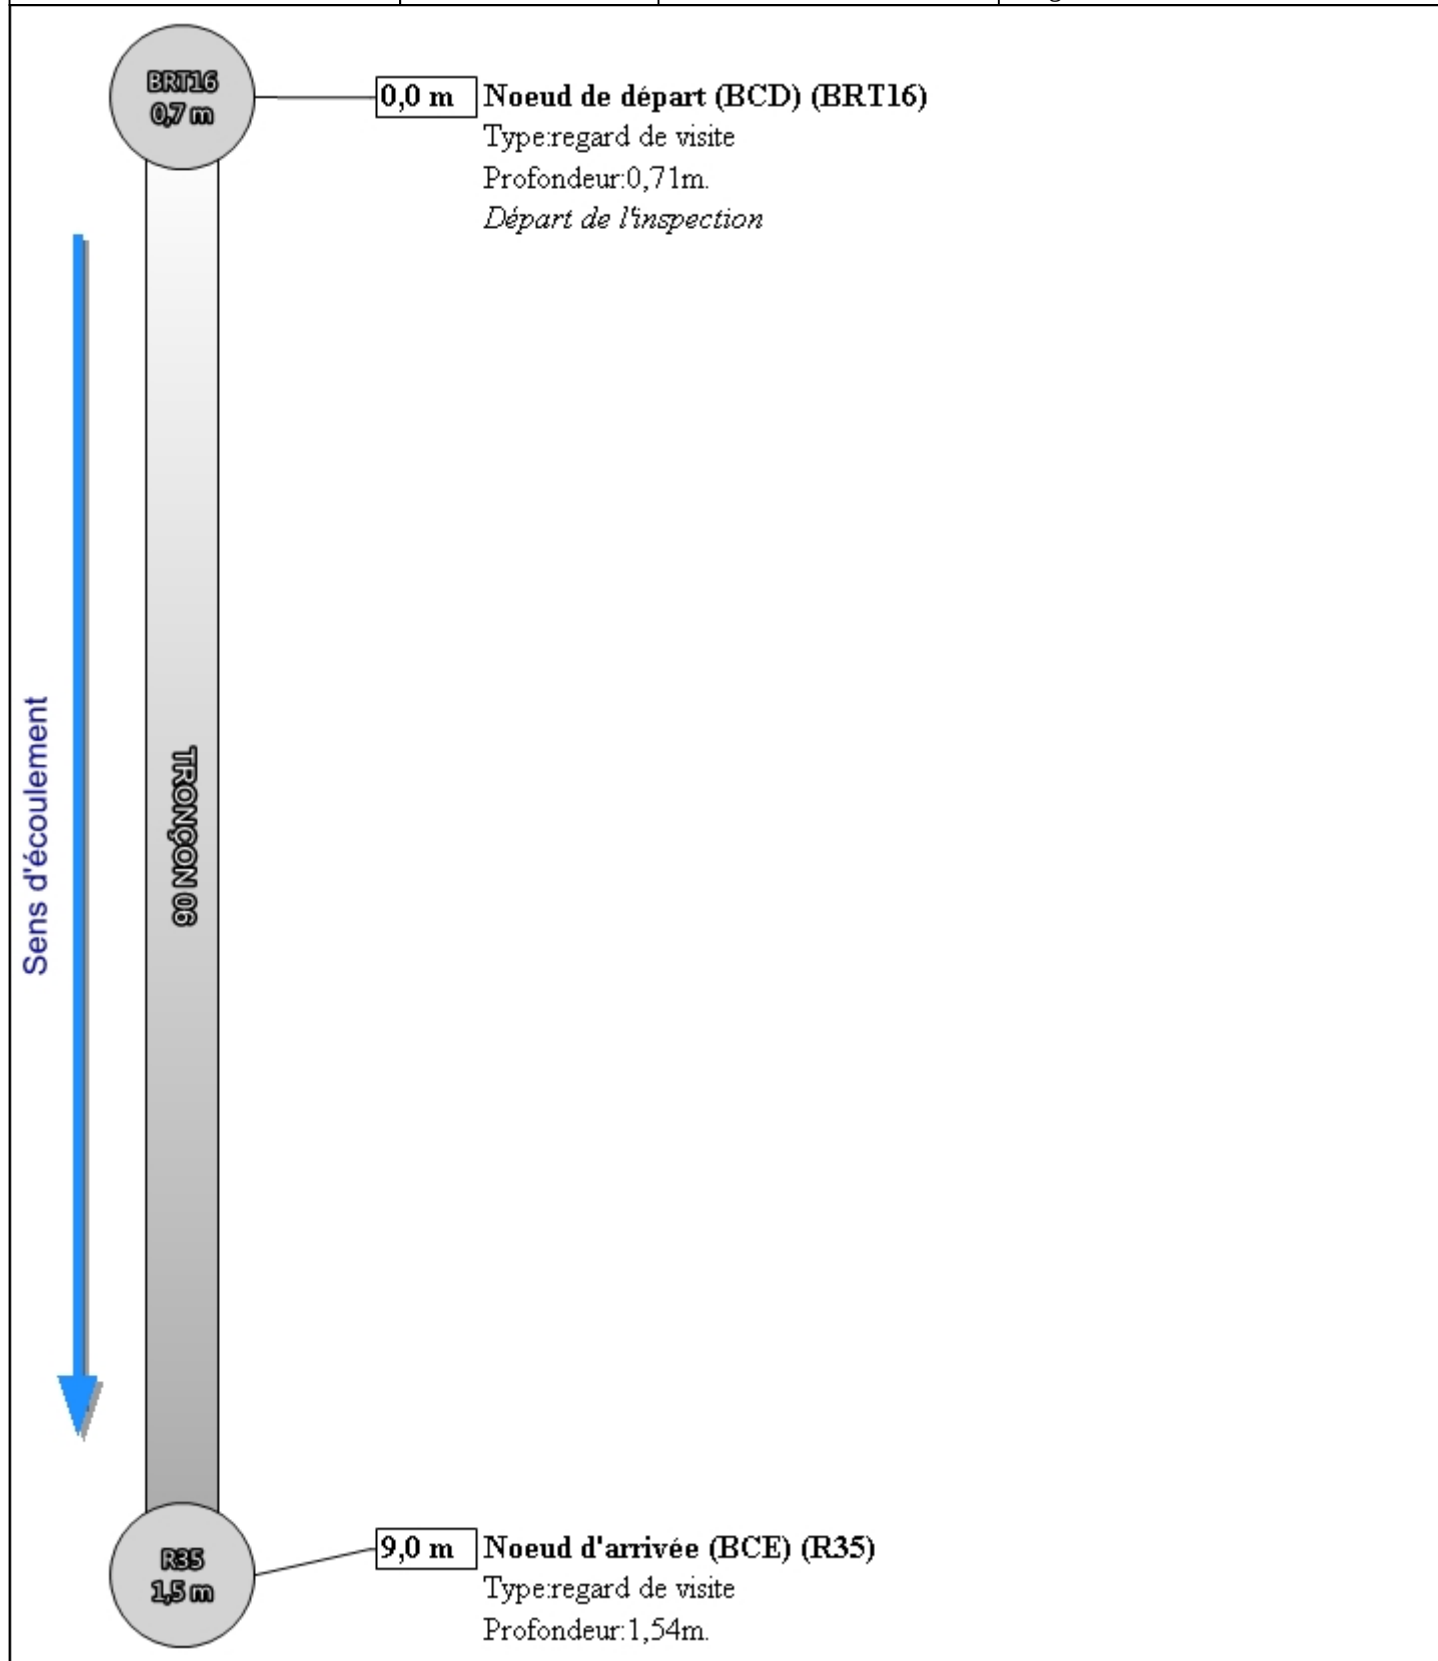

Client : MAMP
Chantier : Quartier du petit mas

Rapport
MAMP Entressen 151019 I

TRONÇON 06		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT16 Vers R35	Date de l'inspection: 2019-11-22
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT16 (0,7m) Vers R35 (1,5m)		Longueur inspectée: 8,97 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 8,97 m

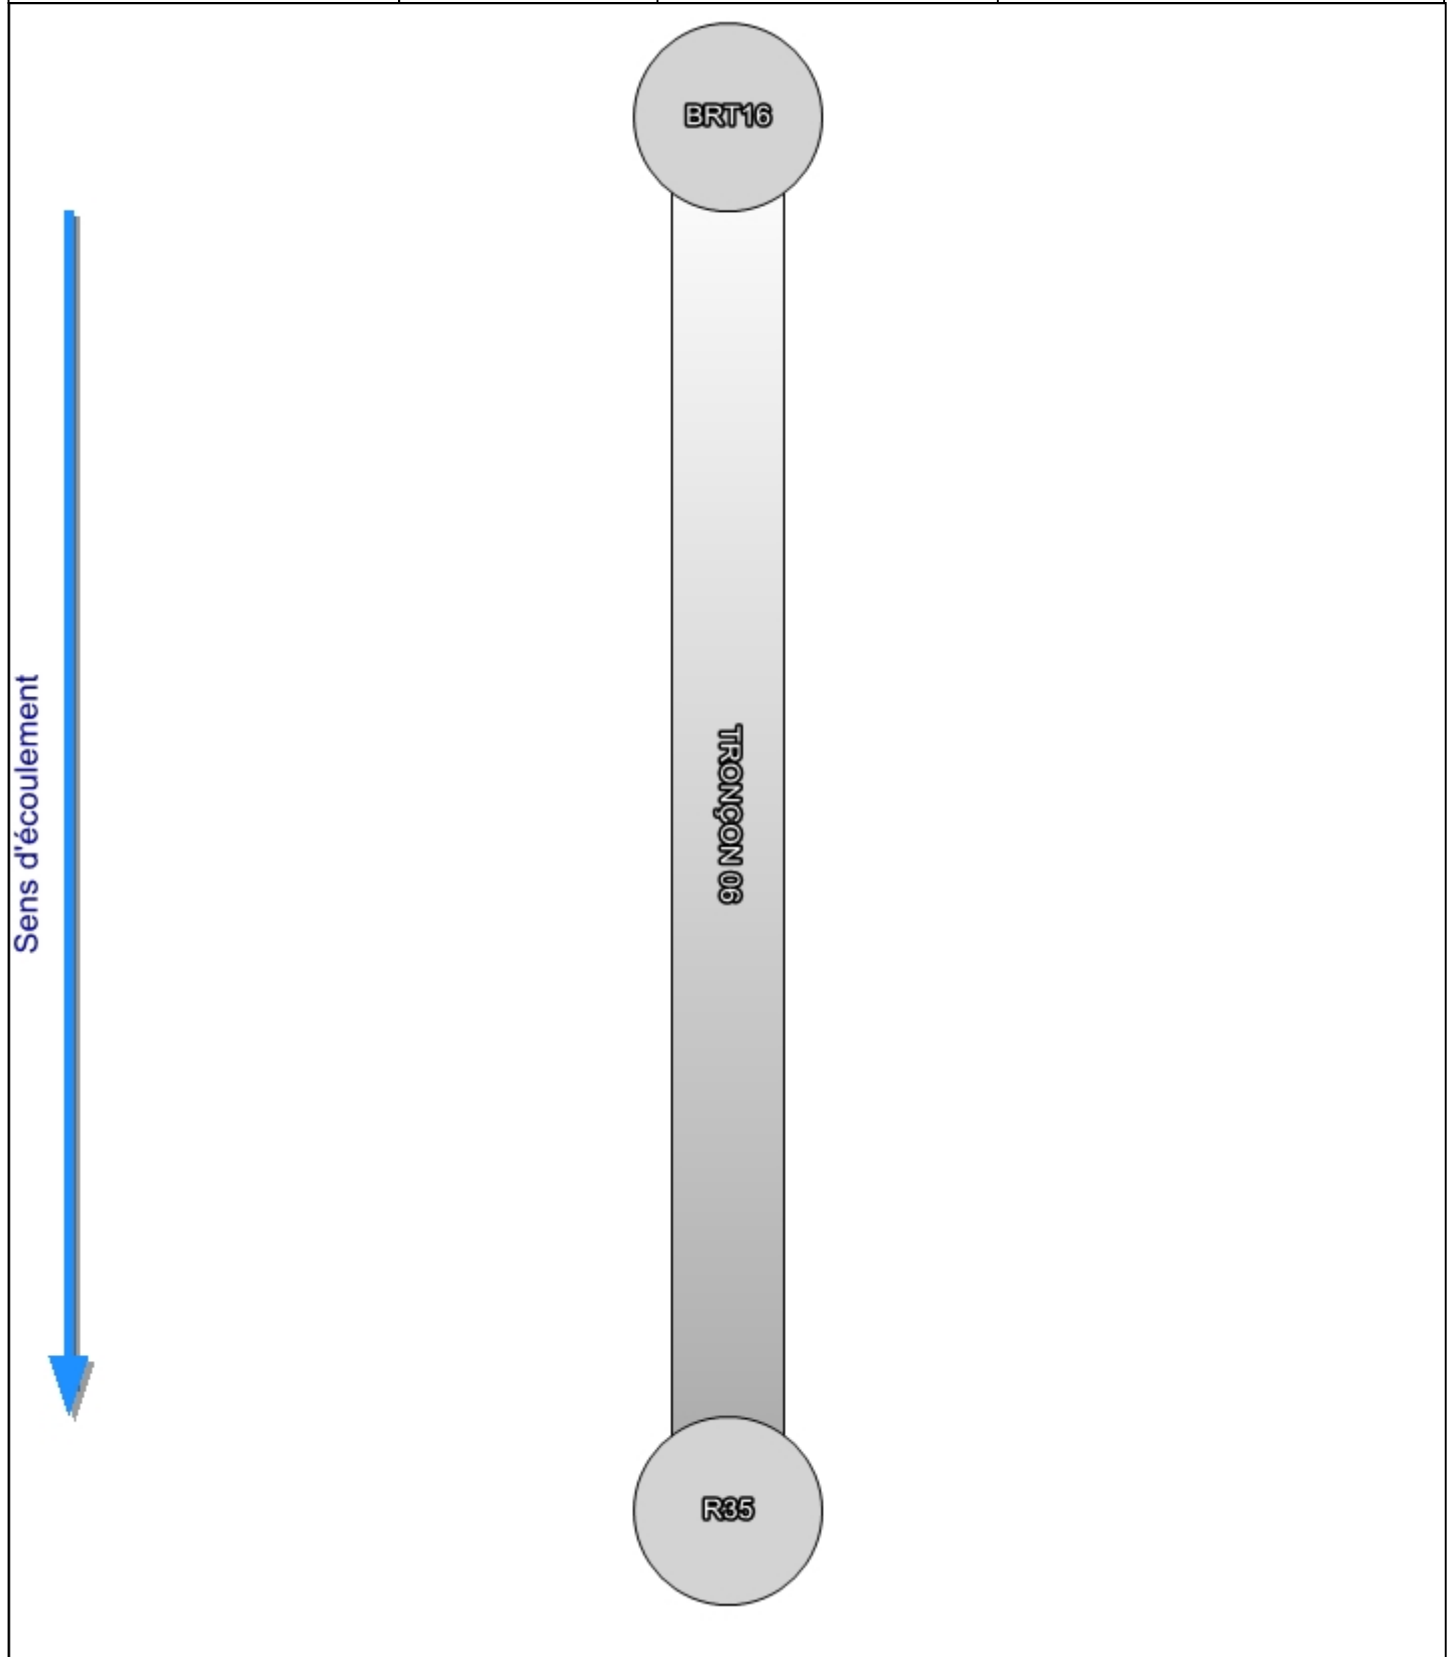

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

Ouvrage	Longueur	Diamètre	Matériau	Nb Anomalies	Commentaire	Page
SECTION Fenouil						
TRONÇON 01 R34 (1,1m) Vers R33 (1,4m)	30,94 m	200 mm	PVC	0		4
BRT5 BRT5 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	8,45 m	160 mm	PVC	0		11
BRT4 BRT4 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	8,47 m	160 mm	PVC	0		14
BRT3 BRT3 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	0,56 m	160 mm	PVC	0		17
BRT2 BRT2 (0,8m) Vers TRONÇON 01 (0,8m)	6,01 m	160 mm	PVC	0		20
BRT1 BRT1 (0,9m) Vers TRONÇON 01 (0,9m)	1,02 m	160 mm	PVC	0		23
TRONÇON 02 R35 (1,5m) Vers R34 (1,1m)	29,27 m	200 mm	PVC	0		26
BRT13 BRT13 (0,9m) Vers TRONÇON 02 (0,9m)	4,76 m	160 mm	PVC	0		35
BRT12 BRT12 (0,9m) Vers TRONÇON 02 (0,9m)	5,62 m	160 mm	PVC	0		38
BRT11 BRT11 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	16,44 m	160 mm	PVC	0		41
BRT10 BRT10 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	16,69 m	160 mm	PVC	0		44
BRT9 BRT9 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	19,89 m	160 mm	PVC	0		47
BRT8 BRT8 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	22,11 m	160 mm	PVC	0		50
BRT7 BRT7 (1,0m) Vers TRONÇON 02 (1,0m)	10,12 m	160 mm	PVC	0		53
BRT6 BRT6 (1,0m) Vers TRONÇON 02 (1,0m)	8,39 m	160 mm	PVC	0		56
TRONÇON 03 R35 (1,5m) Vers R35BIS (1,3m)	14,93 m	200 mm	PVC	0		59
TRONÇON 04 BRT14 (0,6m) Vers R35BIS (1,3m)	9,63 m	160 mm	PVC	0		64
TRONÇON 05 BRT15 (0,7m) Vers R35BIS (1,3m)	7,48 m	160 mm	PVC	0		68

Client : MAMP
Chantier : Quartier du petit mas

Rapport
MAMP Entressen 151019 I



RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

Ouvrage	Longueur	Diamètre	Matériau	Nb Anomalies	Commentaire	Page
TRONÇON 06 BRT16 (0,7m) Vers R35 (1,5m)	8,97 m	160 mm	PVC	0		72

Synthèse

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

SECTION Fenouil

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 01 R34 (1,1m) Vers R33 (1,4m)	200	30,94 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 3840.jpg <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,50 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R34 3841.jpg 00:00:08 1183.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>		
	4,00 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT5 Position: 03H 3842.jpg 00:00:43 1183.avi		
	4,31 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT4 Position: 03H 3843.jpg 00:01:04 1183.avi		
	13,47 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT3 Position: 10H 3844.jpg 00:01:56 1183.avi		
	24,43 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT2 Position: 03H 3845.jpg 00:02:58 1183.avi		
	27,72 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT1 Position: 10H 3846.jpg 00:03:32 1183.avi		
	30,44 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R33 3847.jpg 00:04:01 1183.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>		
	30,94 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 3848.jpg 00:04:23 1183.avi <i>Fin de l'inspection</i>		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT5 BRT5 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	160	8,45 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT5 <i>Départ de l'inspection</i>		
	8,45 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4289.jpg 00:00:42 FormatFactoryBRT5.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT4 BRT4 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)	160	8,47 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

Client : MAMP	Rapport MAMP Entressen 151019 I
Chantier : Quartier du petit mas	
Entressen	Page 78 / 83

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

0,00 m (BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT4
Départ de l'inspection

8,47 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
4291.jpg
00:00:40 FormatFactoryBRT4.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT3	160	0,56 m	eaux usées	
BRT3 (1,0m) Vers TRONÇON 01 (1,0m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT3 <i>Départ de l'inspection</i>
0,56 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4293.jpg 00:00:08 FormatFactoryBRT3.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT2	160	6,01 m	eaux usées	
BRT2 (0,8m) Vers TRONÇON 01 (0,8m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT2 <i>Départ de l'inspection</i>
6,01 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4295.jpg 00:01:01 FormatFactoryBRT2.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT1	160	1,02 m	eaux usées	
BRT1 (0,9m) Vers TRONÇON 01 (0,9m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT1 <i>Départ de l'inspection</i>
1,02 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4297.jpg 00:00:21 FormatFactoryBRT1.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 02	200	29,27 m	eaux usées	
R35 (1,5m) Vers R34 (1,1m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 3829.jpg <i>Départ de l'inspection</i>
0,50 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R35 <i>Liaison regard - canalisation</i>
0,60 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT13 Position: 03H 3830.jpg
2,06 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT12 Position: 03H 3831.jpg 00:00:42 1182.avi

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	Page 79 / 83

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

2,46 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT11 Position: 03H 3832.jpg 00:01:05 1182.avi
14,29 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT10 Position: 03H 3833.jpg 00:02:10 1182.avi
14,62 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT9 Position: 03H 3834.jpg 00:02:34 1182.avi
17,90 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT8 Position: 09H 3835.jpg 00:03:07 1182.avi
18,28 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT7 Position: 09H 3836.jpg 00:03:27 1182.avi
18,64 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT6 Position: 09H 3837.jpg 00:03:51 1182.avi
28,77 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R34 3838.jpg 00:04:50 1182.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
29,27 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 3839.jpg 00:05:16 1182.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT13	160	4,76 m	eaux usées	
BRT13 (0,9m) Vers TRONÇON 02 (0,9m)				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT13 <i>Départ de l'inspection</i>		
	4,76 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4313.jpg 00:00:23 FormatFactoryBRT13.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT12	160	5,62 m	eaux usées	
BRT12 (0,9m) Vers TRONÇON 02 (0,9m)				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT12 <i>Départ de l'inspection</i>		
	5,62 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4311.jpg 00:00:45 FormatFactoryBRT12.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT11	160	16,44 m	eaux usées	
BRT11 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)				
	Distance	Observations		

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	Page 80 / 83

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

0,00 m (BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT11
Départ de l'inspection

16,44 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
4309.jpg
00:02:14 FormatFactoryBRT11.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT10	160	16,69 m	eaux usées	
BRT10 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT10 <i>Départ de l'inspection</i>
16,69 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4307.jpg 00:01:08 FormatFactoryBRT10.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT9	160	19,89 m	eaux usées	
BRT9 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT9 <i>Départ de l'inspection</i>
19,89 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4305.jpg 00:01:16 FormatFactoryBRT9.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT8	160	22,11 m	eaux usées	
BRT8 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT8 <i>Départ de l'inspection</i>
22,11 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4303.jpg 00:04:07 FormatFactoryBRT8.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT7	160	10,12 m	eaux usées	
BRT7 (1,0m) Vers TRONÇON 02 (1,0m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT7 <i>Départ de l'inspection</i>
10,12 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4301.jpg 00:00:37 FormatFactoryBRT7.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
---------	-----------	--------------------	--------	-------

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	Page 81 / 83

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

BRT6	160	8,39 m	eaux usées
BRT6 (1,0m) Vers TRONÇON 02 (1,0m)			

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT6 <i>Départ de l'inspection</i>
8,39 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 4299.jpg 00:00:35 FormatFactoryBRT6.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 03	200	14,93 m	eaux usées	
R35 (1,5m) Vers R35BIS (1,3m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>
0,50 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R35 <i>Liaison regard - canalisation</i>
14,43 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R35BIS 3849.jpg 00:01:04 1184.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
14,93 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 3850.jpg 00:01:52 1184.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 04	160	9,63 m	eaux usées	
BRT14 (0,6m) Vers R35BIS (1,3m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT14 <i>Départ de l'inspection</i>
9,63 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R35BIS 4315.jpg 00:00:59 FormatFactoryBRT14.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 05	160	7,48 m	eaux usées	
BRT15 (0,7m) Vers R35BIS (1,3m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT15 <i>Départ de l'inspection</i>
7,48 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R35BIS 4317.jpg 00:00:20 FormatFactoryBRT15.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
---------	-----------	--------------------	--------	-------

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Quartier du petit mas	MAMP Entressen 151019 I
Entressen	Page 82 / 83

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

TRONÇON 06 160 8,97 m eaux usées
BRT16 (0,7m) Vers R35 (1,5m)

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT16 <i>Départ de l'inspection</i>
8,97 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R35 4319.jpg 00:00:28 FormatFactoryBRT16.avi

Client : MAMP
Chantier : Quartier du petit mas
Entressen

Rapport
MAMP Entressen 151019 I
