



INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

Client: MAMP	Chantier: Rue Pèbre D'Ail Entressen
Maitre d'oeuvre:	Maitre d'ouvrage:
Référence du dossier :	
Nom du rapport :	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Date de l'inspection :	02/12/2020 - 02/12/2020
Distance totale inspectée :	132,24 + 122,25 = 254,49 m
Distance totale non inspectée :	0 m
Distance totale :	132,24 + 122,25 = 254,49 m

Etabli par: Mr Delcorso Date: 02/12/2020 Visa:	Vérifié par: Mr Pepin Date: 02/12/2020 Visa:	Approuvé par: Mr Pepin Date: 02/12/2020 Visa:
--	--	---

SPGS

SOMMAIRE

TRONÇON 01	5
R9 (1,4m) Vers R9B (1,5m)	
BR - T2	12
BR-T2 Vers TRONÇON 01	
TRONÇON 02	15
R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	
BR - T3	25
BR-T3 Vers TRONÇON 02	
BR - T4	28
BR-T4 Vers TRONÇON 02	
BR - T5	31
BR-T5 Vers TRONÇON 02	
BR - T6	34
BR-T6 Vers TRONÇON 02	
TRONÇON 03	37
R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	
BR - T7	50
BR-T7 Vers TRONÇON 03	
BR - T8	53
BR-T8 Vers TRONÇON 03	
BR - T9	56
BR-T9 Vers TRONÇON 03	
BR - T10	59
BR-T10 Vers TRONÇON 03	
BR - T11	62
BR-T11 Vers TRONÇON 03	
BR - T12	65
BR-T12 Vers TRONÇON 03	
TRONÇON 04	68
R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	
BR - T13	80
BR-T13 Vers TRONÇON 04	
BR - T14	83
BR-T14 Vers TRONÇON 04	
BR - T15	86
BR-T15 Vers TRONÇON 04	
BR - T16	89
BR-T16 Vers TRONÇON 04	
BR - T17	92
BR-T17 Vers TRONÇON 04	
TRONÇON 05	95
R9 (1,4m) Vers R10EXIST (1,4m)	
BR - T1	101
BR-T1 Vers TRONÇON 05	

TRONÇON 06	104
R7 (1,3m) Vers BRT18 (0,0m)	
BR-T19	109
BR-T19 Vers TRONÇON 06	
TRONÇON 07	112
BRT18 Vers R7	

Entressen

TRONÇON 01		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R9	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	R9B	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R9B Vers R9	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	5,88 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	5,88 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	


Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	3360.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R9	Référence	R9B
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,43 m	Profondeur:	1,45 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

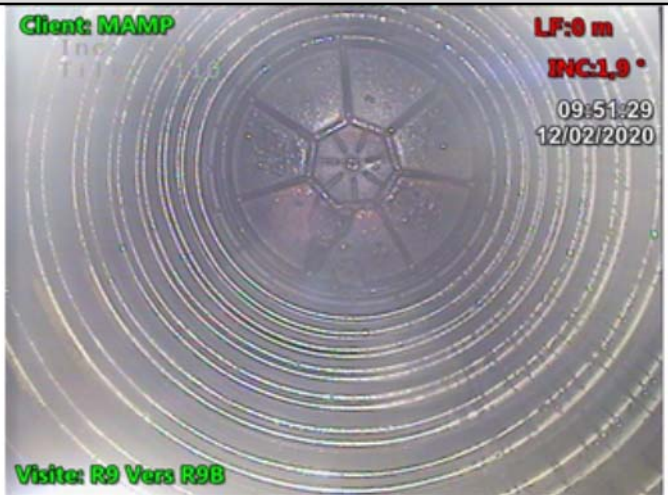TRONÇON 01			Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9B Vers R9	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 5,88 m
Matériau: PVC				R9 (1,4m) Vers R9B (1,5m)	Longueur mesurée: 5,88 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9908.jpg	
	0,00				
(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>					

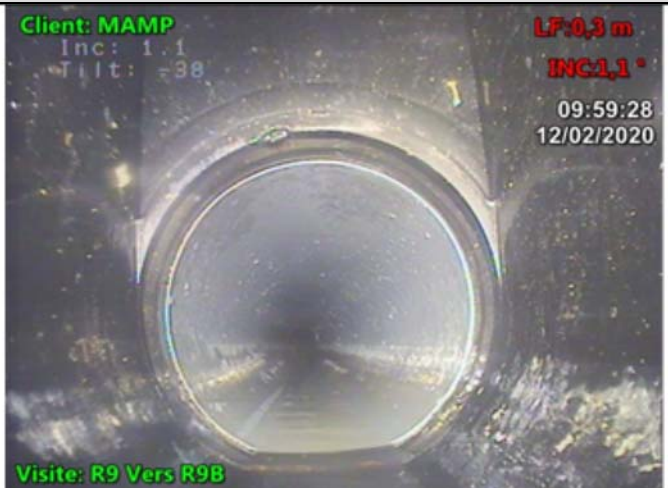	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9922.jpg	
	0,30				
(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R9 <i>Liaison regard - canalisation</i>					

Client	: MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier	:	
	Rue Père D'Ail Entressen	


TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9B Vers R9	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9 (1,4m) Vers R9B (1,5m)	Longueur inspectée: 5,88 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 5,88 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	
3,03		00:00:22	9904.jpg

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T2
Position: 03H



9905.jpg

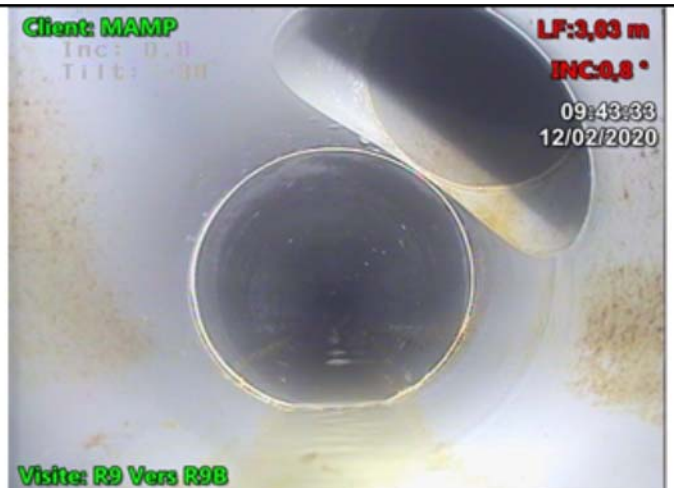

Distance	Fil d'eau	Vidéo	
5,58		00:01:09	9906.jpg

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE
regard de visite :R9B
Liaison canalisation - regard



Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I


TRONÇON 01			Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9B Vers R9	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 5,88 m
Matériau: PVC				R9 (1,4m) Vers R9B (1,5m)	Longueur mesurée: 5,88 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9907.jpg	
	5,88		00:01:37		

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Fin de l'inspection



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 8 / 124


TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9B Vers R9	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9 (1,4m) Vers R9B (1,5m)	Longueur inspectée: 5,88 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 5,88 m	

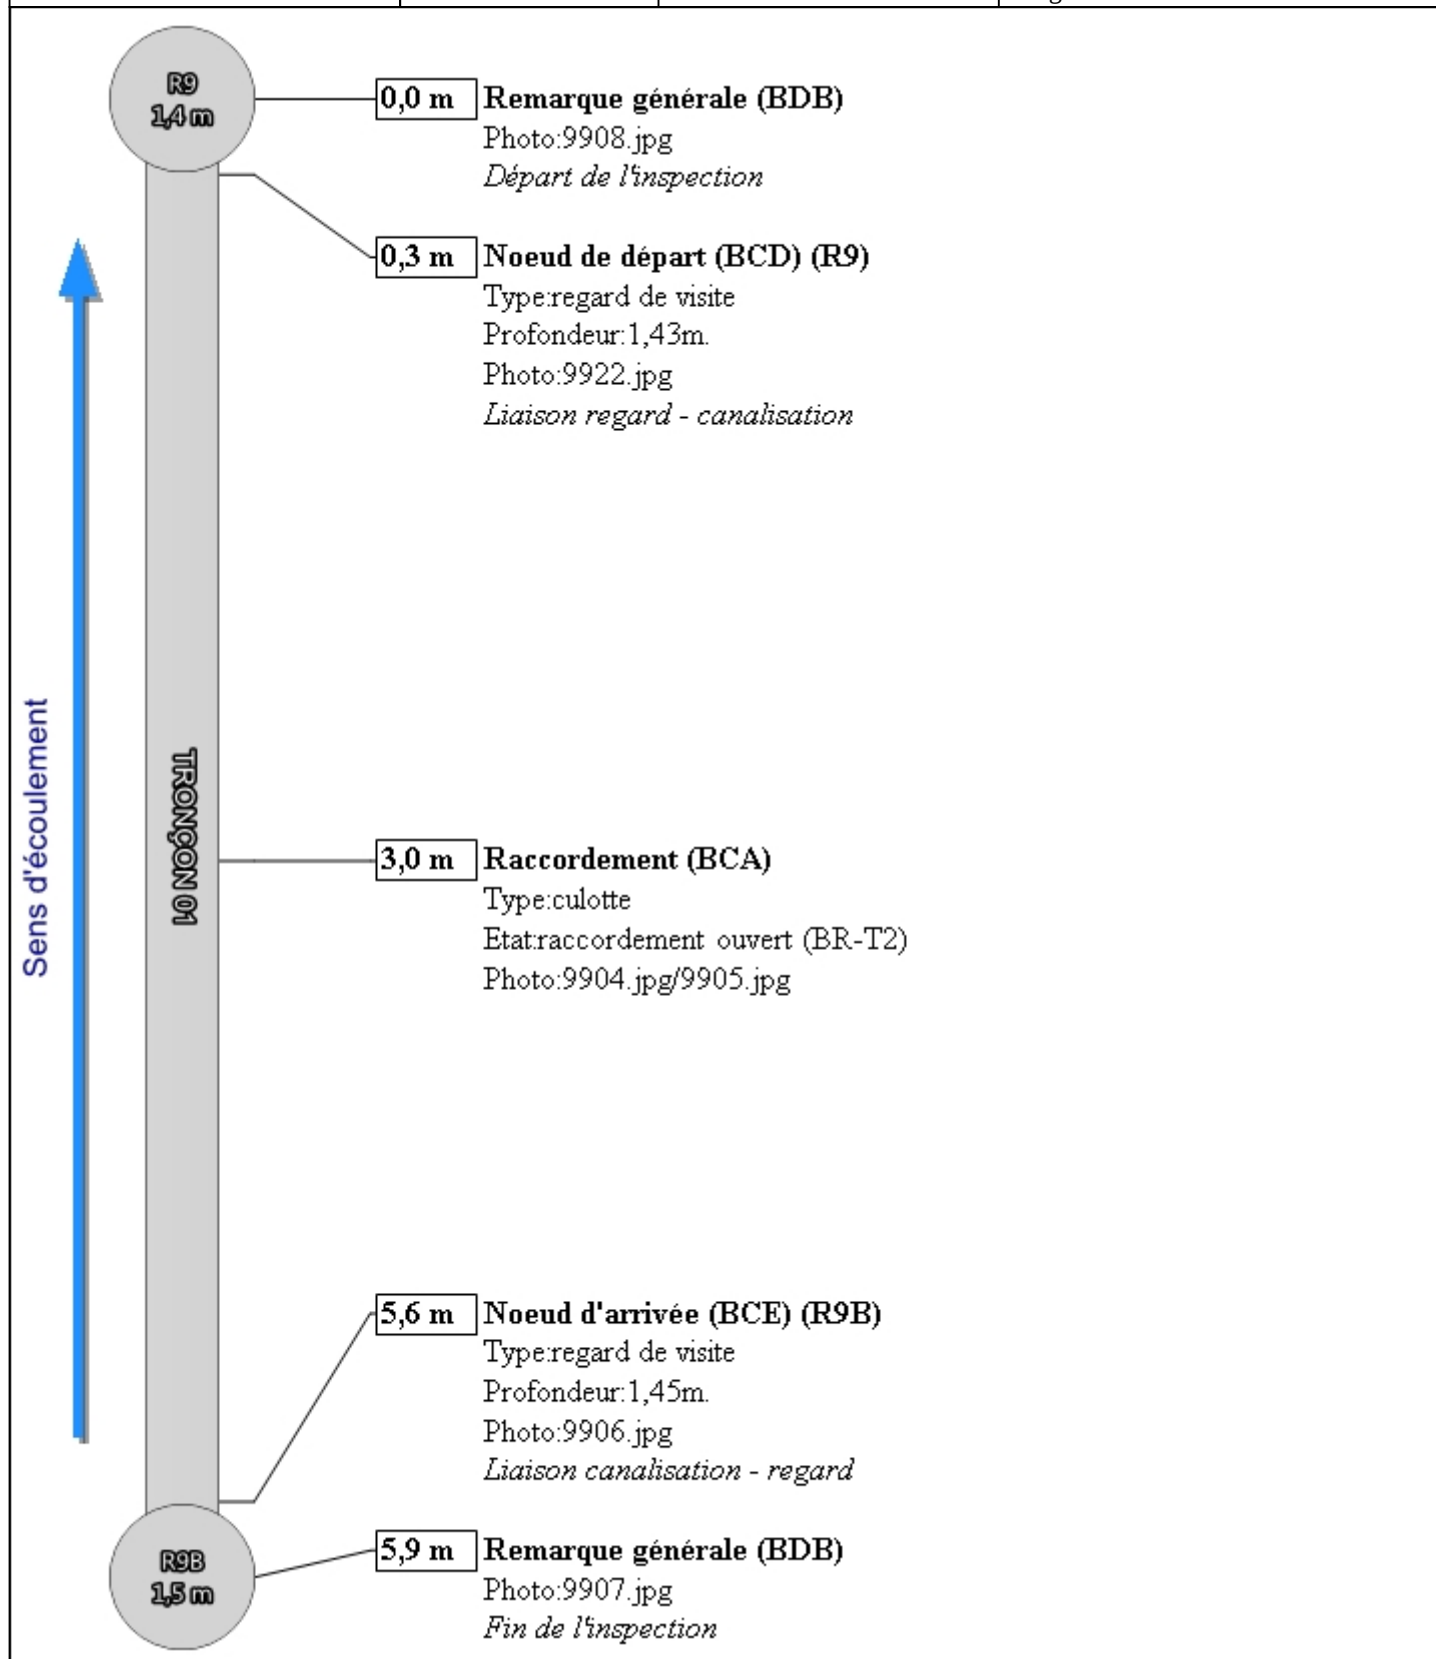

Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9B Vers R9	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9 (1,4m) Vers R9B (1,5m)	Longueur inspectée: 5,88 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 5,88 m

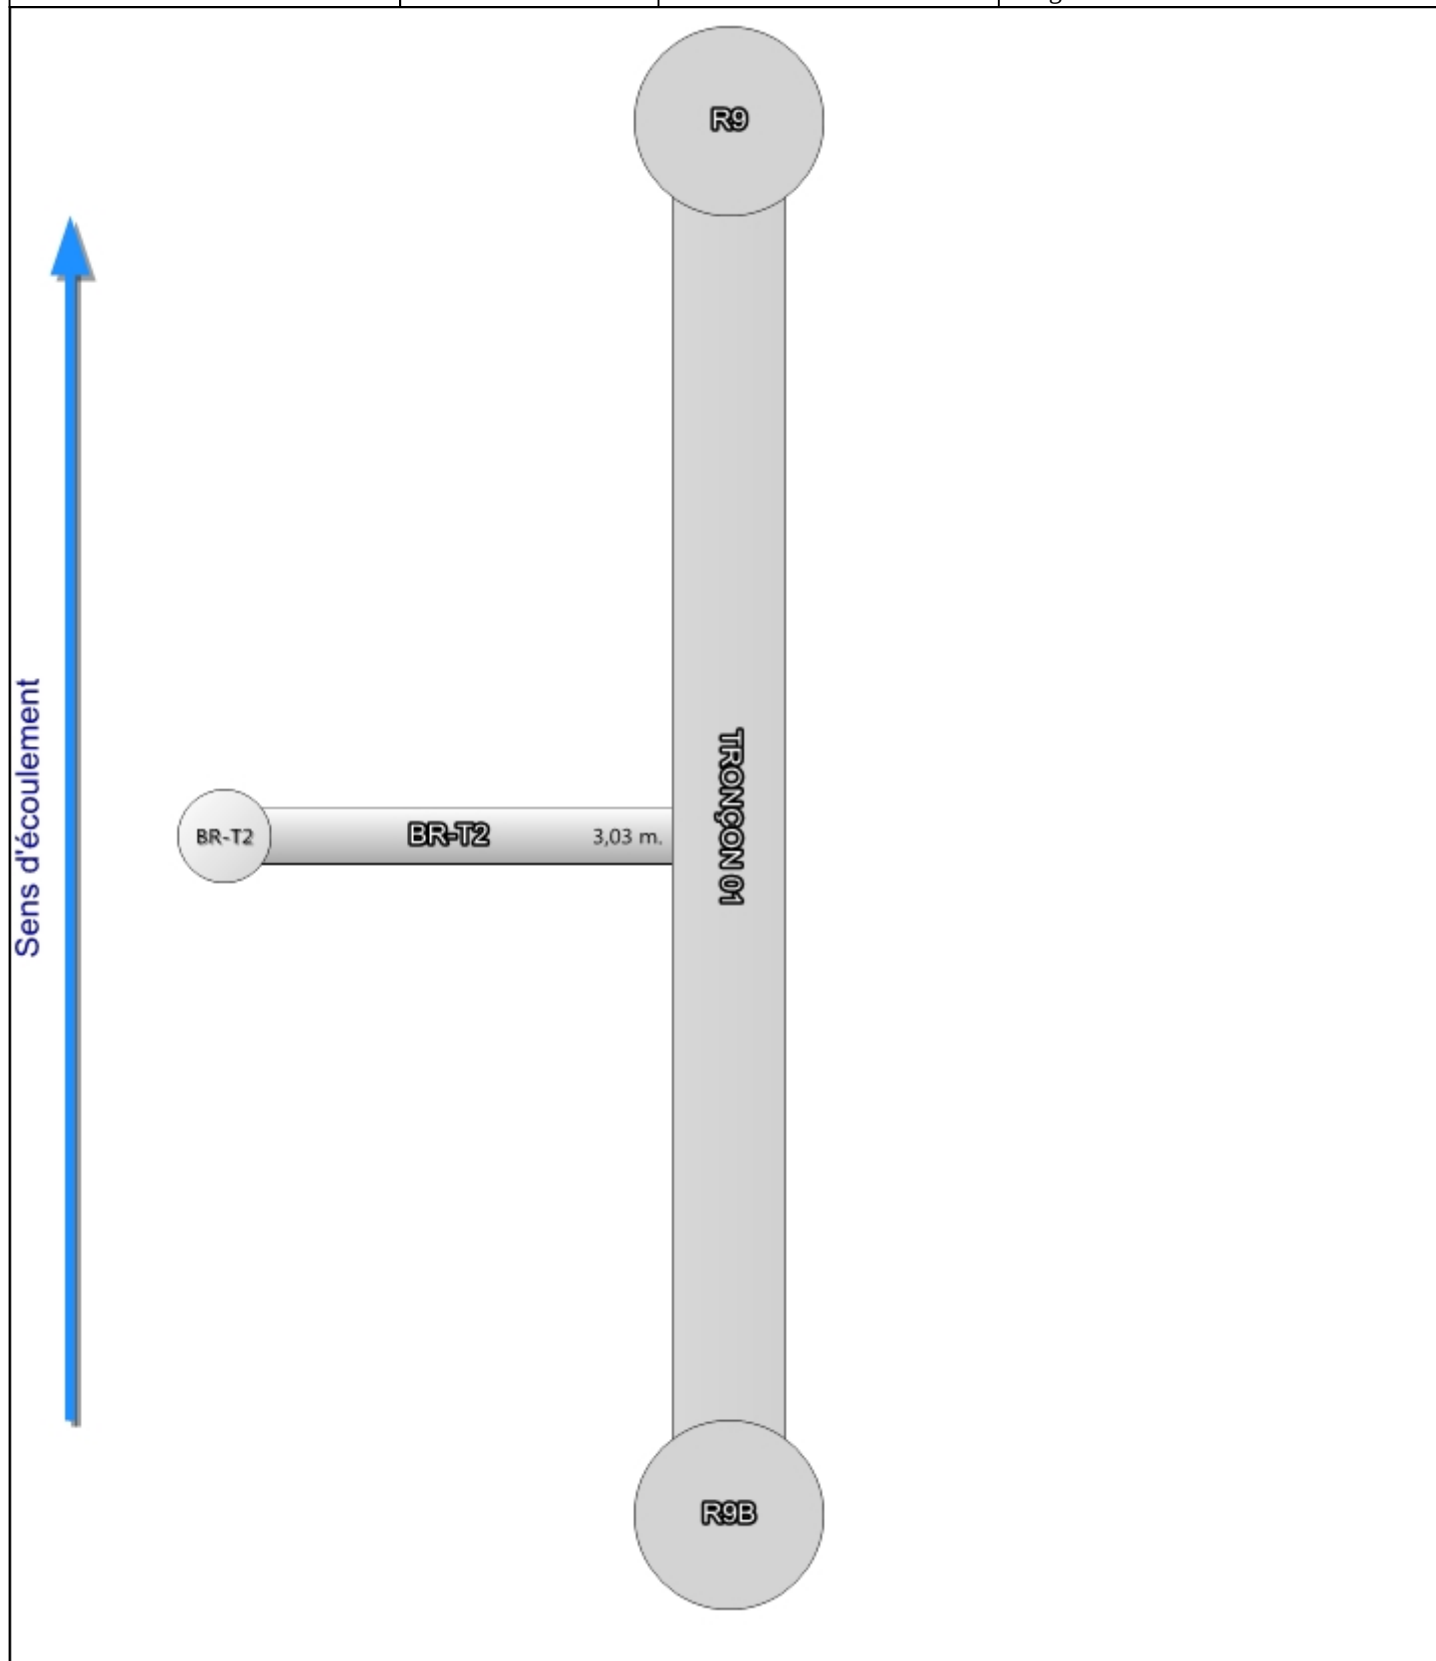


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail Entressen		

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9B Vers R9	Date de l'inspection: 2020-12-02	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9 (1,4m) Vers R9B (1,5m)	Longueur inspectée:	5,88 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée:	5,88 m

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 0,9°

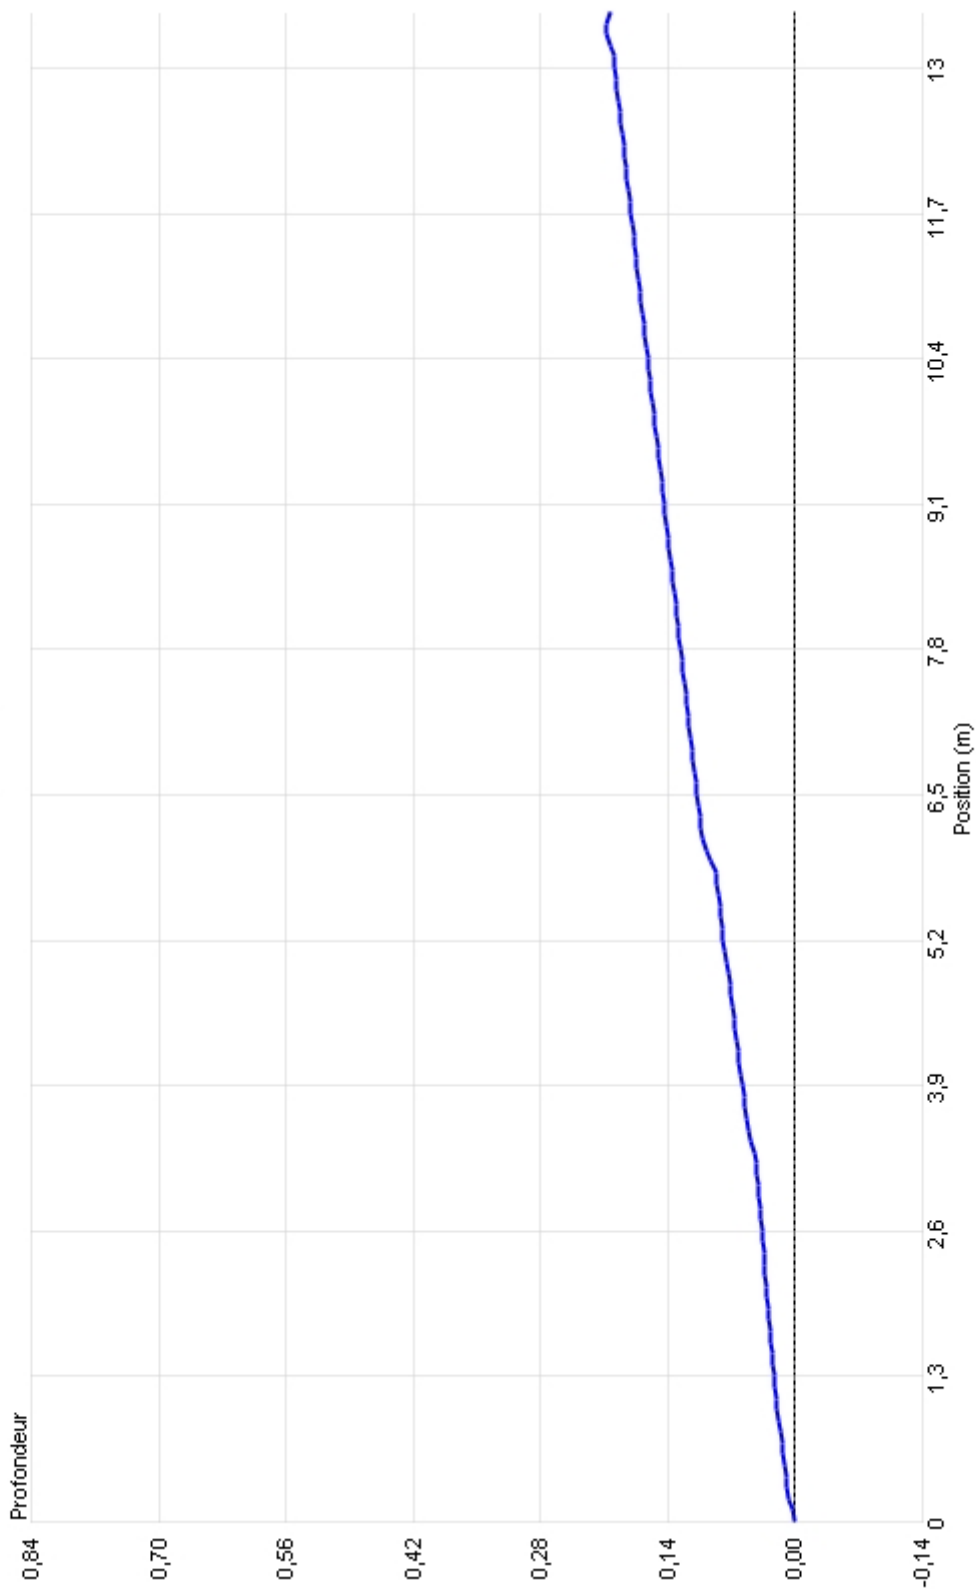

Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

BR-T2		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T2	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 01	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T2 Vers TRONÇON 01	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	1,6 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	1,6 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202121956.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T2	Référence	TRONÇON 01
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Entressen	

BR-T2		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T2 Vers TRONÇON 01	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T2 Vers TRONÇON 01	Longueur inspectée: 1,6 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 1,6 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BR-T2

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8323.jpg
	1,60		<u>00:00:15</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Category	Value
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1

Client	-	:	MAMP
--------	---	---	------

Chantier : Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport

MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I

BR-T2		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T2 Vers TRONÇON 01	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T2 Vers TRONÇON 01	Longueur inspectée: 1,6 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 1,6 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

TRONÇON 02		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R9B	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	R8	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R8 Vers R9B	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	20,94 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	20,94 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	


Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	3361.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R9B	Référence	R8
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,45 m	Profondeur:	1,42 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

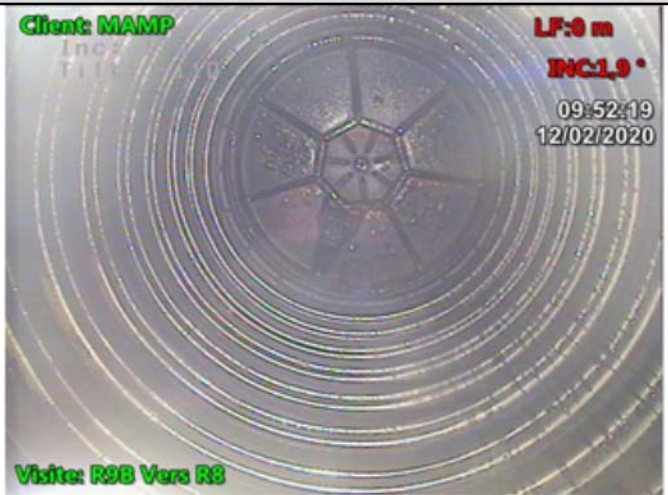TRONÇON 02			Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R8 Vers R9B	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 20,94 m
Matériau: PVC				R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	Longueur mesurée: 20,94 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9910.jpg	
	0,00				
(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE Départ de l'inspection					

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9911.jpg	
	0,30				
(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R9B Liaison regard - canalisation					

Client	: MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier	:	
	Rue Père D'Ail Entressen	


TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R8 Vers R9B	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 20,94 m
Matériau:	PVC		R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	Longueur mesurée: 20,94 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	9912.jpg
7,14		00:01:14	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T3
Position: 03H



9913.jpg

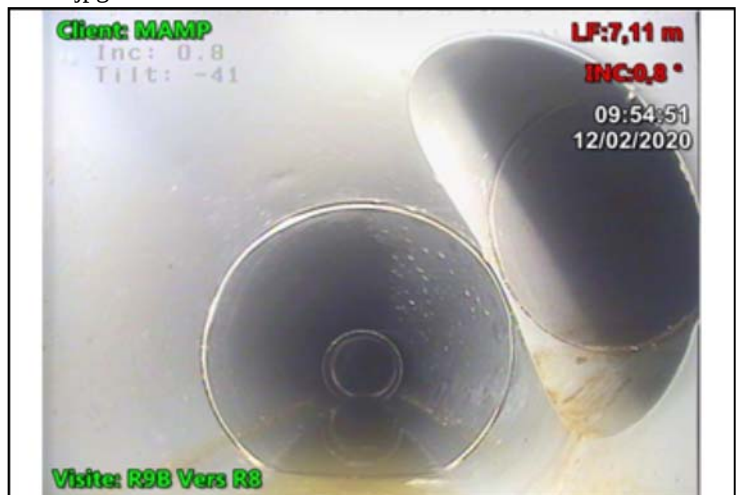


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Père D'Ail Entressen		

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R8 Vers R9B	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	Longueur inspectée: 20,94 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 20,94 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	9914.jpg
8,53		00:02:09	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T4
Position: 09H

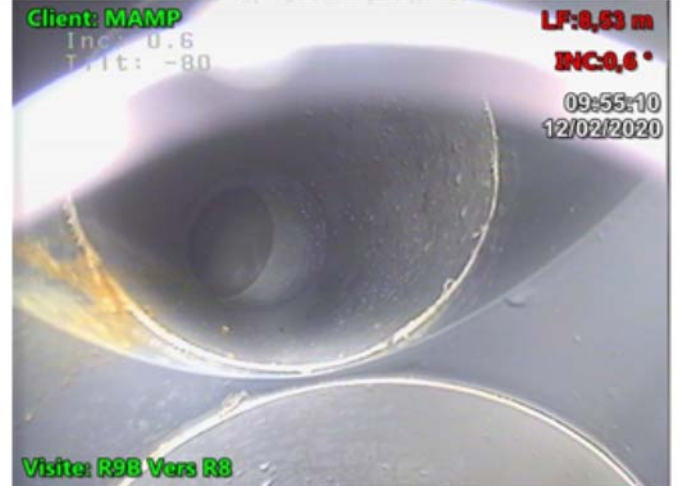

9915.jpg



Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I


TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R8 Vers R9B	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	Longueur inspectée: 20,94 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 20,94 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	
18,34		00:03:36	9916.jpg

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T5
Position: 03H



9917.jpg

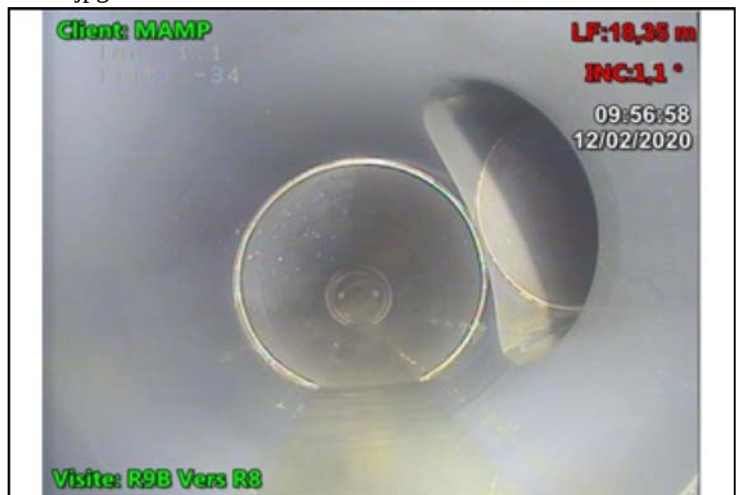


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R8 Vers R9B	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	Longueur inspectée: 20,94 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 20,94 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	
20,01		00:04:23	9918.jpg

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T6
Position: 09H

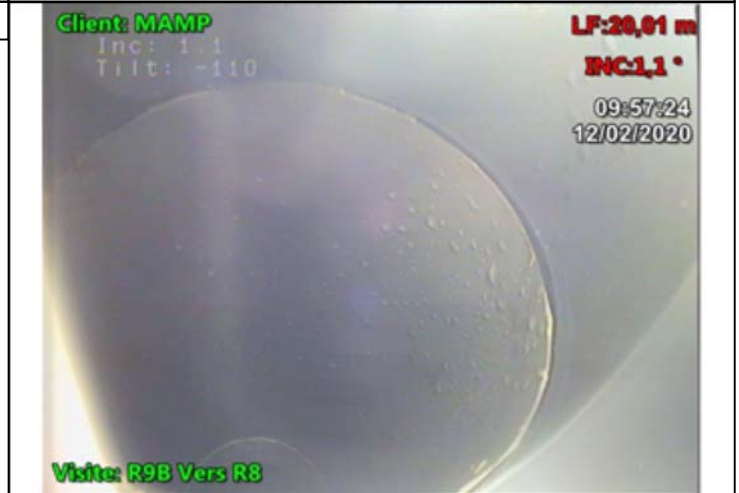

9919.jpg




Distance	Fil d'eau	Vidéo	
20,64		00:05:01	9920.jpg

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE
regard de visite :R8
Liaison canalisation - regard



Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I	
	Rue Pèbre D'Ail		
	Entressen		


TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R8 Vers R9B	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 20,94 m
Matériau: PVC			R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	Longueur mesurée: 20,94 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9921.jpg
	20,94		00:05:28	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Fin de l'inspection




Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 21 / 124

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R8 Vers R9B	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	Longueur inspectée: 20,94 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 20,94 m	

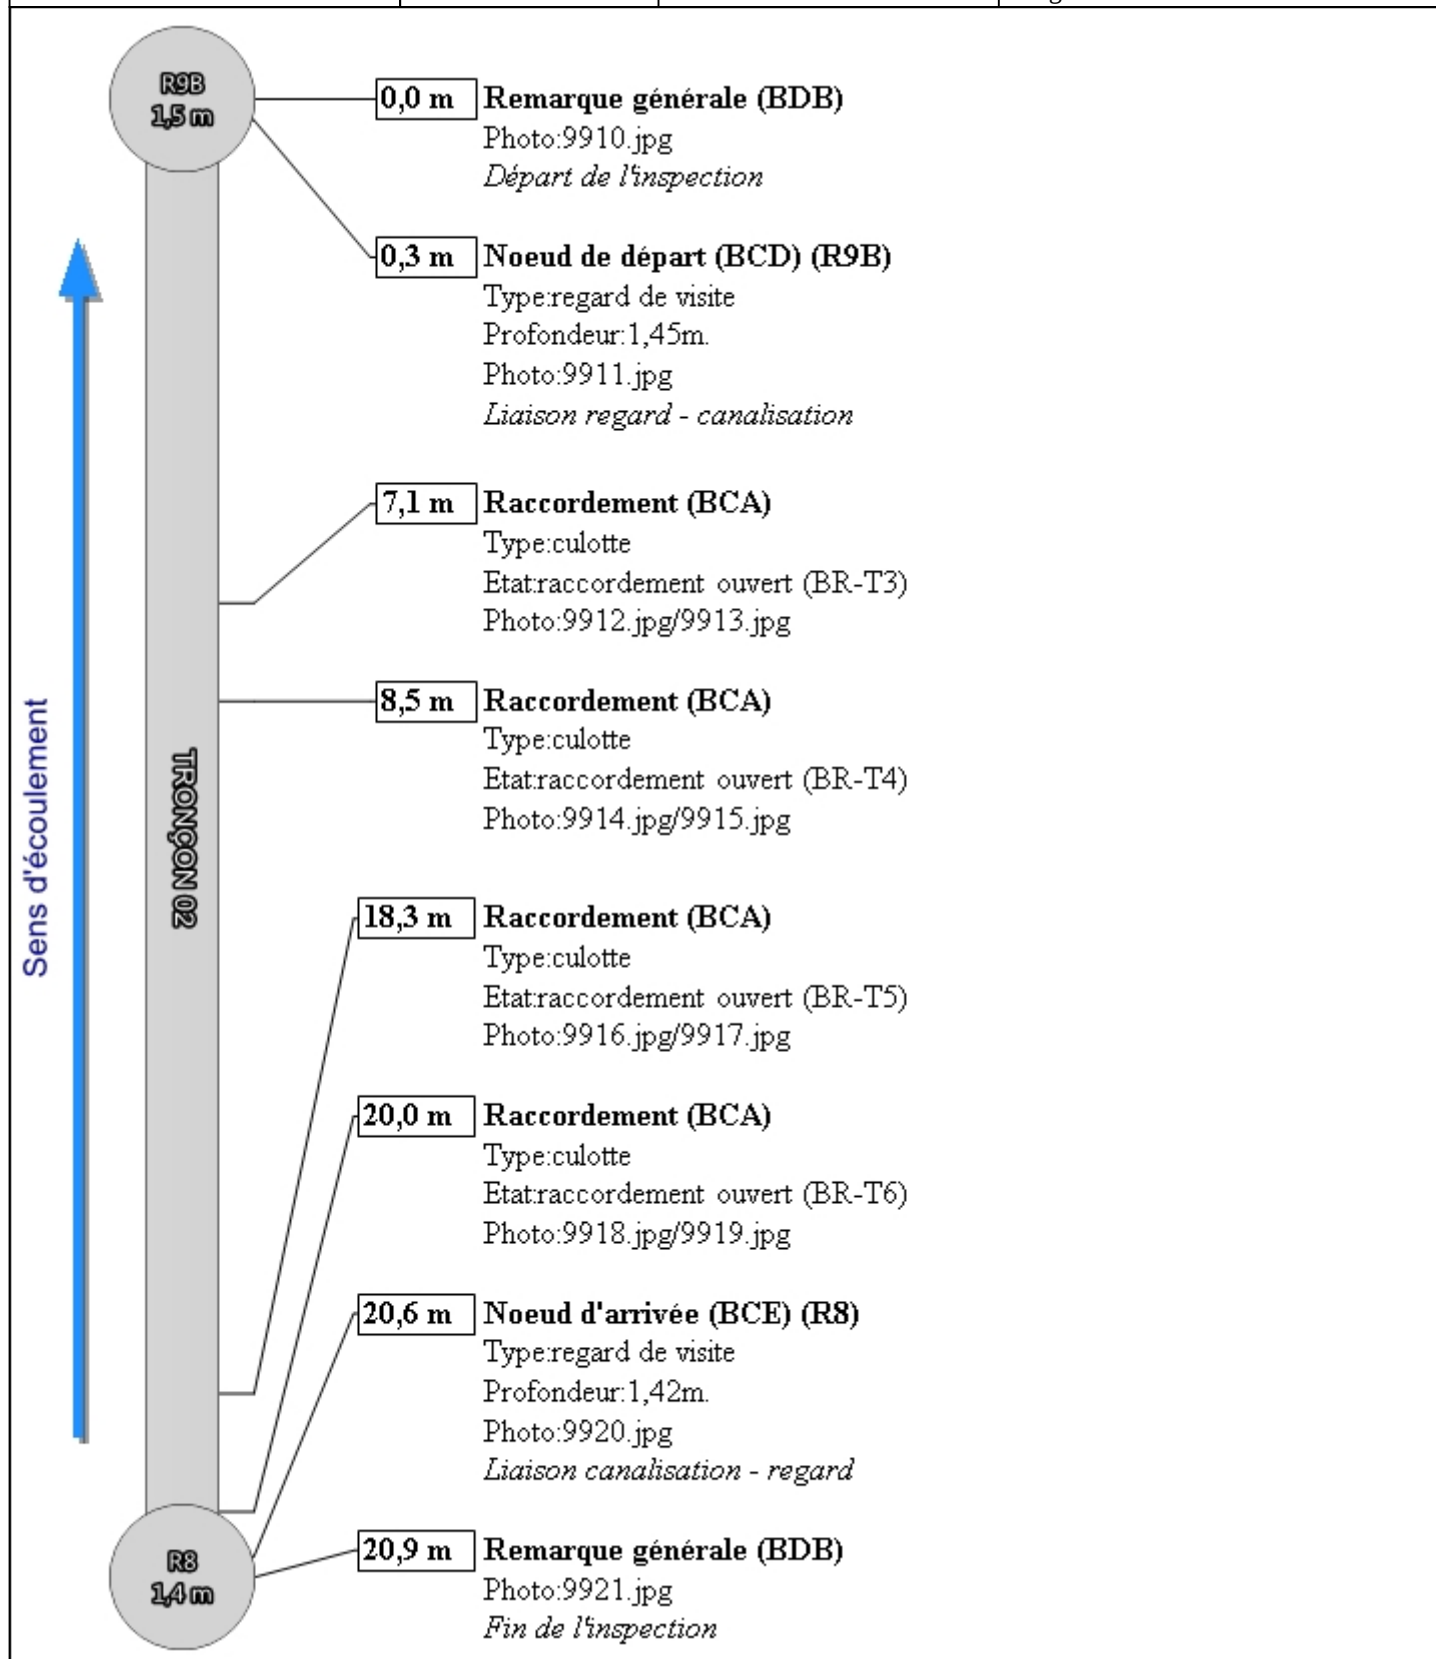

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R8 Vers R9B	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 20,94 m
Matériau:	PVC		R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	Longueur mesurée: 20,94 m

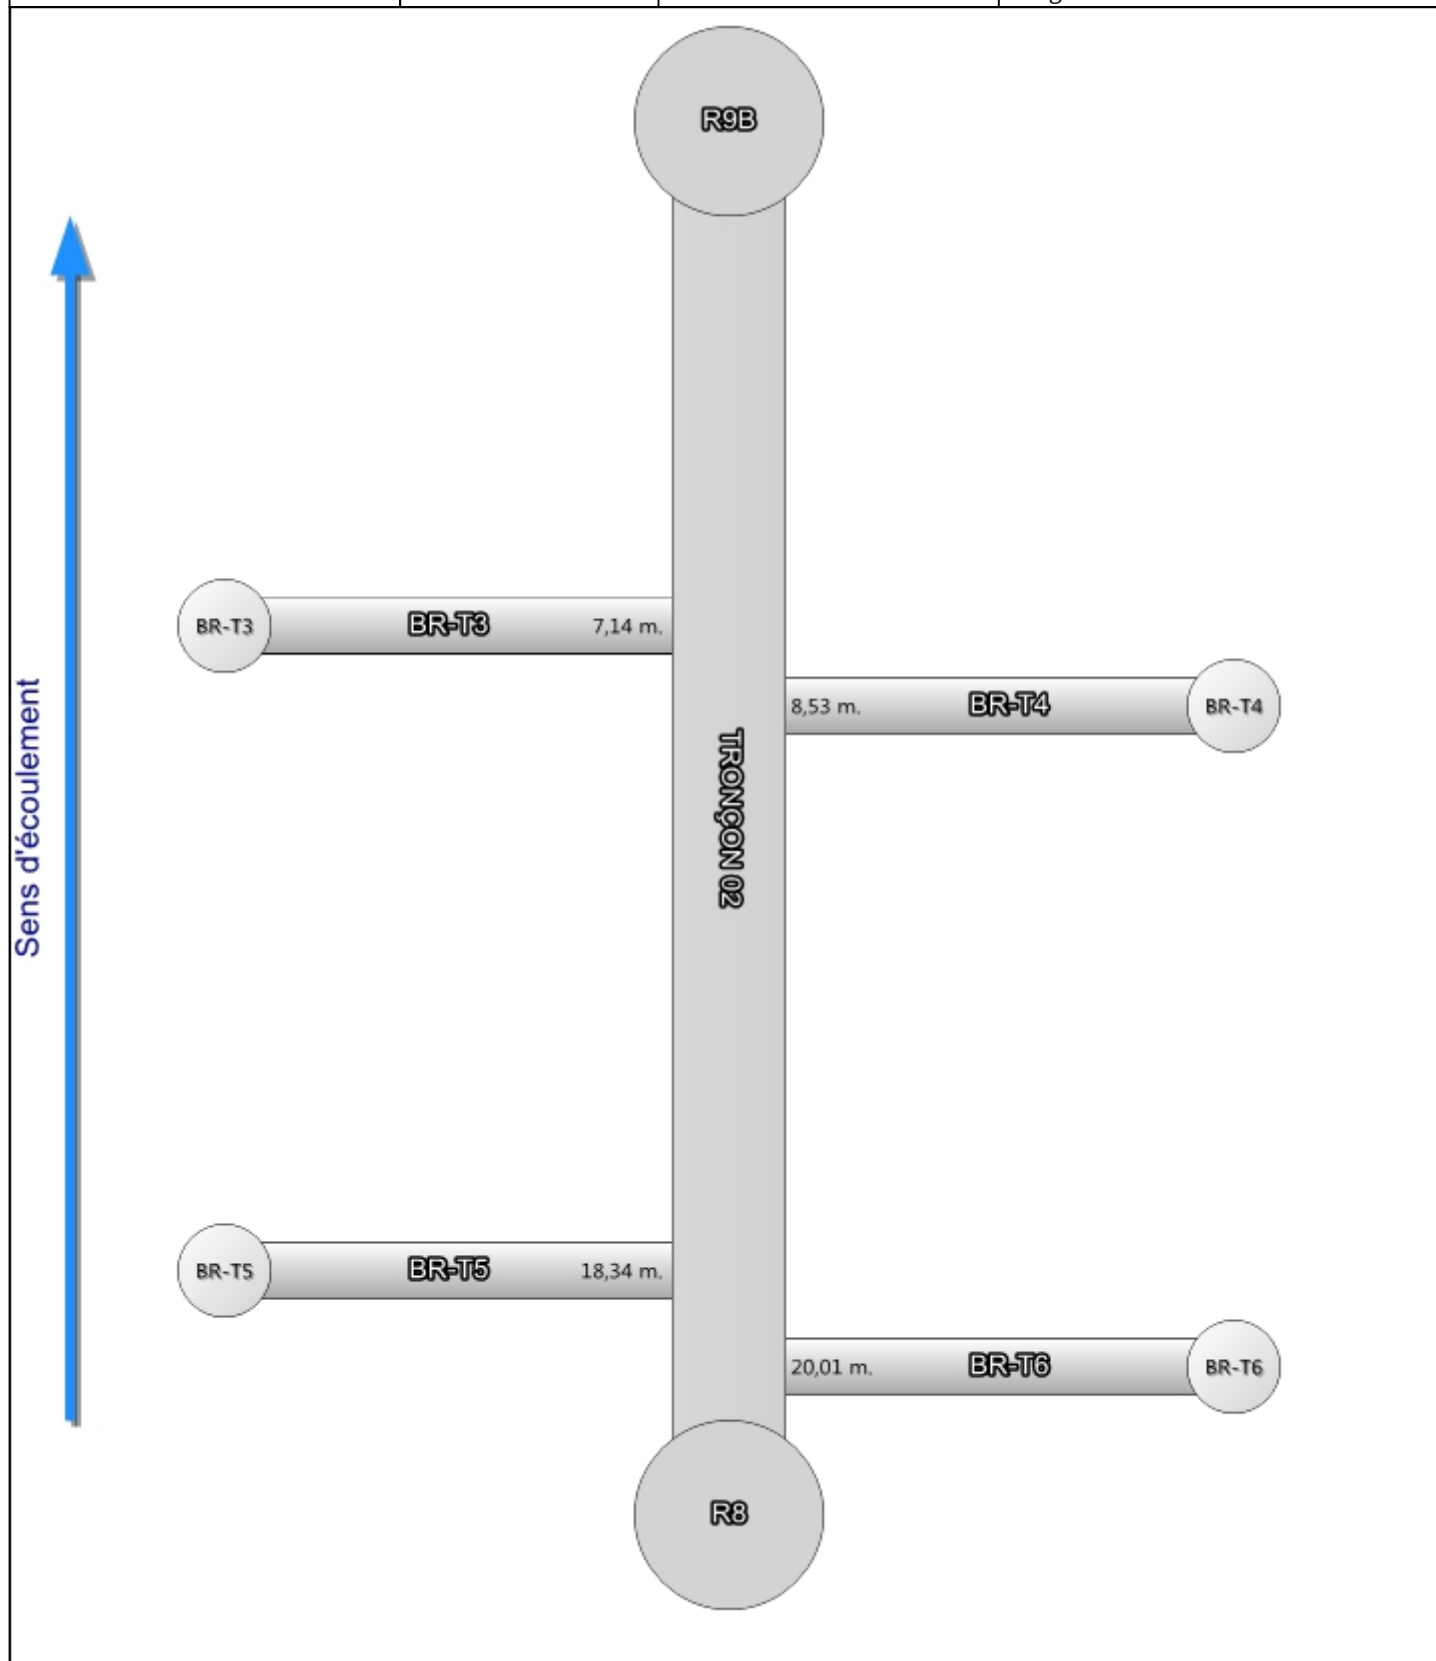


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail Entressen		

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R8 Vers R9B	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	Longueur inspectée: 20,94 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 20,94 m	

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 1,2°

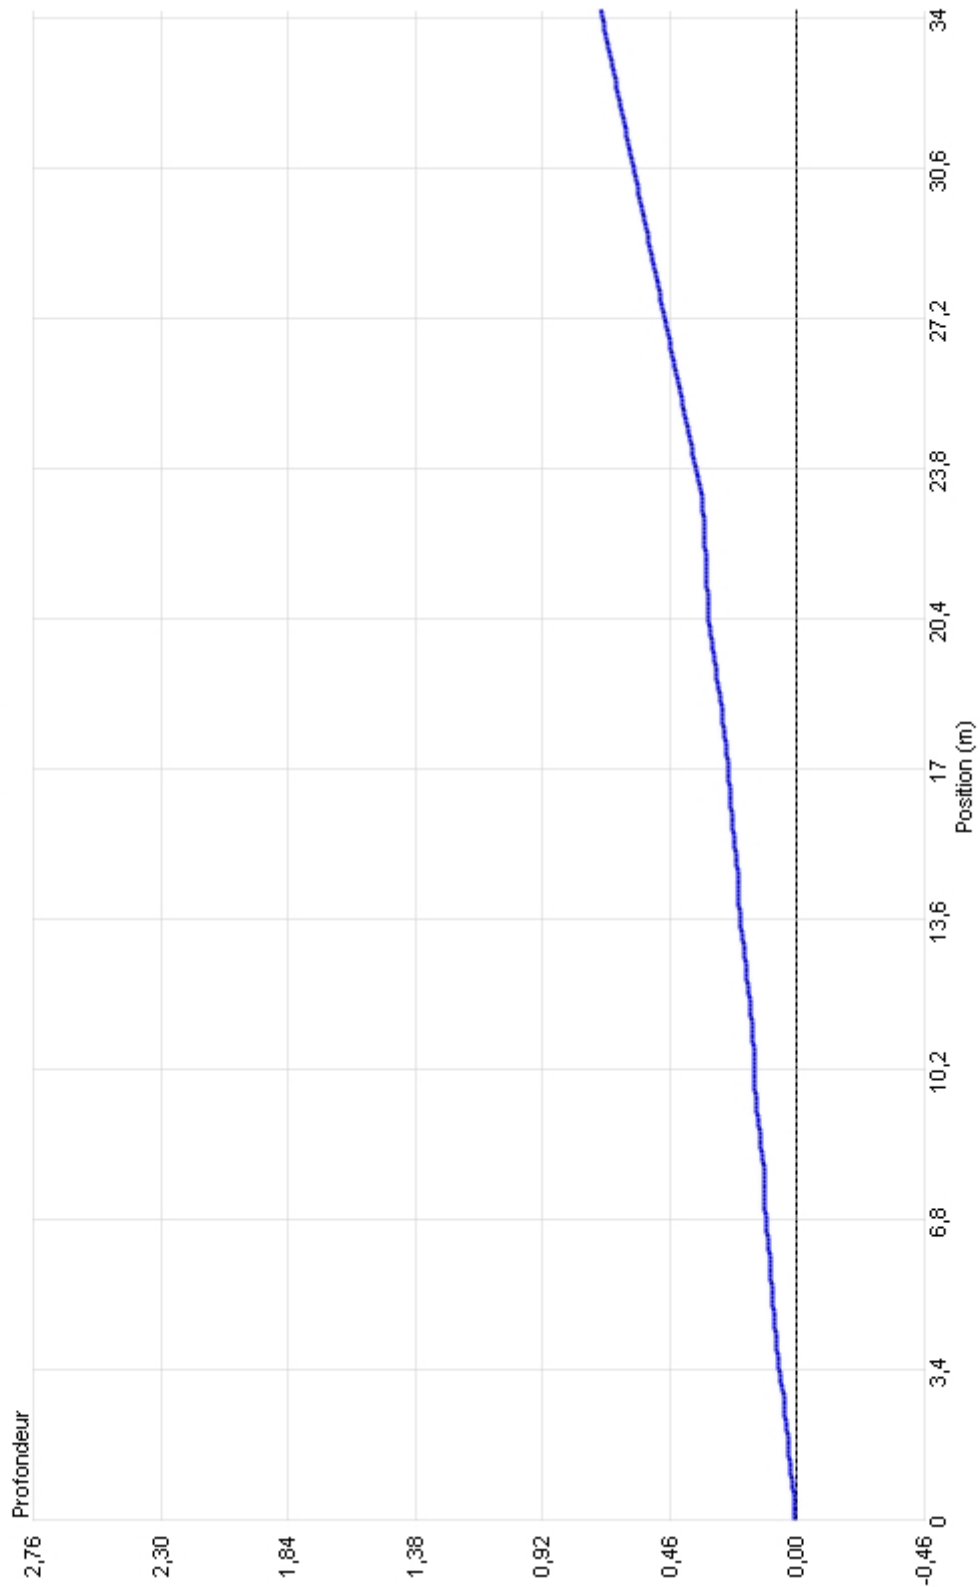

Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

BR-T3		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T3	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T3 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:		Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	8,9 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	8,9 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202122138.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T3	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail		
	Entressen		

BR-T3		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T3 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T3 Vers TRONÇON 02	Longueur inspectée: 8,9 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 8,9 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BR-T3

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8325.jpg
	8,90		<u>00:00:46</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 26 / 124

BR-T3	Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T3 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T3 Vers TRONÇON 02	Longueur inspectée: 8,9 m
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 8,9 m

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

BR-T4		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T4	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T4 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	21,3 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	21,3 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202122425.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T4	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Entressen	

BR-T4		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T4 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 21,3 m
Matériau:	PVC		BR-T4 Vers TRONÇON 02	Longueur mesurée: 21,3 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T4
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8327.jpg
	21,30		<u>00:03:59</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 29 / 124

BR-T4		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T4 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T4 Vers TRONÇON 02	Longueur inspectée: 21,3 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 21,3 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

BR-T5		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T5	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T5 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:		Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,6 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,6 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202123301.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T5	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail		
	Entressen		

BR-T5		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T5 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T5 Vers TRONÇON 02	Longueur inspectée: 2,6 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 2,6 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T5
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8333.jpg
	2,60		<u>00:00:15</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :

[illegible]

BR-T5	Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T5 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: Matériau: PVC	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T5 Vers TRONÇON 02	Longueur inspectée: 2,6 m
			Longueur mesurée: 2,6 m

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

BR-T6		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T6	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T6 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	7,9 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	7,9 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202123110.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T6	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail		
	Entressen		

BR-T6			Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T6 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T6 Vers TRONÇON 02	Longueur inspectée: 7,9 m
Matériau:					Longueur mesurée: 7,9 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo		
	0,00				

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T6
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8331.jpg
	7,90		<u>00:00:42</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 35 / 124

BR-T6	Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T6 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T6 Vers TRONÇON 02	Longueur inspectée: 7,9 m
Matériau:			Longueur mesurée: 7,9 m

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 03		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R8	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	R7	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R7 Vers R8	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	41,74 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	41,74 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	


Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	3362.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R8	Référence	R7
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,42 m	Profondeur:	1,3 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières


Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

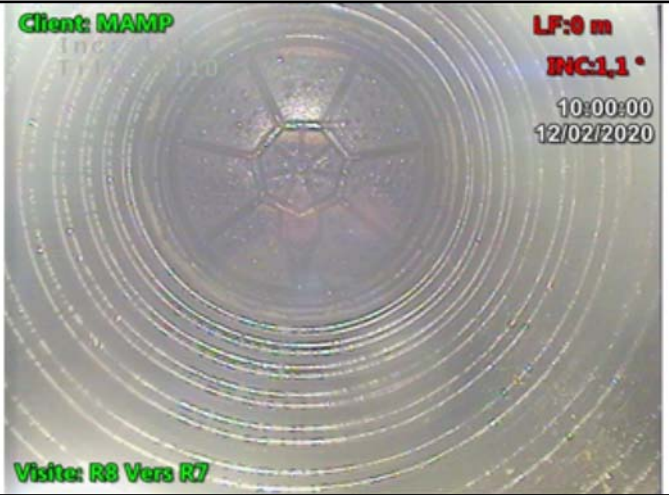TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 41,74 m
Matériau:	PVC		R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur mesurée: 41,74 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9923.jpg	
0,00				
(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE Départ de l'inspection				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9924.jpg	
0,30				
(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R8 Liaison regard - canalisation				

Client	: MAMP	Rapport	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen		

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 41,74 m
Matériau:	PVC		R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur mesurée: 41,74 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9925.jpg	
3,39		00:00:29		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T7
Position: 03H

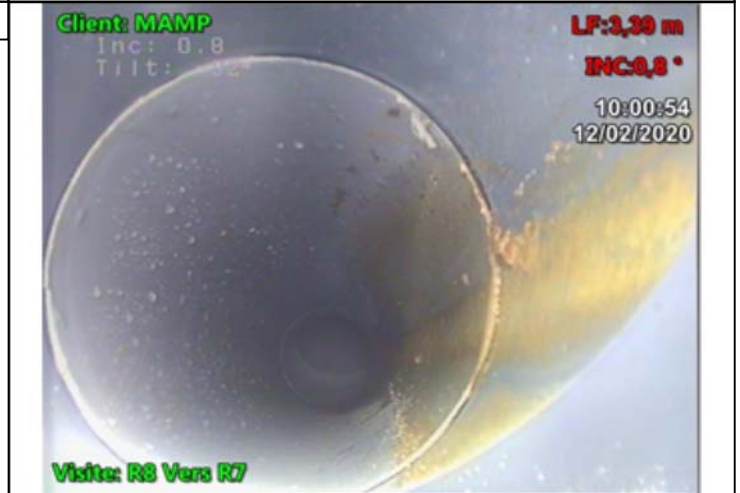


9926.jpg




Client	: MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier	: Rue Pèbre D'Ail Entressen		

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 41,74 m
Matériau:	PVC		R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur mesurée: 41,74 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9927.jpg	
9,68		00:01:34		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T8
Position: 09H

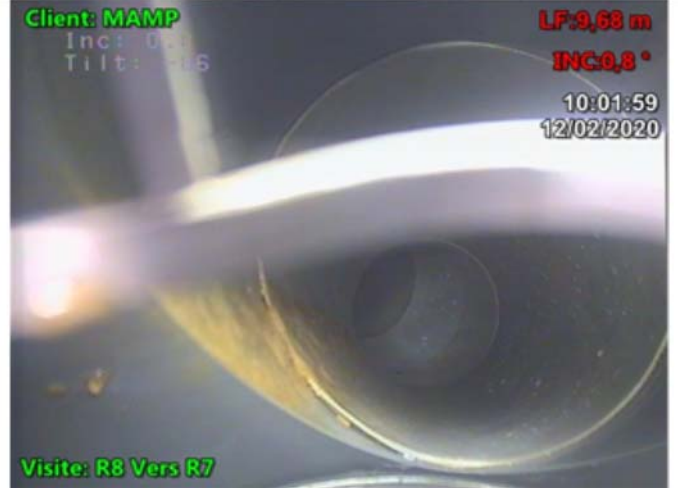

9928.jpg

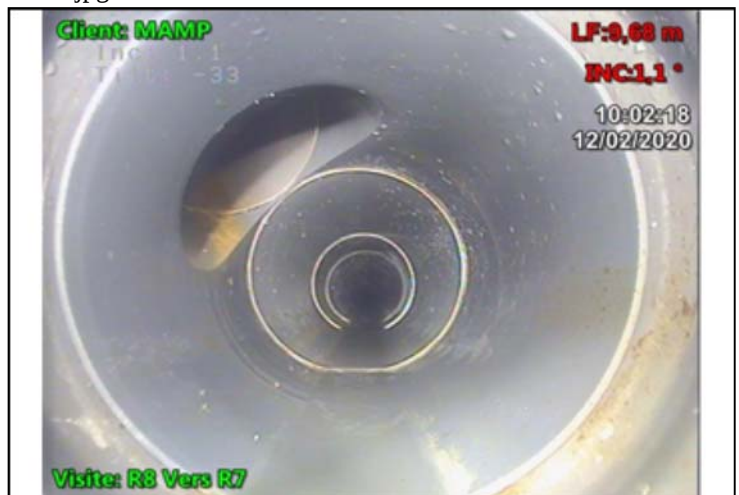


Client	: MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier	: Rue Pèbre D'Ail Entressen		

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur inspectée: 41,74 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 41,74 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9929.jpg	
10,61		00:02:06		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T9
Position: 03H




9930.jpg

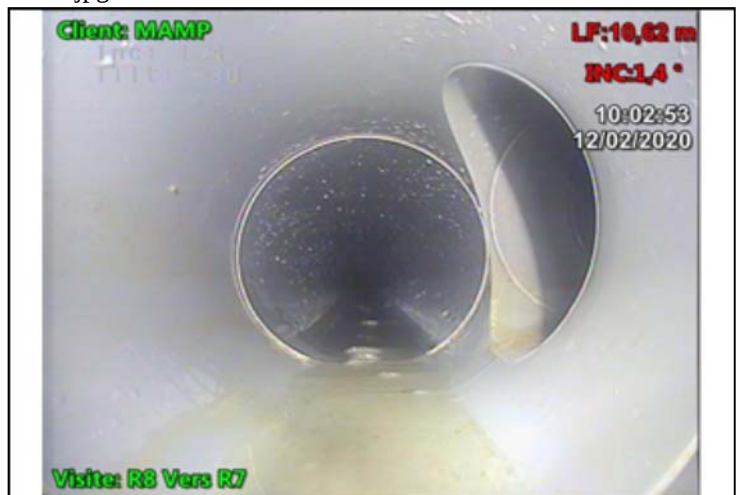


Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 41,74 m
Matériau:	PVC		R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur mesurée: 41,74 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9931.jpg	
15,32		00:03:03		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T10
Position: 03H

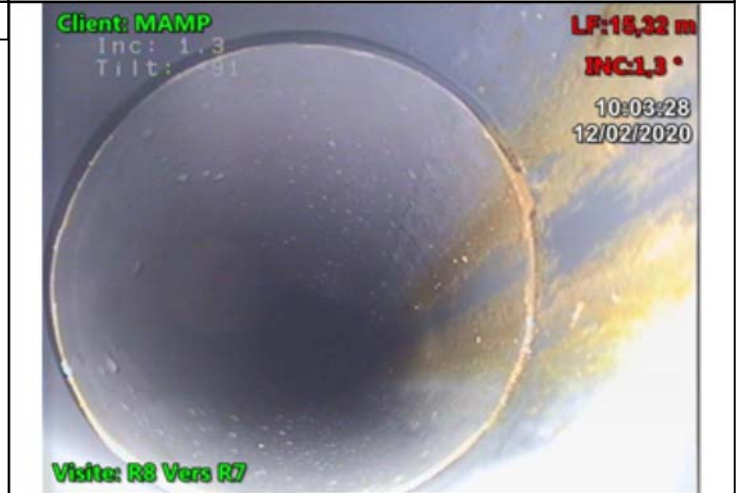


9932.jpg

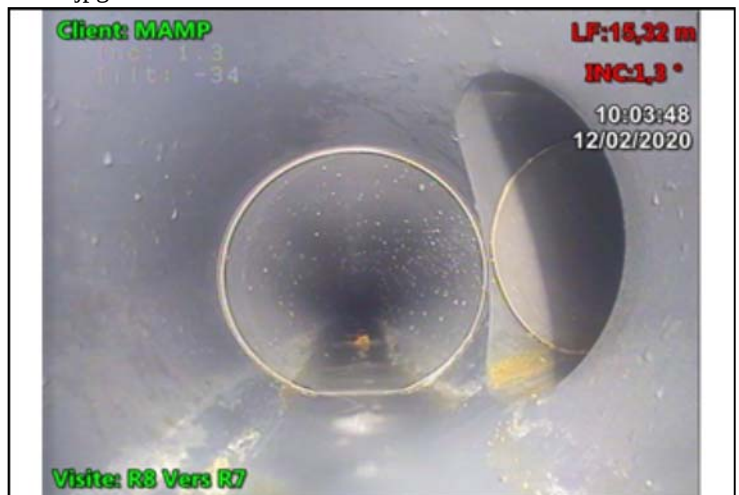


Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 41,74 m
Matériau:	PVC		R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur mesurée: 41,74 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9933.jpg	
24,72		00:04:15		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T11
Position: 09H

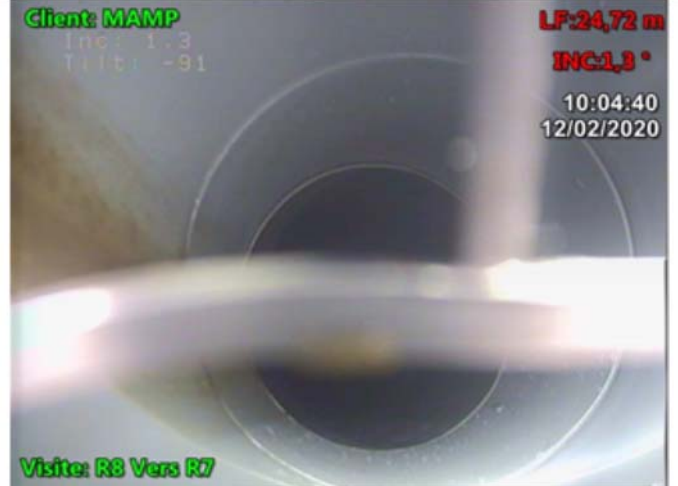

9934.jpg

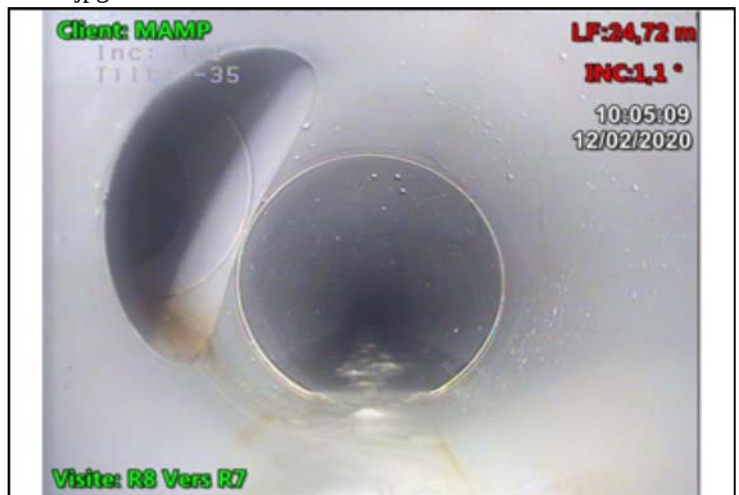

Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur inspectée: 41,74 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 41,74 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	
33,05		00:05:33	9935.jpg

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T12
Position: 03H



9936.jpg



Distance	Fil d'eau	Vidéo	
41,44		00:06:53	9937.jpg


(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE
regard de visite :R7
Liaison canalisation - regard



Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I


TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 41,74 m
Matériau: PVC			R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur mesurée: 41,74 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9938.jpg
	41,74		00:07:33	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Fin de l'inspection

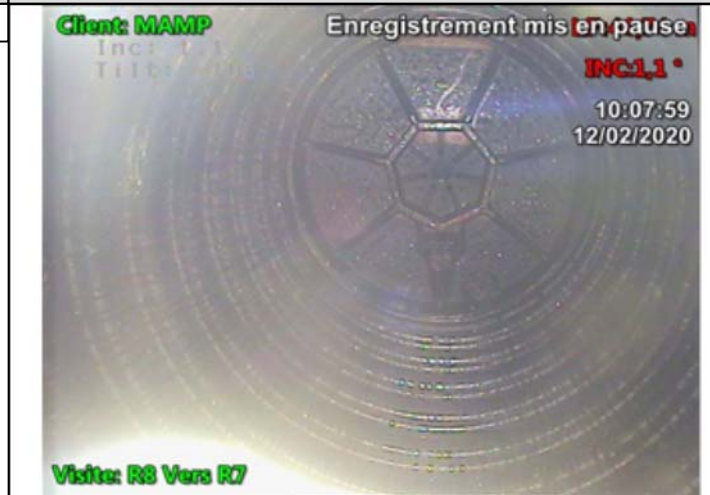

Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 45 / 124

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur inspectée: 41,74 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 41,74 m	

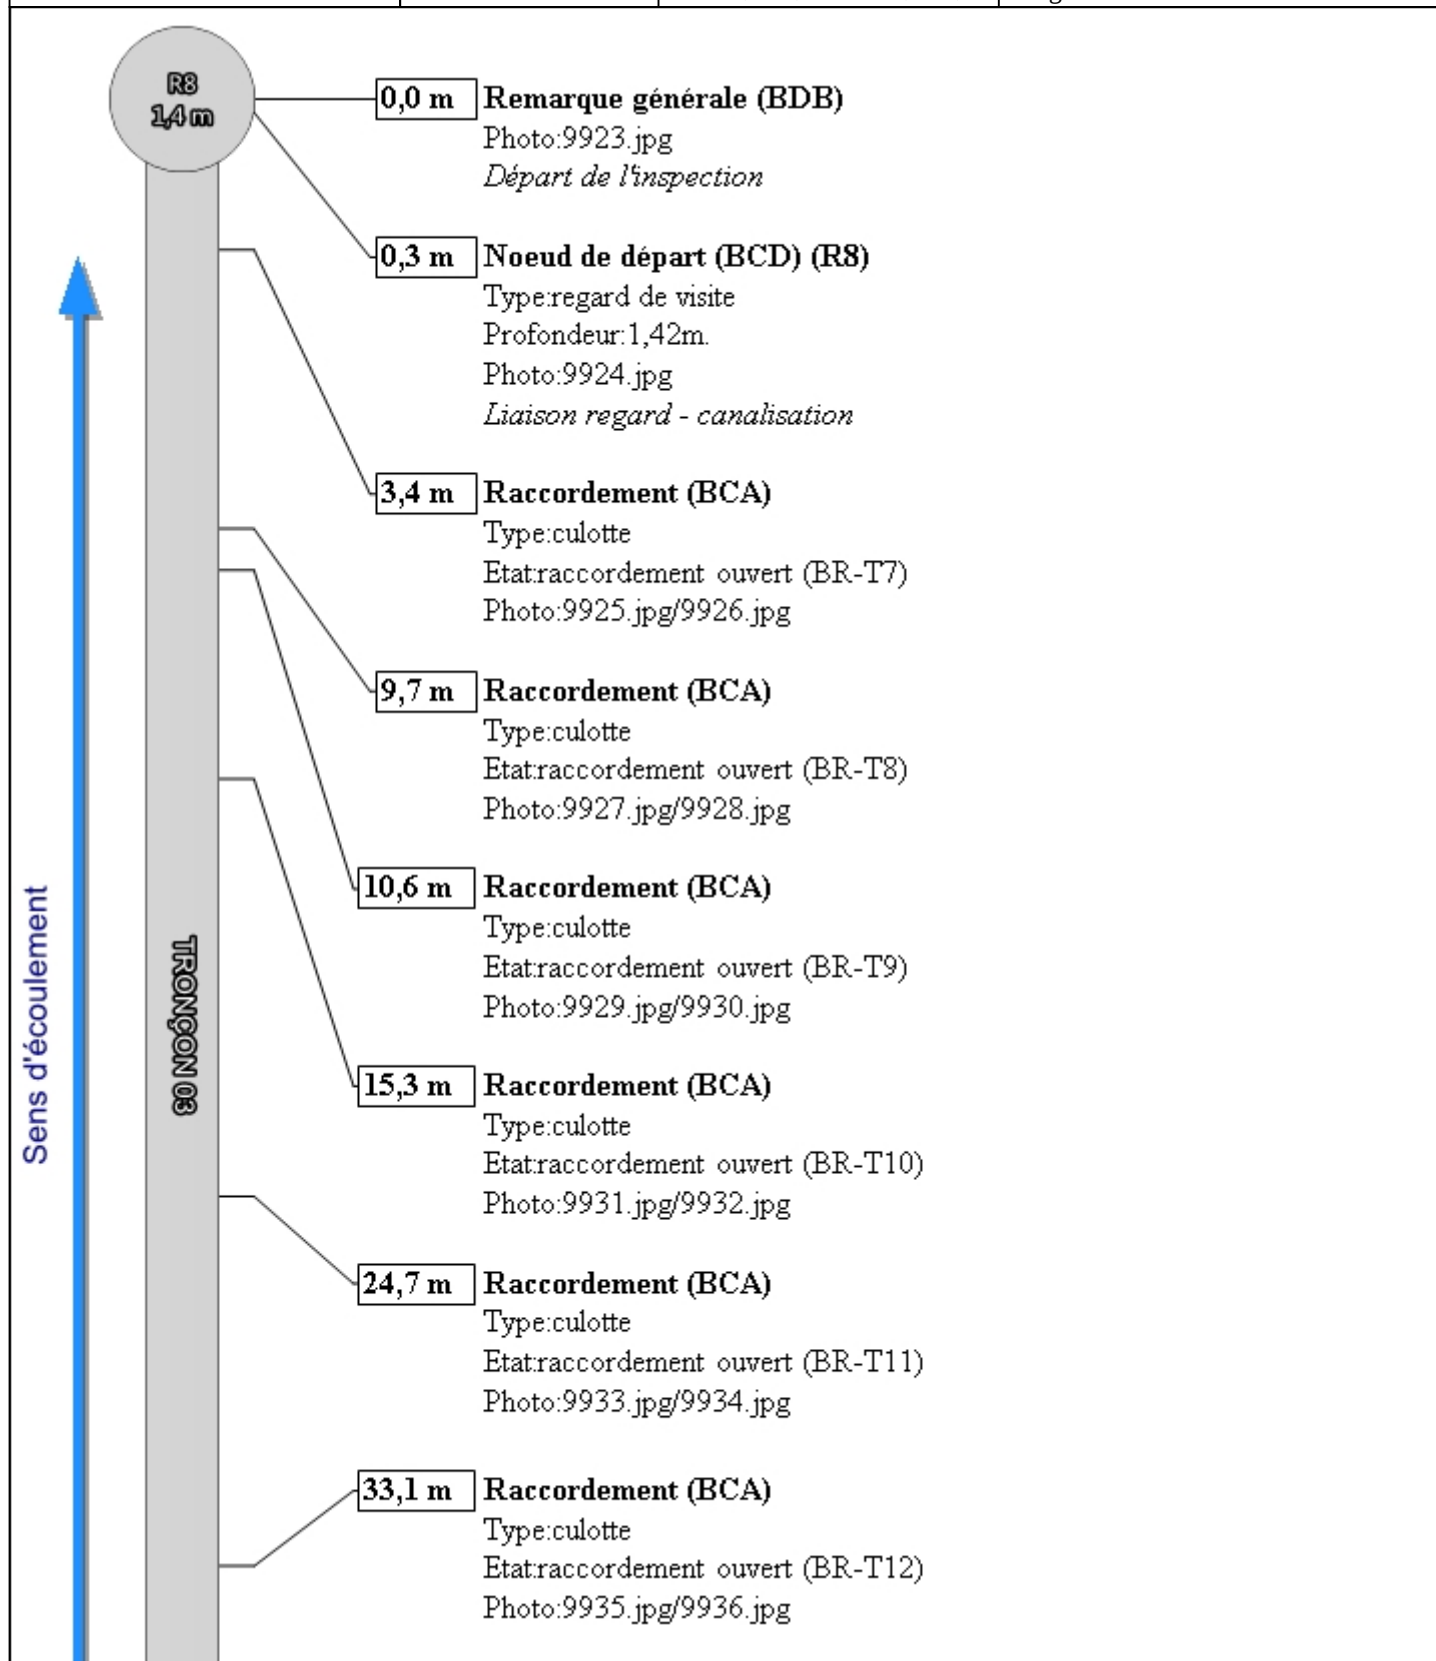


Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 41,74 m	
Matériau: PVC		R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur mesurée: 41,74 m	
41,4 m Noeud d'arrivée (BCE) (R7) Type:regard de visite Profondeur:1,30m. Photo:9937.jpg <i>Liaison canalisation - regard</i> 41,7 m Remarque générale (BDB) Photo:9938.jpg <i>Fin de l'inspection</i>				
Client : MAMP			Rapport	
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen			MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I	

Page 47 / 124

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 41,74 m
Matériau:	PVC		R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur mesurée: 41,74 m

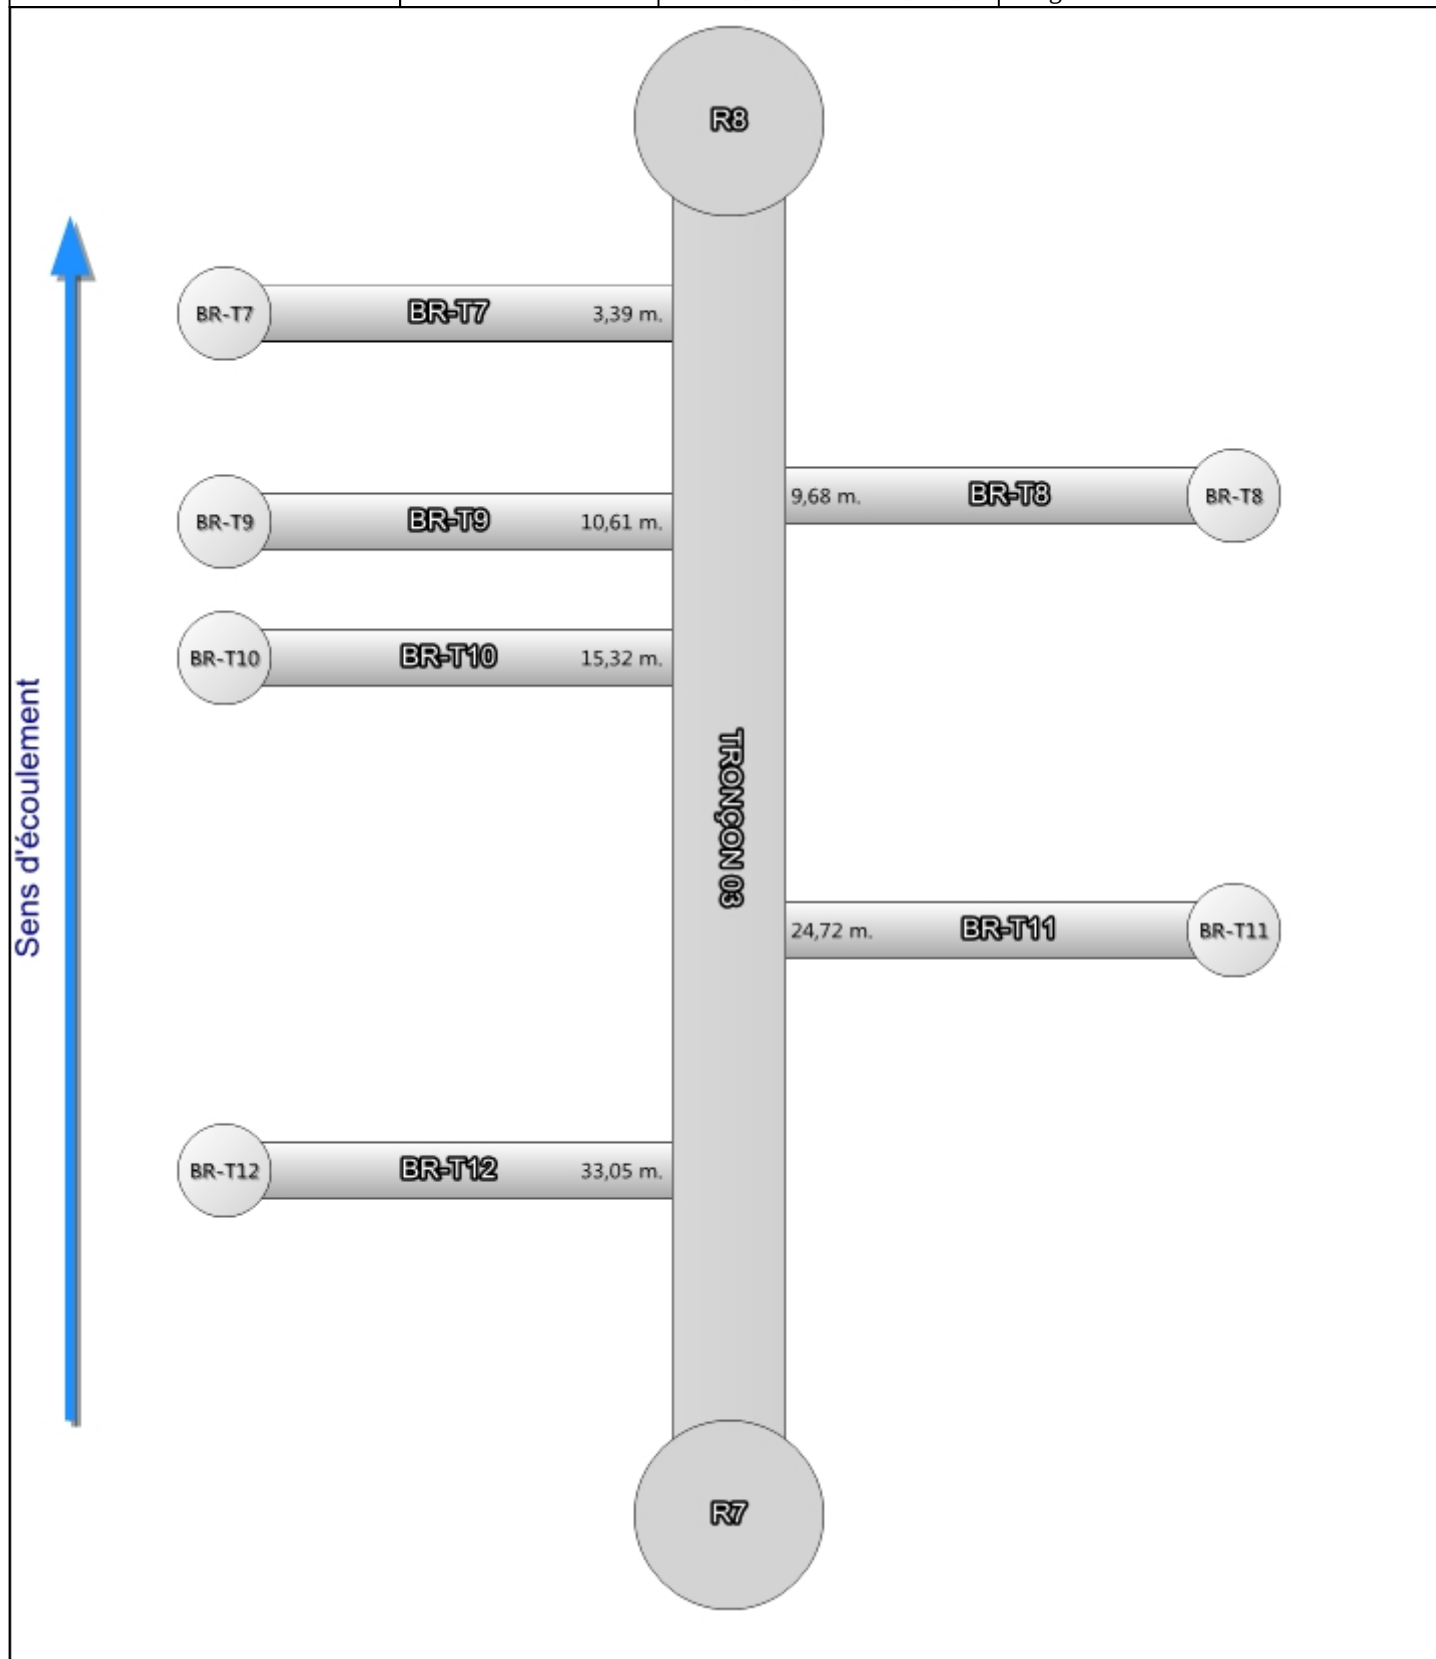


Client :	MAMP	Rapport :	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail Entressen		

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R7 Vers R8	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	Longueur inspectée: 41,74 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 41,74 m	

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 1,1°

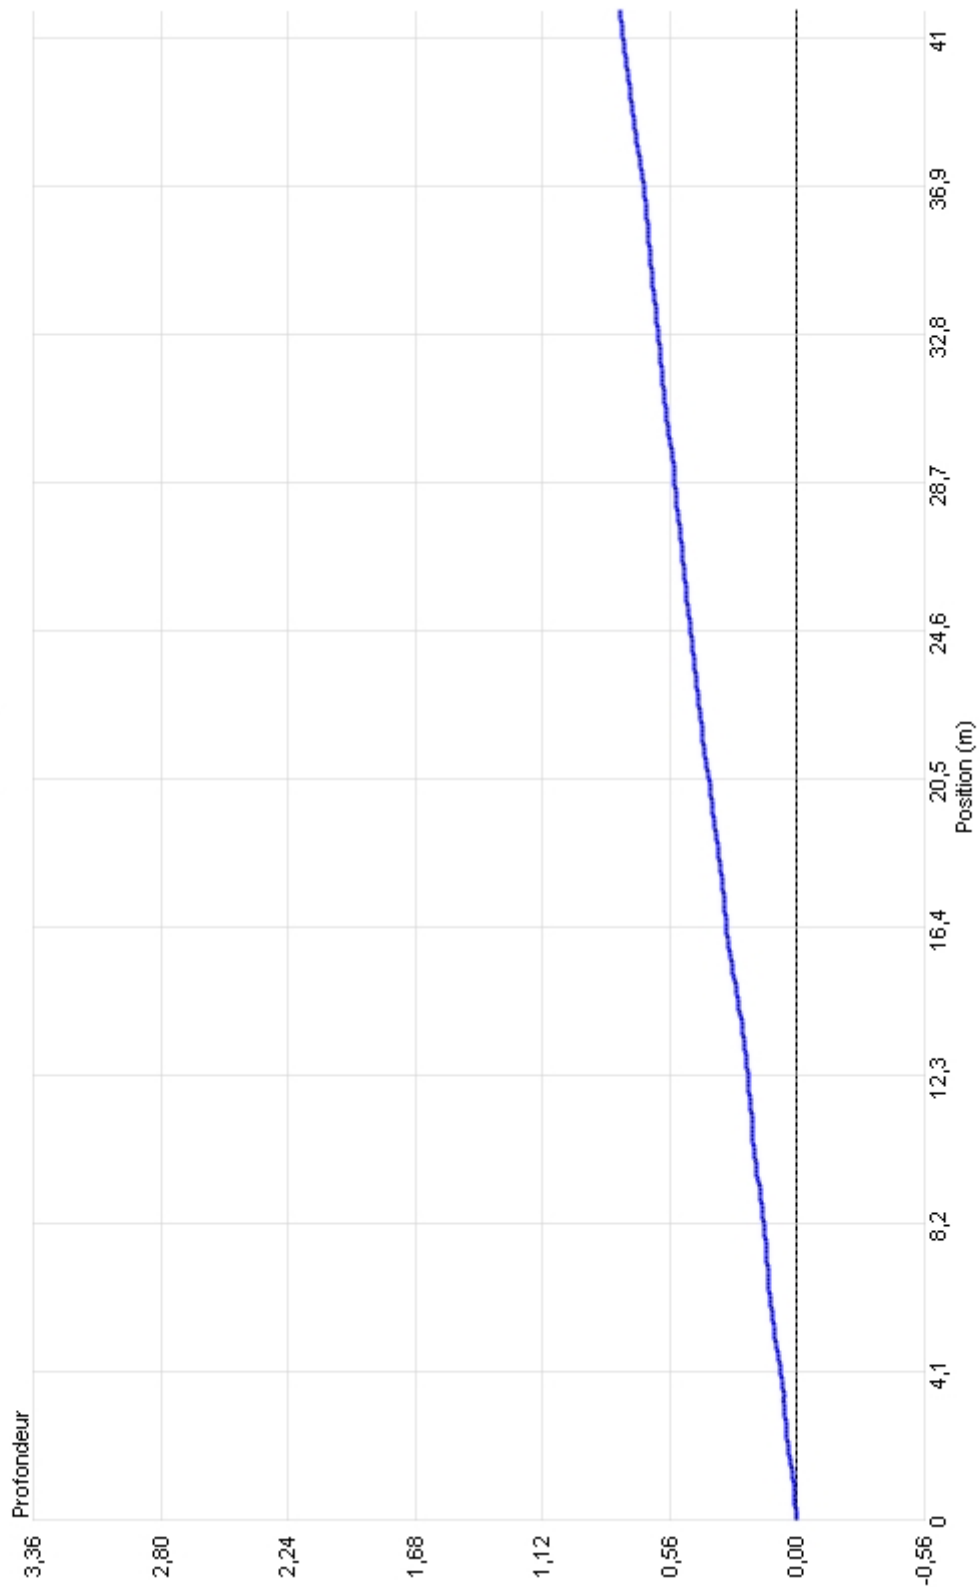

Client : MAMP
Chantier :
Rue Père D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I

BR-T7		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T7	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 03	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T7 Vers TRONÇON 03	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,7 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,7 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202123451.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T7	Référence	TRONÇON 03
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

BR-T7		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T7 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T7 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 2,7 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 2,7 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BR-T7

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8335.jpg
	2,70		<u>00:00:20</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	-	:	MAMP
--------	---	---	------

Chantier :

Rue Pèbre D'Ail

Entressen

Rapport

MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I

BR-T7		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T7 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T7 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 2,7 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 2,7 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

BR-T8		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T8	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 03	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T8 Vers TRONÇON 03	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	5,1 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	5,1 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202123610.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T8	Référence	TRONÇON 03
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

BR-T8		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T8 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T8 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 5,1 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 5,1 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BR-T8

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8337.jpg
	5,10		<u>00:00:57</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 54 / 124

BR-T8		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T8 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T8 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 5,1 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 5,1 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

BR-T9		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T9	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 03	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T9 Vers TRONÇON 03	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,3 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,3 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202123756.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T9	Référence	TRONÇON 03
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

BR-T9		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T9 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 2,3 m
Matériau:	PVC		BR-T9 Vers TRONÇON 03	Longueur mesurée: 2,3 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BR-T9

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8339.jpg
	2,30		<u>00:00:21</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Client	-	:	MAMP
--------	---	---	------

Chantier :

Rue Pèbre D'Ail

Entressen

Rapport

MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I

BR-T9		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T9 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T9 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 2,3 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 2,3 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

BR-T10		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T10	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 03	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T10 Vers TRONÇON 03	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	5,8 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	5,8 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202123948.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T10	Référence	TRONÇON 03
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Entressen	

BR-T10		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T10 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T10 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 5,8 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 5,8 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T10
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8341.jpg
	5,80		<u>00:00:39</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 60 / 124

BR-T10		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T10 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:		Sens de visite: BR-T10 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 5,8 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 5,8 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

BR-T11		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T11	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 03	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T11 Vers TRONÇON 03	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,7 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,7 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202123946 -.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T11	Référence	TRONÇON 03
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

BR-T11		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T11 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T11 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 2,7 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 2,7 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T11
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8383.jpg
	2,70		<u>00:00:20</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 63 / 124

BR-T11		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T11 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T11 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 2,7 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 2,7 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

BR-T12		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T12	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 03	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T12 Vers TRONÇON 03	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	11,3 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	11,3 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202124139.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T12	Référence	TRONÇON 03
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

BR-T12		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T12 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T12 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 11,3 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 11,3 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T12
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8381.jpg
	11,30		<u>00:00:41</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 66 / 124

BR-T12		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T12 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:		Sens de visite: BR-T12 Vers TRONÇON 03	Longueur inspectée: 11,3 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 11,3 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

TRONÇON 04		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R7	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	R6	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R6 Vers R7	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	36,28 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	36,28 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	


Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	3363.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R7	Référence	R6
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,3 m	Profondeur:	1,23 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Rue Pèbre D'Ail		
	Entressen		

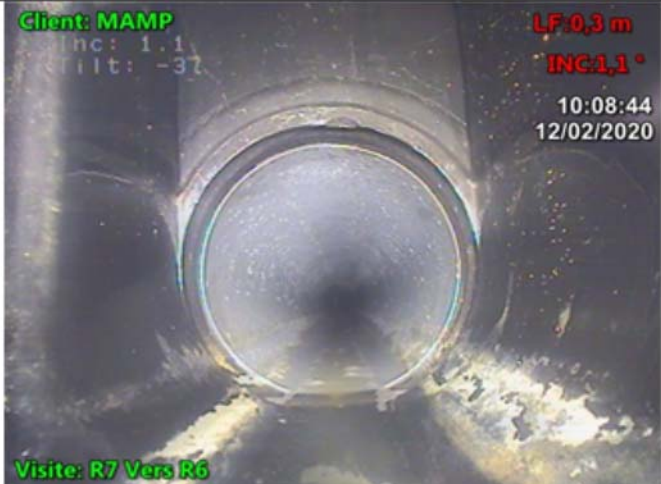TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 36,28 m
Matériau: PVC			R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur mesurée: 36,28 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9939.jpg
	0,00			
(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE Départ de l'inspection				
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9940.jpg
	0,30			
(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R7 Liaison regard - canalisation				


Client	: MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier	: Rue Pèbre D'Ail Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 36,28 m
Matériau:	PVC		R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur mesurée: 36,28 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9941.jpg	
7,97		00:01:02		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T13
Position: 03H



9942.jpg

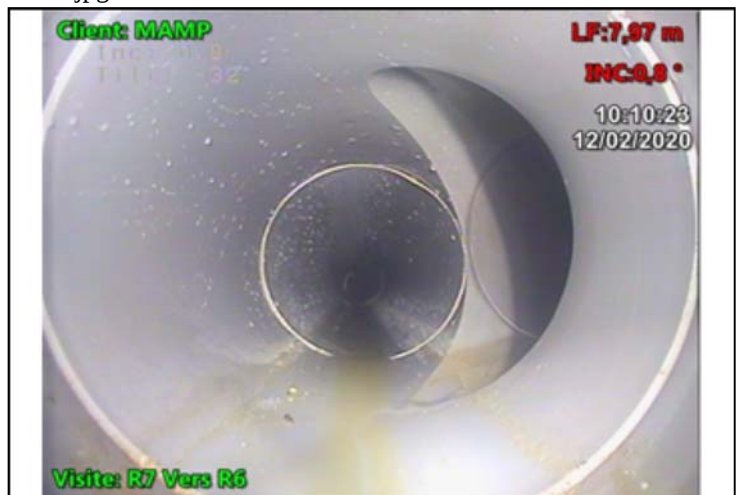


Client	: MAMP	Rapport	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur inspectée: 36,28 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 36,28 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9943.jpg	
11,66		00:02:00		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T14
Position: 09H




9944.jpg

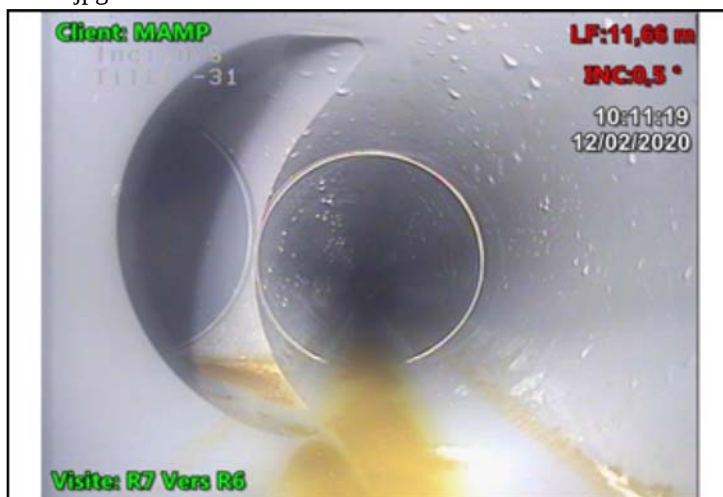


Client	: MAMP	Rapport	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 36,28 m
Matériau:	PVC		R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur mesurée: 36,28 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		9945.jpg
30,45		00:04:07		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T15
Position: 09H

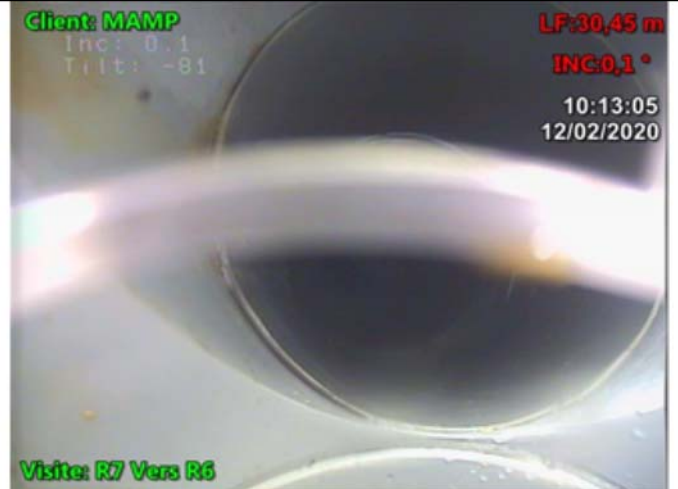

9946.jpg

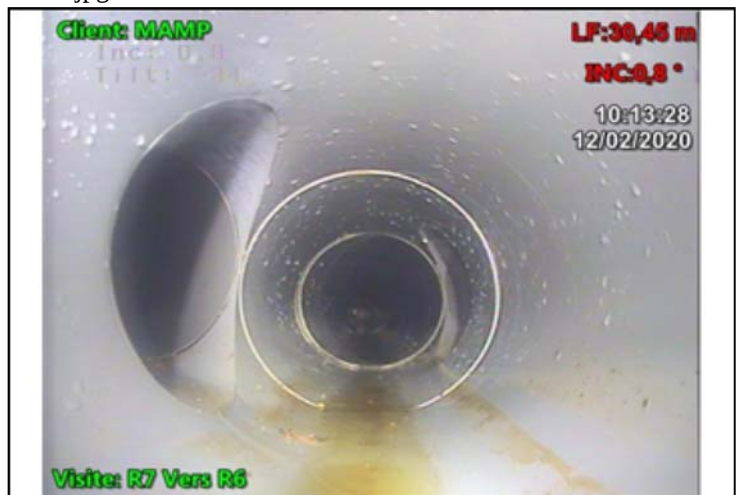


Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 36,28 m
Matériau:	PVC		R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur mesurée: 36,28 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9947.jpg	
30,81		00:04:47		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T16
Position: 03H



9948.jpg

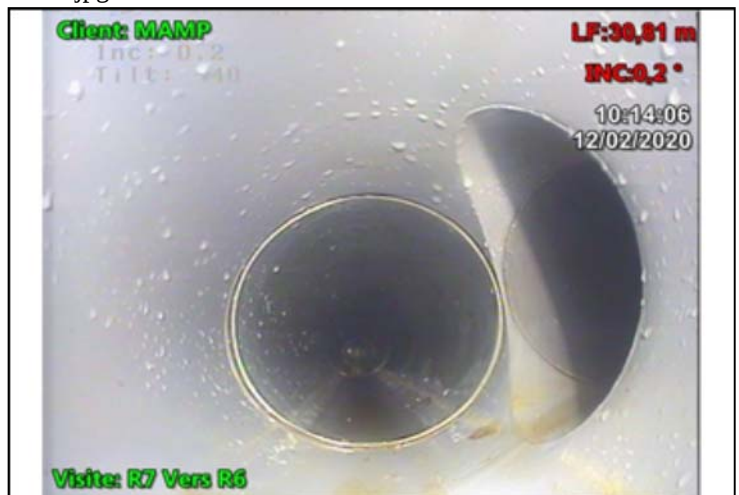

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Père D'Ail Entressen		


TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur inspectée: 36,28 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 36,28 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	
34,17		00:05:42	9949.jpg

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T17
Position: 03H



9950.jpg

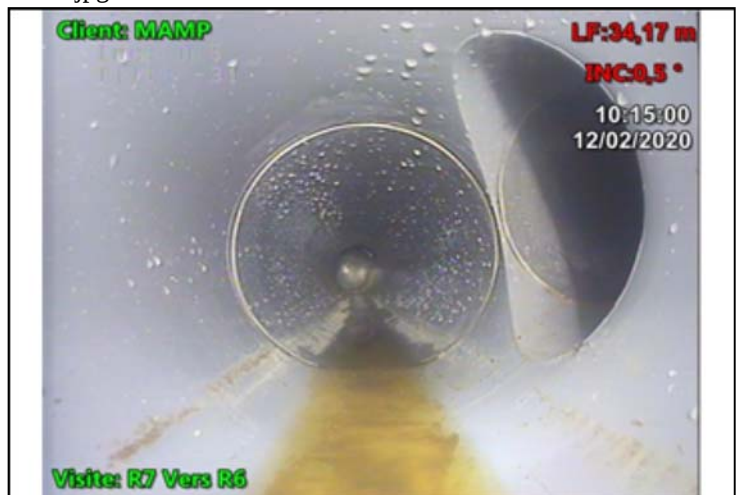

Distance	Fil d'eau	Vidéo	
35,98		00:06:23	9951.jpg

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE
regard de visite :R6
Liaison canalisation - regard



Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I	

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 36,28 m
Matériau: PVC			R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur mesurée: 36,28 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9952.jpg
	36,28		00:06:57	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Fin de l'inspection



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 75 / 124

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02	
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Longueur inspectée: 36,28 m	Sens de visite: R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur mesurée: 36,28 m	
Matériau: PVC					

Sens d'écoulement

0,0 m Remarque générale (BDB)
Photo:9939.jpg
Départ de l'inspection

0,3 m Noeud de départ (BCD) (R7)
Type:regard de visite
Profondeur:1,30m.
Photo:9940.jpg
Liaison regard - canalisation

8,0 m Raccordement (BCA)
Type:culotte
Etat:raccordement ouvert (BR-T13)
Photo:9941.jpg/9942.jpg

11,7 m Raccordement (BCA)
Type:culotte
Etat:raccordement ouvert (BR-T14)
Photo:9943.jpg/9944.jpg

30,5 m Raccordement (BCA)
Type:culotte
Etat:raccordement ouvert (BR-T15)
Photo:9945.jpg/9946.jpg

30,8 m Raccordement (BCA)
Type:culotte
Etat:raccordement ouvert (BR-T16)
Photo:9947.jpg/9948.jpg

34,2 m Raccordement (BCA)
Type:culotte
Etat:raccordement ouvert (BR-T17)
Photo:9949.jpg/9950.jpg

36,0 m Noeud d'arrivée (BCE) (R6)
Type:regard de visite
Profondeur:1,23m.
Photo:9951.jpg
Liaison canalisation - regard

Client : MAMP Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	Rapport MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
---	--

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée:	36,28 m
Matériau: PVC		R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur mesurée:	36,28 m



36,3 m
Remarque générale (BDB)


Photo:9952.jpg

Fin de l'inspection

Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur inspectée:	36,28 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée:	36,28 m

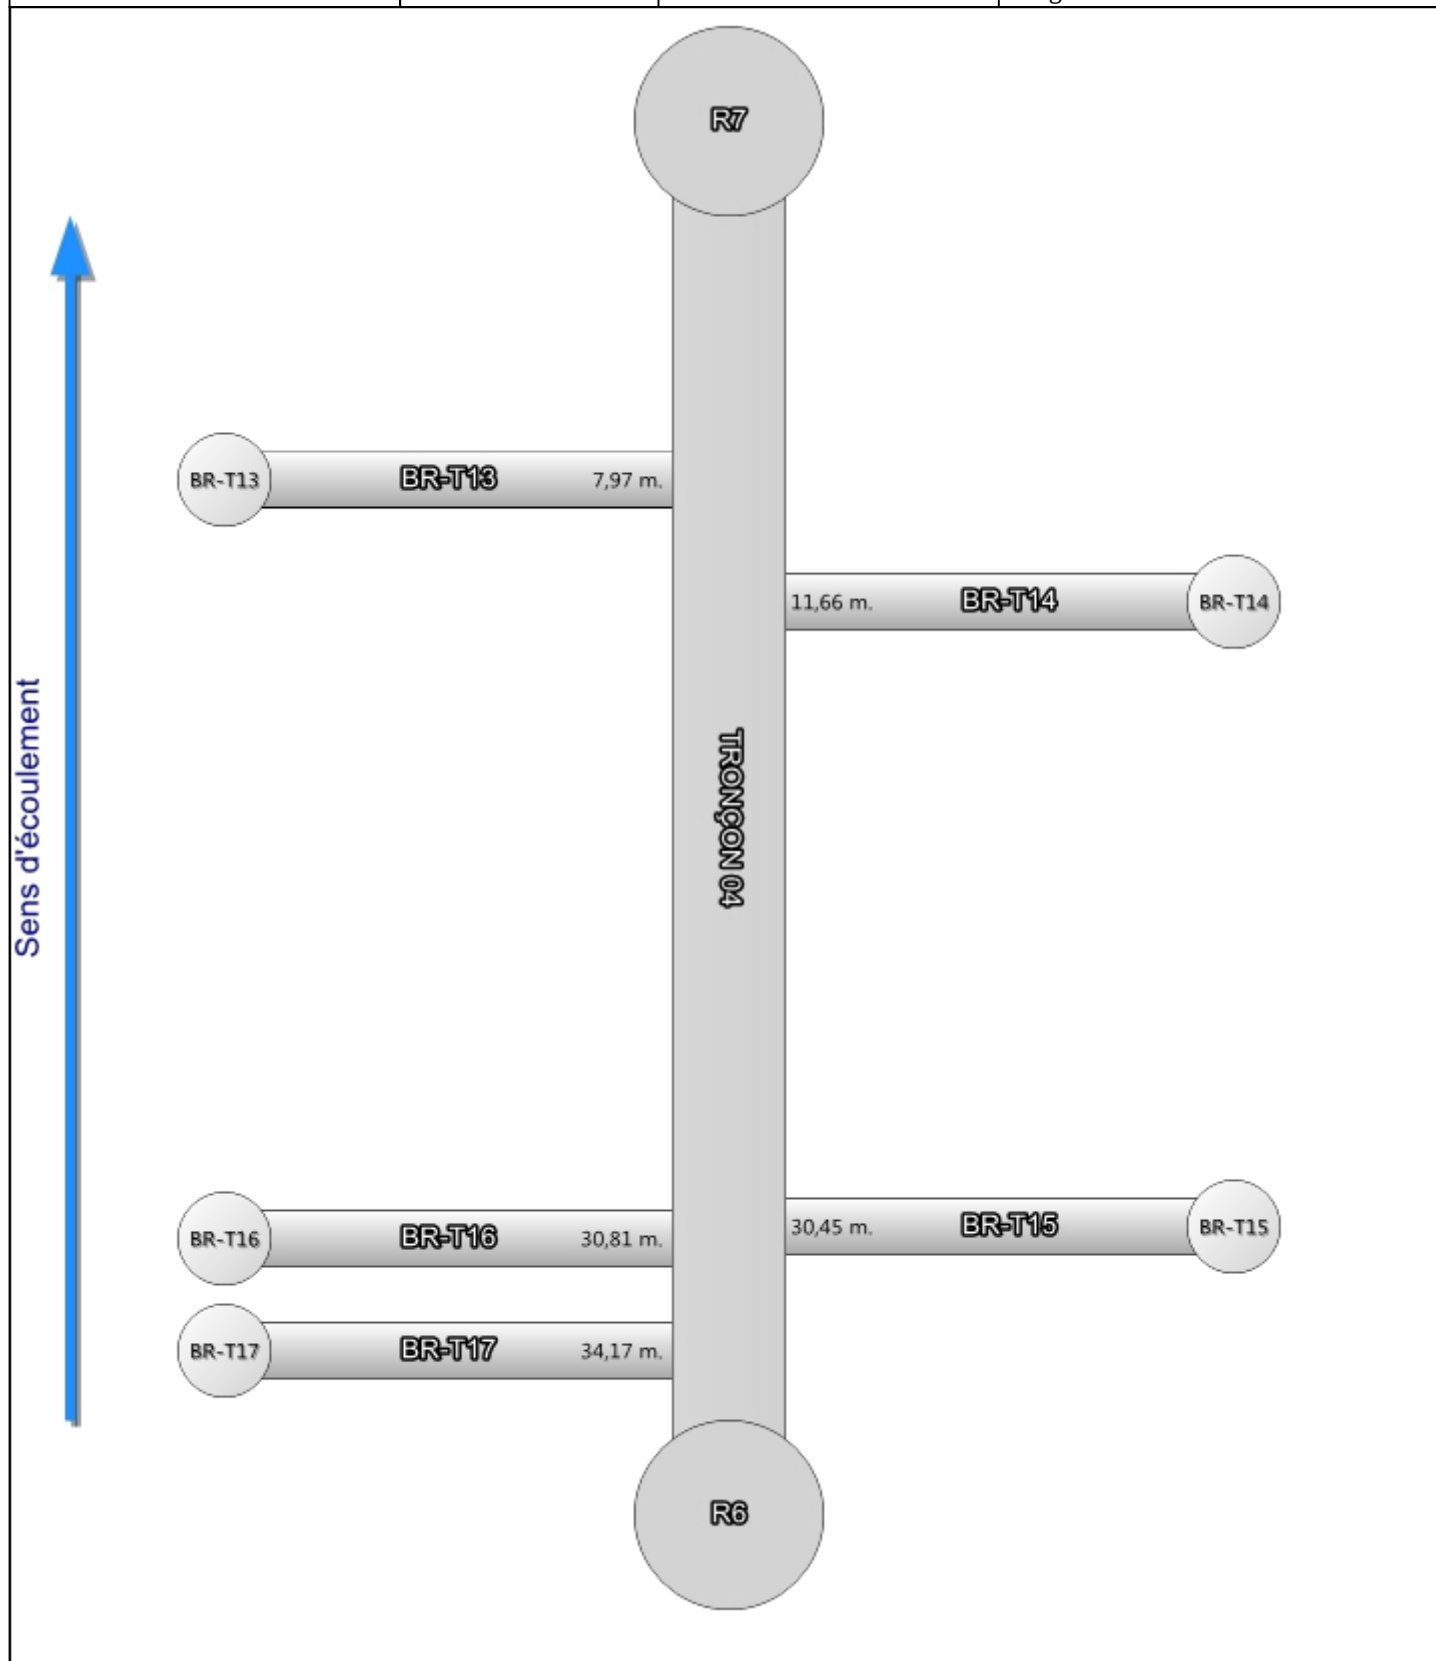


Client :	MAMP	Rapport :	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Père D'Ail Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R6 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	Longueur inspectée: 36,28 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 36,28 m	

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 0,9°

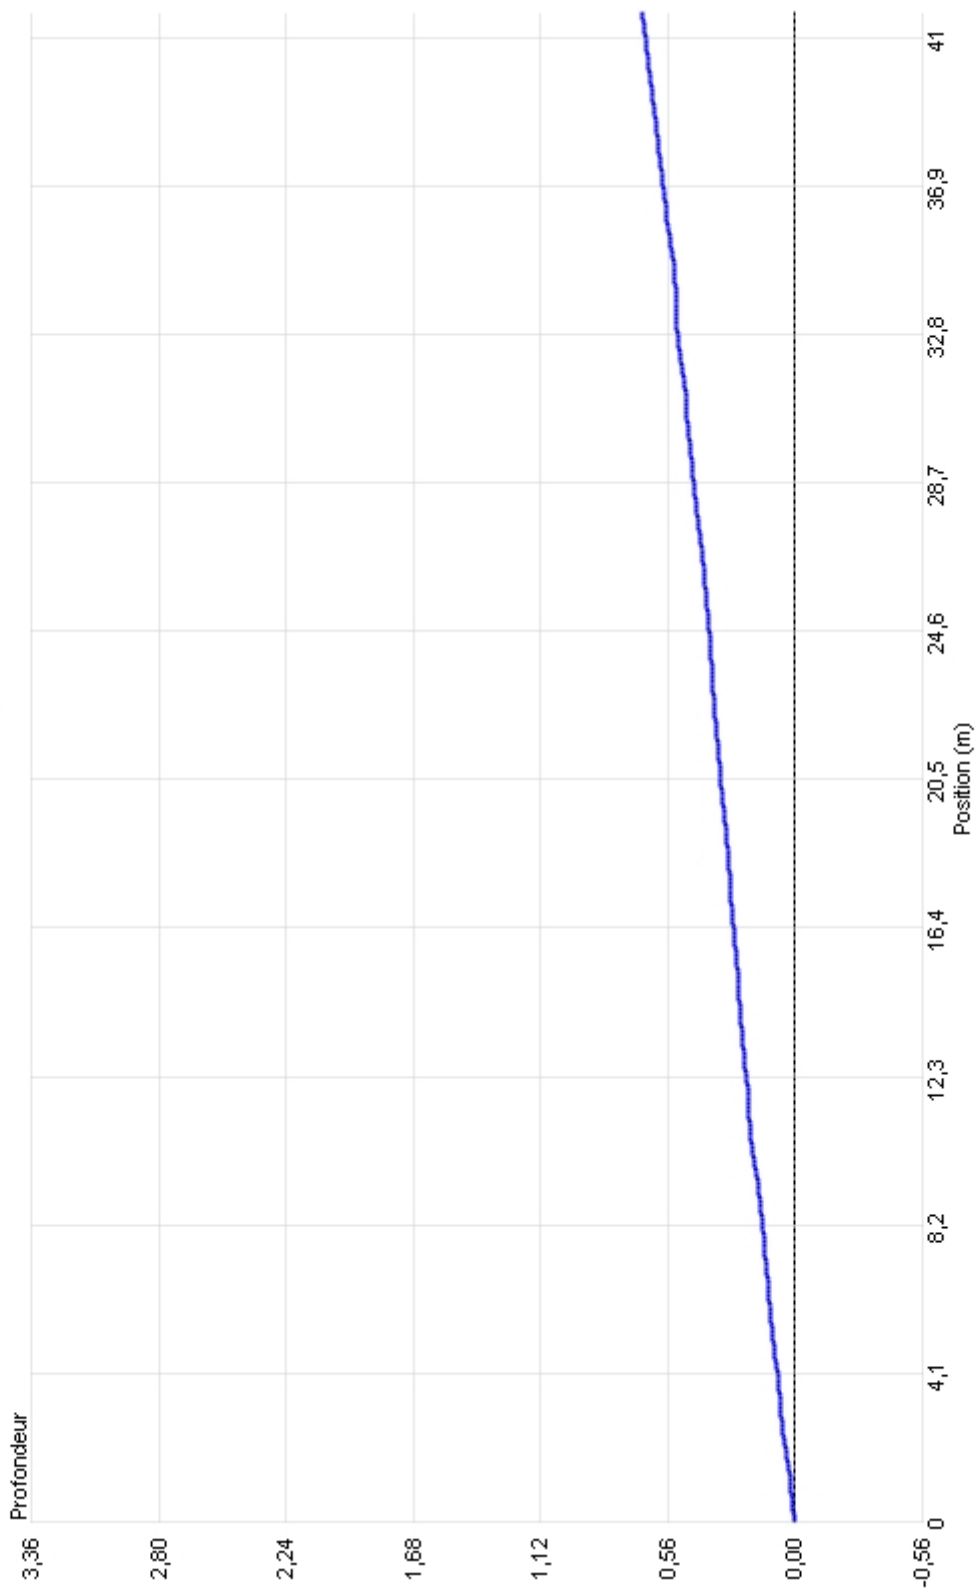

Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

BR-T13		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T13	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T13 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	7 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	7 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202124421.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T13	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

BR-T13		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: BR-T13 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 7 m
Matériau:	PVC		BR-T13 Vers TRONÇON 04	Longueur mesurée: 7 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T13
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8385.jpg
	7,00		<u>00:00:30</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 81 / 124

BR-T13		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: BR-T13 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:		Sens de visite: BR-T13 Vers TRONÇON 04	Longueur inspectée: 7 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 7 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

BR-T14		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T14	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T14 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	21,8 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	21,8 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202124643.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T14	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I	
	Rue Pèbre D'Ail		
	Entressen		

BR-T14		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: BR-T14 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T14 Vers TRONÇON 04	Longueur inspectée: 21,8 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 21,8 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T14
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8389.jpg
	9,40		<u>00:01:46</u>	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :
Position: 09H



	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8387.jpg
	21,80		<u>00:04:00</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	-	MAMP
Chantier	:	Rue Pèbre D'Ail Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

BR-T14		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: BR-T14 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T14 Vers TRONÇON 04	Longueur inspectée: 21,8 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 21,8 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

BR-T15		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T15	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T15 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	4,5 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	4,5 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202125257.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T15	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

BR-T15			Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T15 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T15 Vers TRONÇON 04	Longueur inspectée: 4,5 m
Matériau: PVC					Longueur mesurée: 4,5 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo		
	0,00				

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T15
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8391.jpg
	4,50		<u>00:00:32</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 87 / 124

BR-T15		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T15 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T15 Vers TRONÇON 04	Longueur inspectée: 4,5 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 4,5 m

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

BR-T16		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T16	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T16 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	1,9 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	1,9 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202125519.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T16	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail		
	Entressen		

BR-T16		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T16 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T16 Vers TRONÇON 04	Longueur inspectée: 1,9 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 1,9 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T16
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8393.jpg
	1,90		<u>00:00:17</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		-		+			
Client	:	MAMP				Rapport	
Chantier	:					MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I	
		Rue Père D'Ail					
		Entressen					
						Page 90 / 124	

BR-T16		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T16 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:		Sens de visite: BR-T16 Vers TRONÇON 04	Longueur inspectée: 1,9 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 1,9 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

BR-T17		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T17	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T17 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	1,9 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	1,9 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202125810.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T17	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

BR-T17			Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T17 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T17 Vers TRONÇON 04	Longueur inspectée: 1,9 m
Matériau: PVC					Longueur mesurée: 1,9 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo		
	0,00				

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T17
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8395.jpg
	1,90		<u>00:00:13</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 93 / 124

BR-T17		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T17 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Longueur de visite: BR-T17 Vers TRONÇON 04	Longueur inspectée: 1,9 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 1,9 m	

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

TRONÇON 05		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R9	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	R10EXIST	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R9 Vers R10EXIST	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	1,8 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	1,8 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	3364.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R9	Référence	R10EXIST
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,43 m	Profondeur:	1,38 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9 Vers R10EXIST	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 1,8 m
Matériau:	PVC		R9 (1,4m) Vers R10EXIST (1,4m)	Longueur mesurée: 1,8 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	9953.jpg
0,00			

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Départ de l'inspection



Distance	Fil d'eau	Vidéo	9954.jpg
0,30			

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART
regard de visite :R9
Liaison regard - canalisation



Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

TRONÇON 05			Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9 Vers R10EXIST	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite: R9 (1,4m) Vers R10EXIST (1,4m)	Longueur inspectée: 1,8 m
Matériau: PVC					Longueur mesurée: 1,8 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9955.jpg	
	1,66		00:00:22		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T1
Position: 03H



9956.jpg



	Distance	Fil d'eau	Vidéo	9957.jpg
	1,80		00:00:55	

(BDC.Z.C) INSPECTION ABANDONNÉE
autre
l'inspection de la conduite totale est terminée.
Raccordement sur existant




Gravité

Client	-	MAMP
Chantier	:	Rue Pèbre D'Ail Entressen

Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
---------	-------------------------------------


TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9 Vers R10EXIST	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9 (1,4m) Vers R10EXIST (1,4m)	Longueur inspectée:	1,8 m
Matériau: PVC			Longueur mesurée:	1,8 m

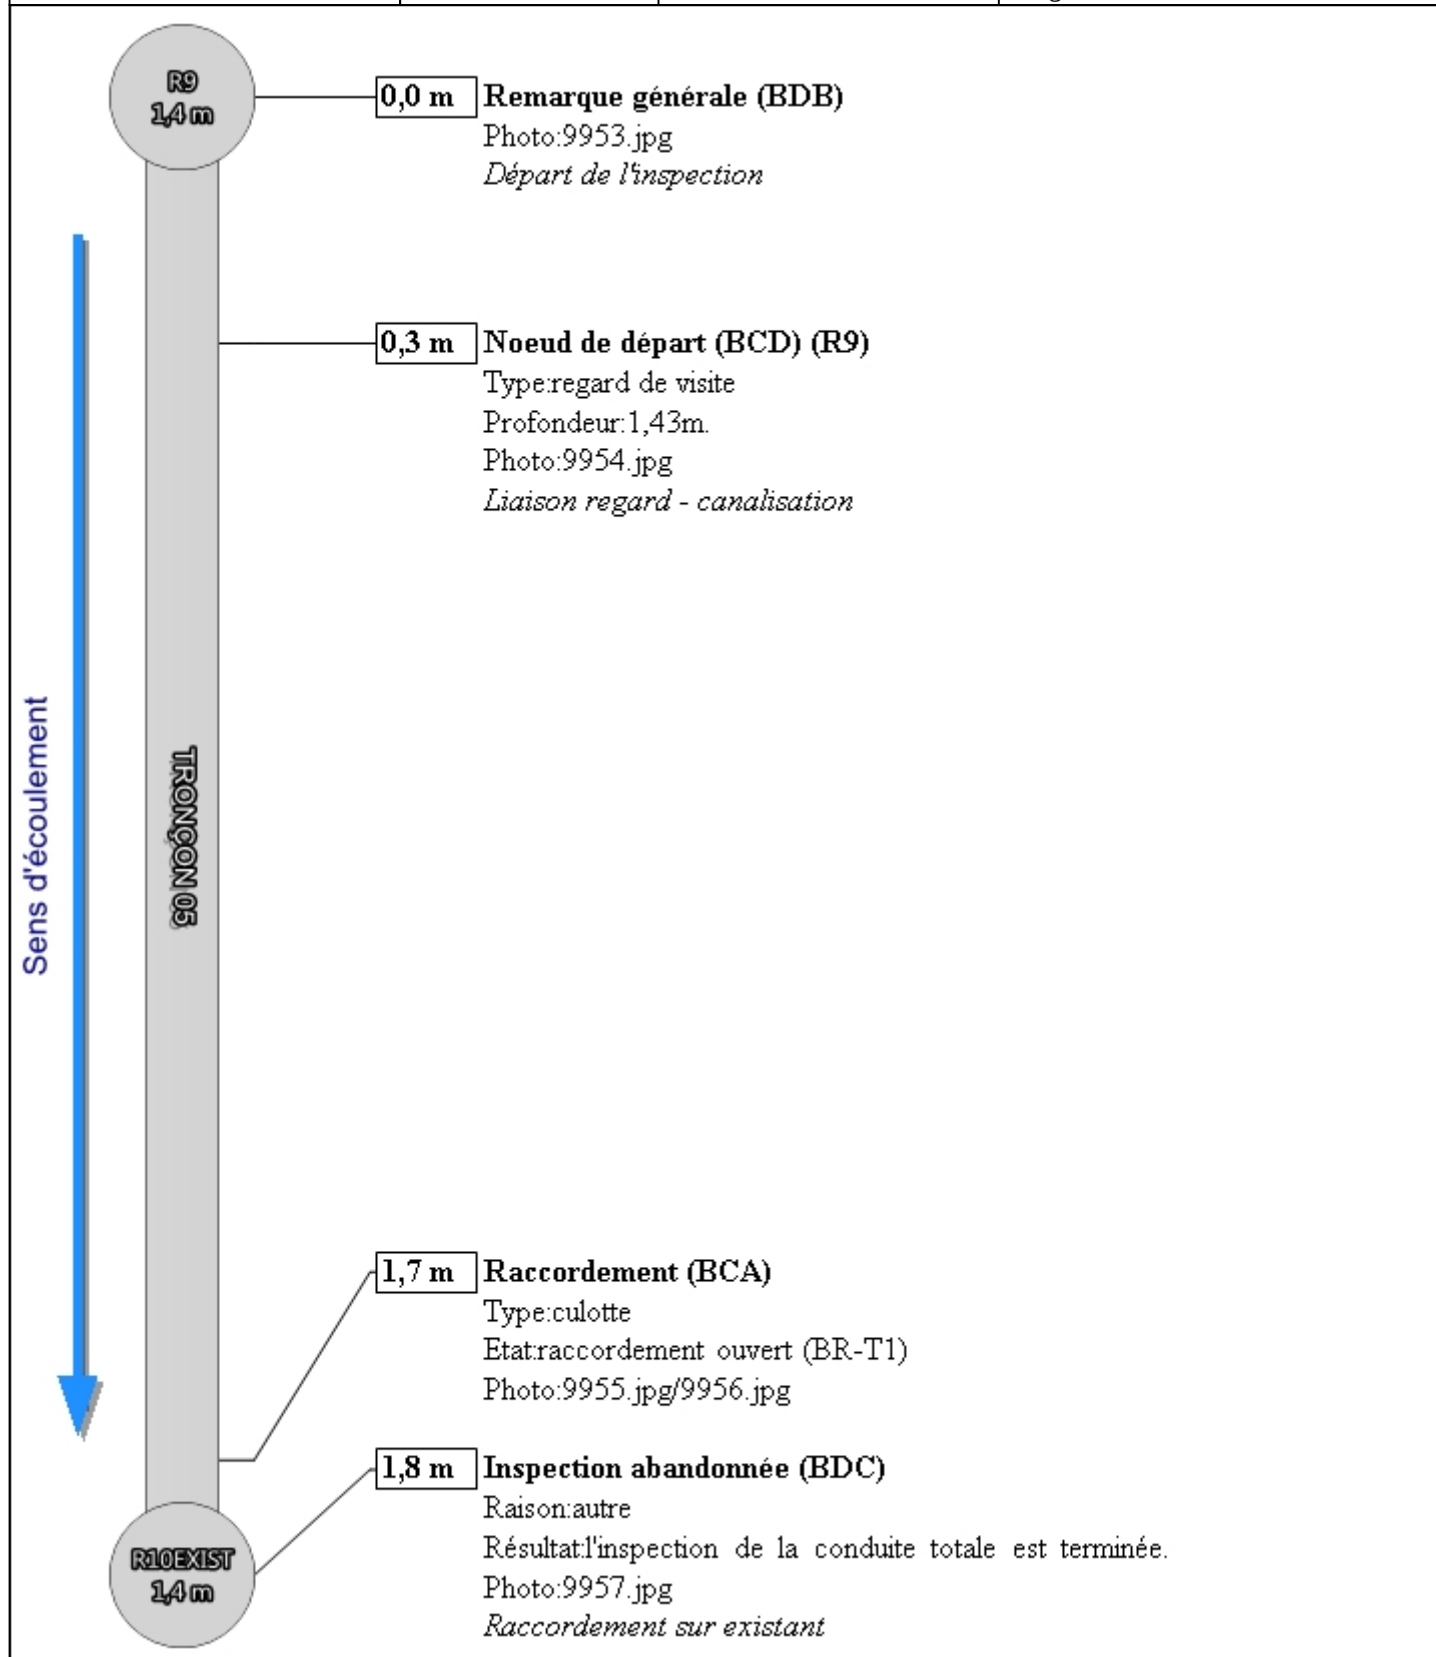

Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen


Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9 Vers R10EXIST	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9 (1,4m) Vers R10EXIST (1,4m)	Longueur inspectée: 1,8 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 1,8 m

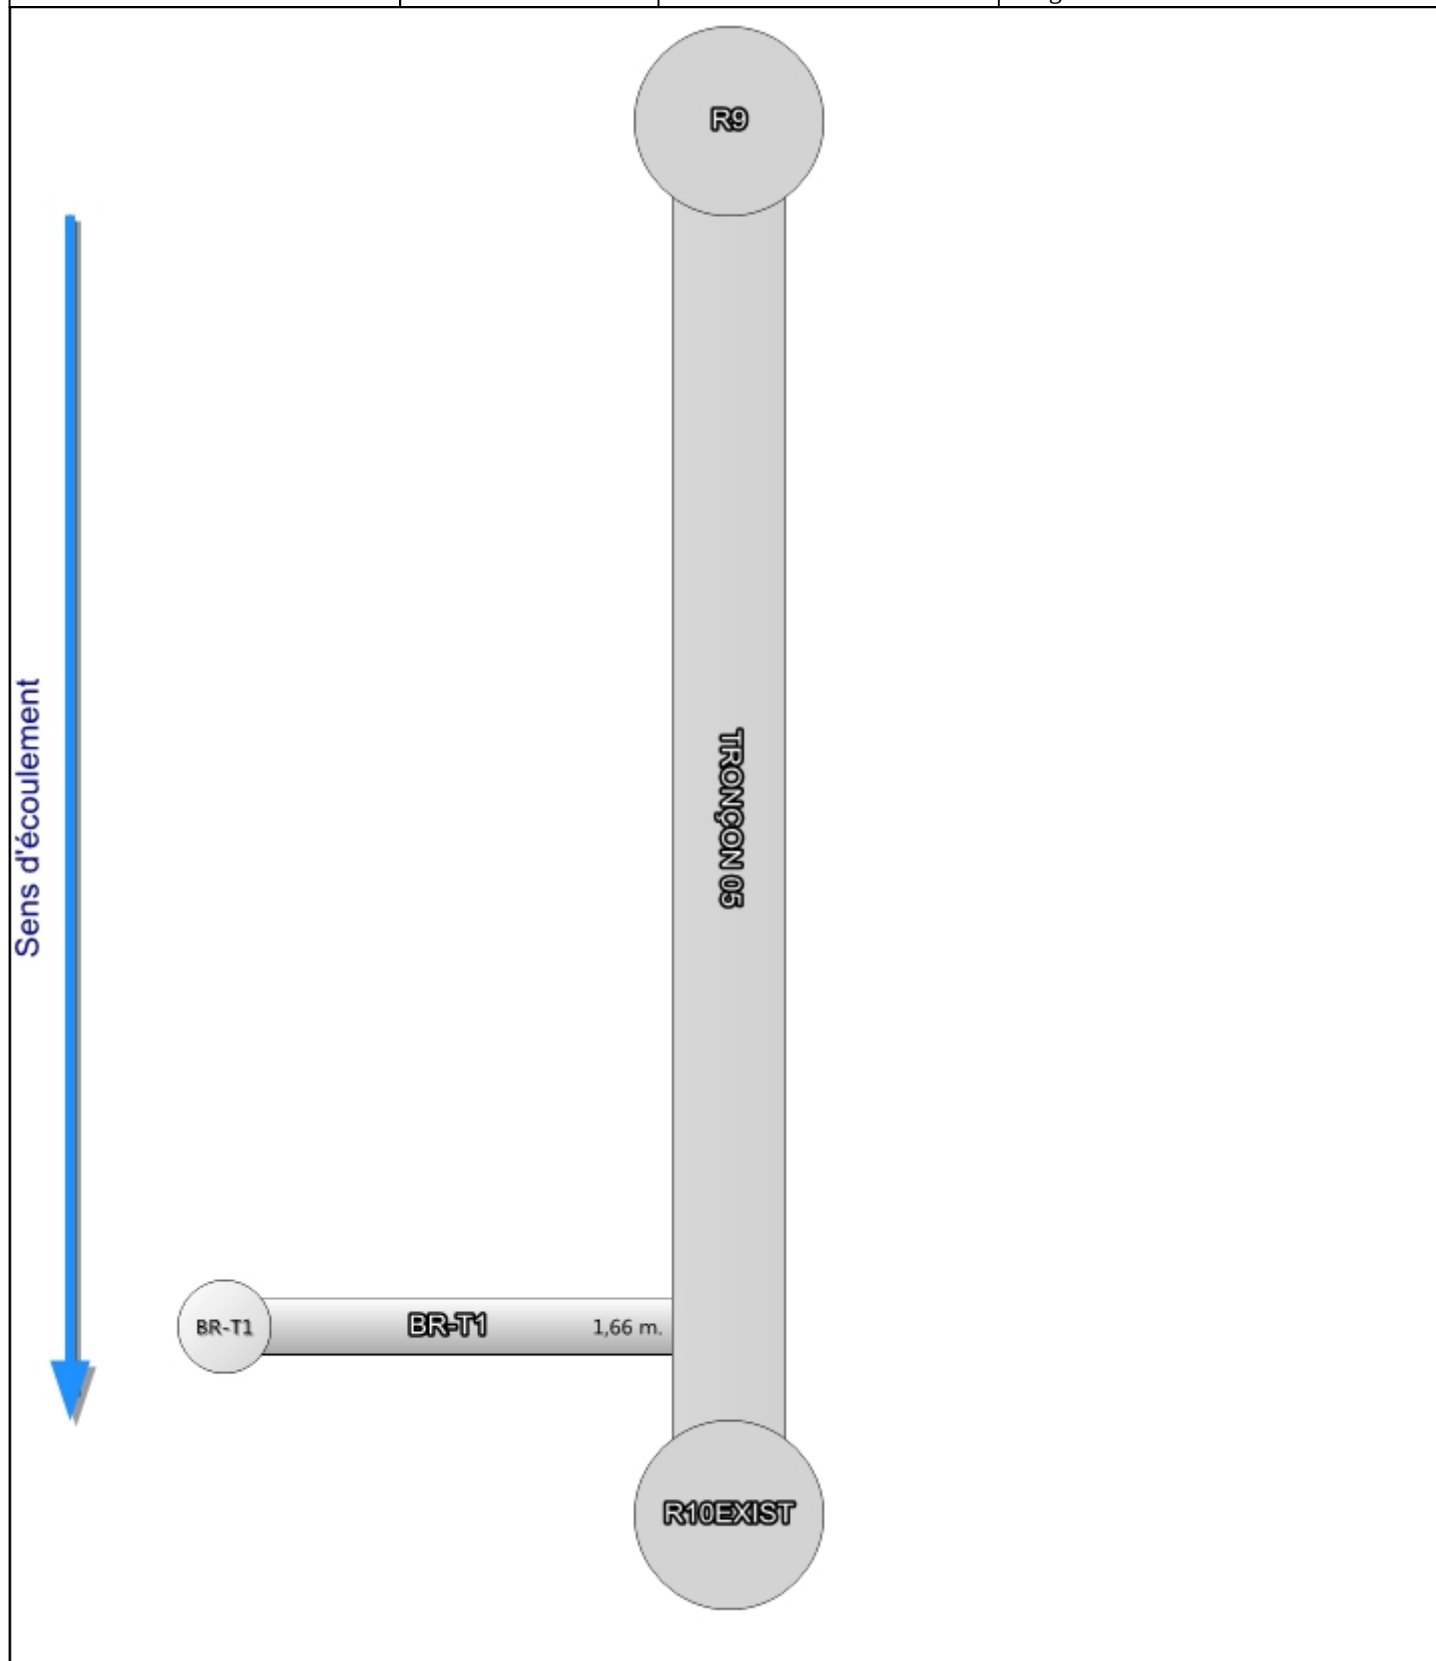

Client : MAMP	Rapport MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier : Rue Pèbre D'Ail	
Entressen	

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R9 Vers R10EXIST	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R9 (1,4m) Vers R10EXIST (1,4m)	Longueur inspectée: 1,8 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 1,8 m	

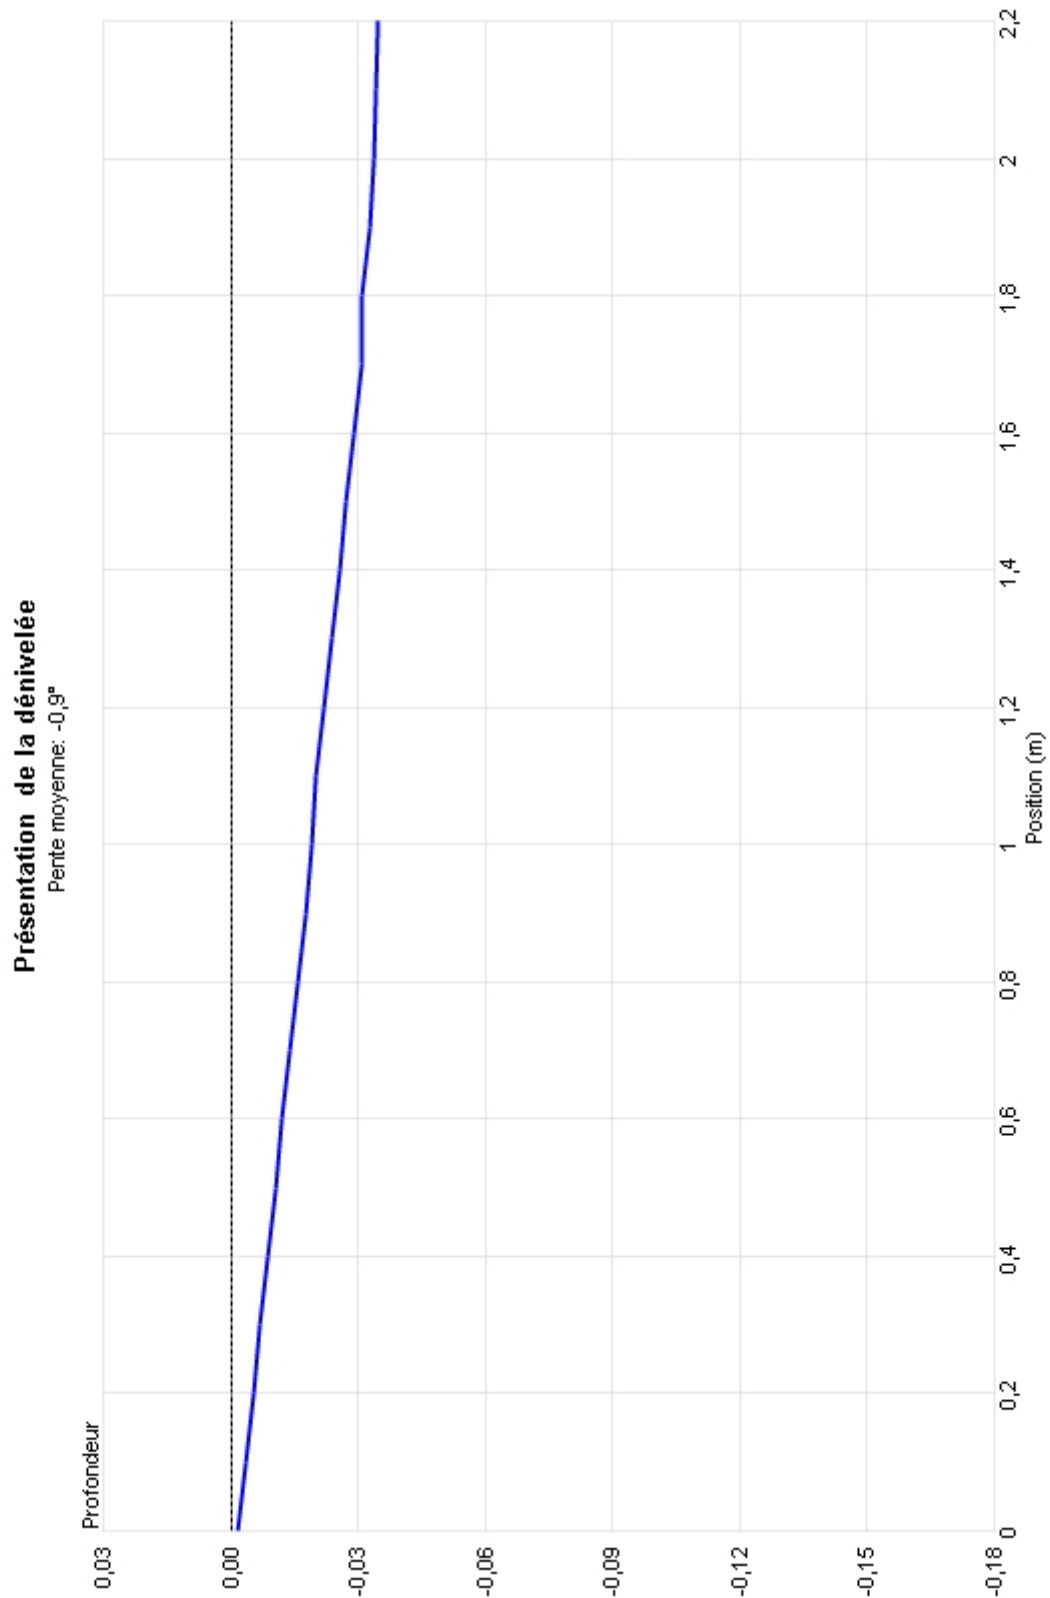

Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

BR-T1		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T1	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 05	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T1 Vers TRONÇON 05	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	8,75 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	8,75 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202121720.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T1	Référence	TRONÇON 05
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

BR-T1		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T1 Vers TRONÇON 05	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 8,75 m
Matériau:	PVC		BR-T1 Vers TRONÇON 05	Longueur mesurée: 8,75 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			


(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BR-T1

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8321.jpg
	8,75		<u>00:01:33</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :

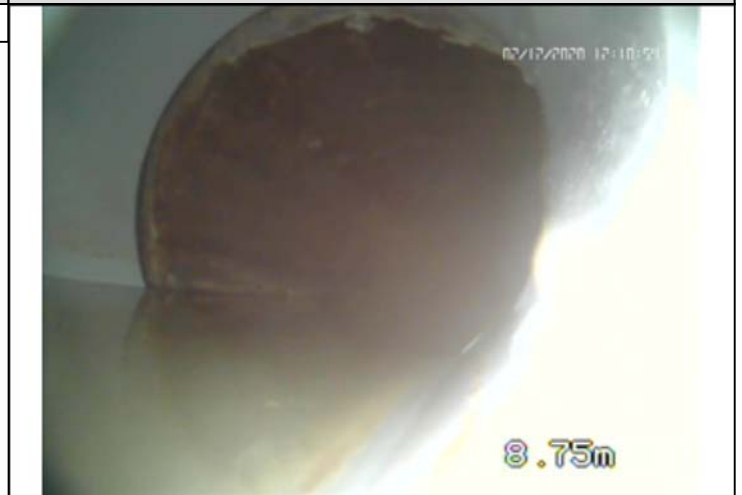

Client	:	MAMP
--------	---	------

Chantier :

Rue Pèbre D'Ail

Entressen

Rapport

MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I

BR-T1		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T1 Vers TRONÇON 05	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T1 Vers TRONÇON 05	Longueur inspectée: 8,75 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 8,75 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

TRONÇON 06		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R7	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	BRT18	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT18 Vers R7	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	10,35 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	10,35 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	3365.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R7	Référence	BRT18
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,3 m	Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail		
	Entressen		

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: BRT18 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R7 (1,3m) Vers BRT18 (0,0m)	Longueur inspectée: 10,35 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 10,35 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	9958.jpg	
0,00				

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART
regard de visite :R7
Départ de l'inspection



Distance	Fil d'eau	Vidéo	9959.jpg	
10,04		00:01:01		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-T19
Position: 09H



Distance	Fil d'eau	Vidéo	9960.jpg	
10,35		00:01:35		


(AEC.A) CHANGEMENT - SECTION TRANSVERSALE
circulaire
Quantification: 160 mm
(BDC.Z.D) INSPECTION ABANDONNÉE
autre
l'inspection de la conduite totale n'est pas terminée.
Reprise en sens inverse



Gravité	-									+
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Client	:	MAMP	Rapport	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier	:	Rue Père D'Ail Entressen		


TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: BRT18 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée:	10,35 m
Matériau:	PVC		R7 (1,3m) Vers BRT18 (0,0m)	Longueur mesurée:	10,35 m

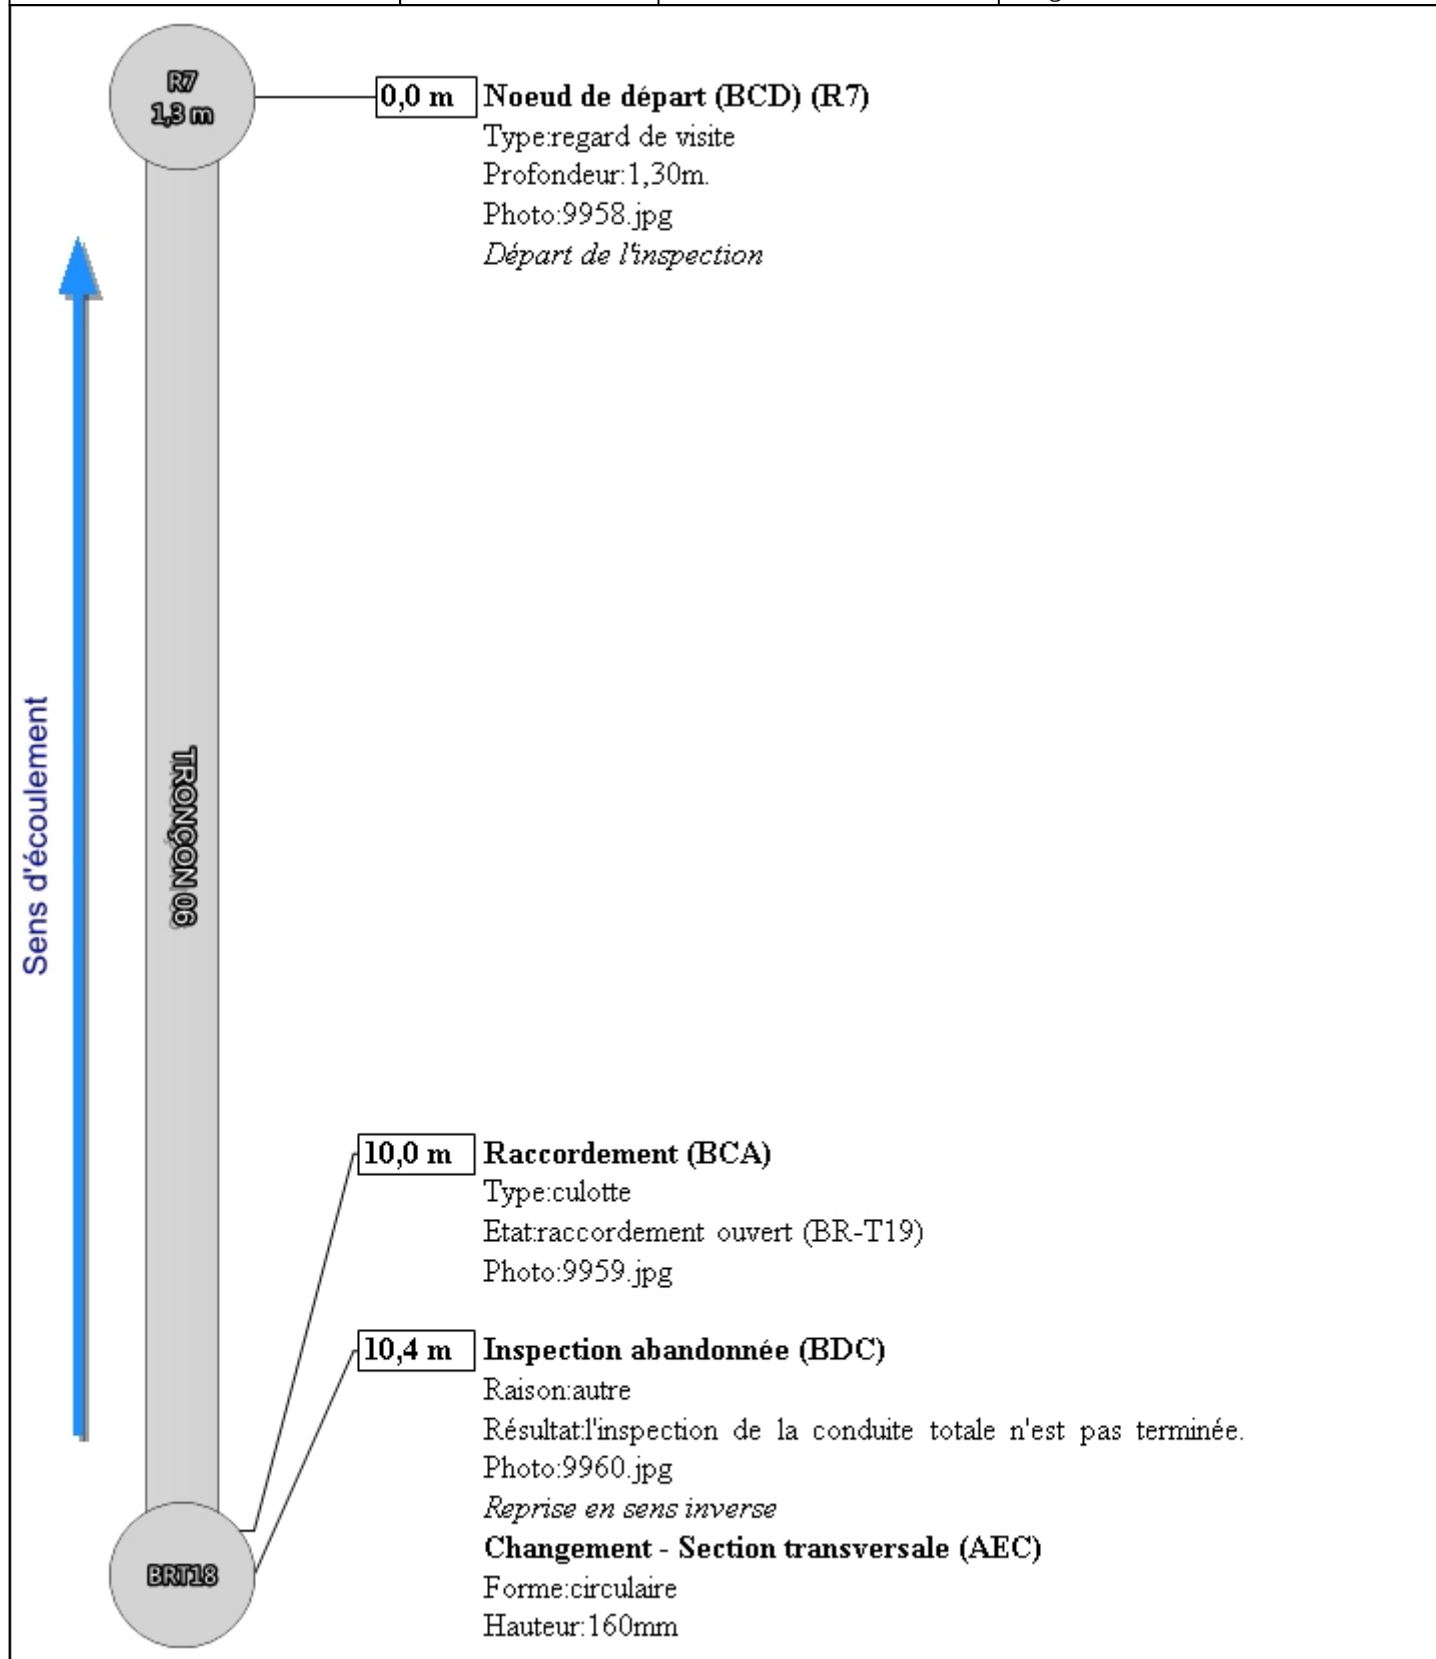

Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: BRT18 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R7 (1,3m) Vers BRT18 (0,0m)	Longueur inspectée:	10,35 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée:	10,35 m

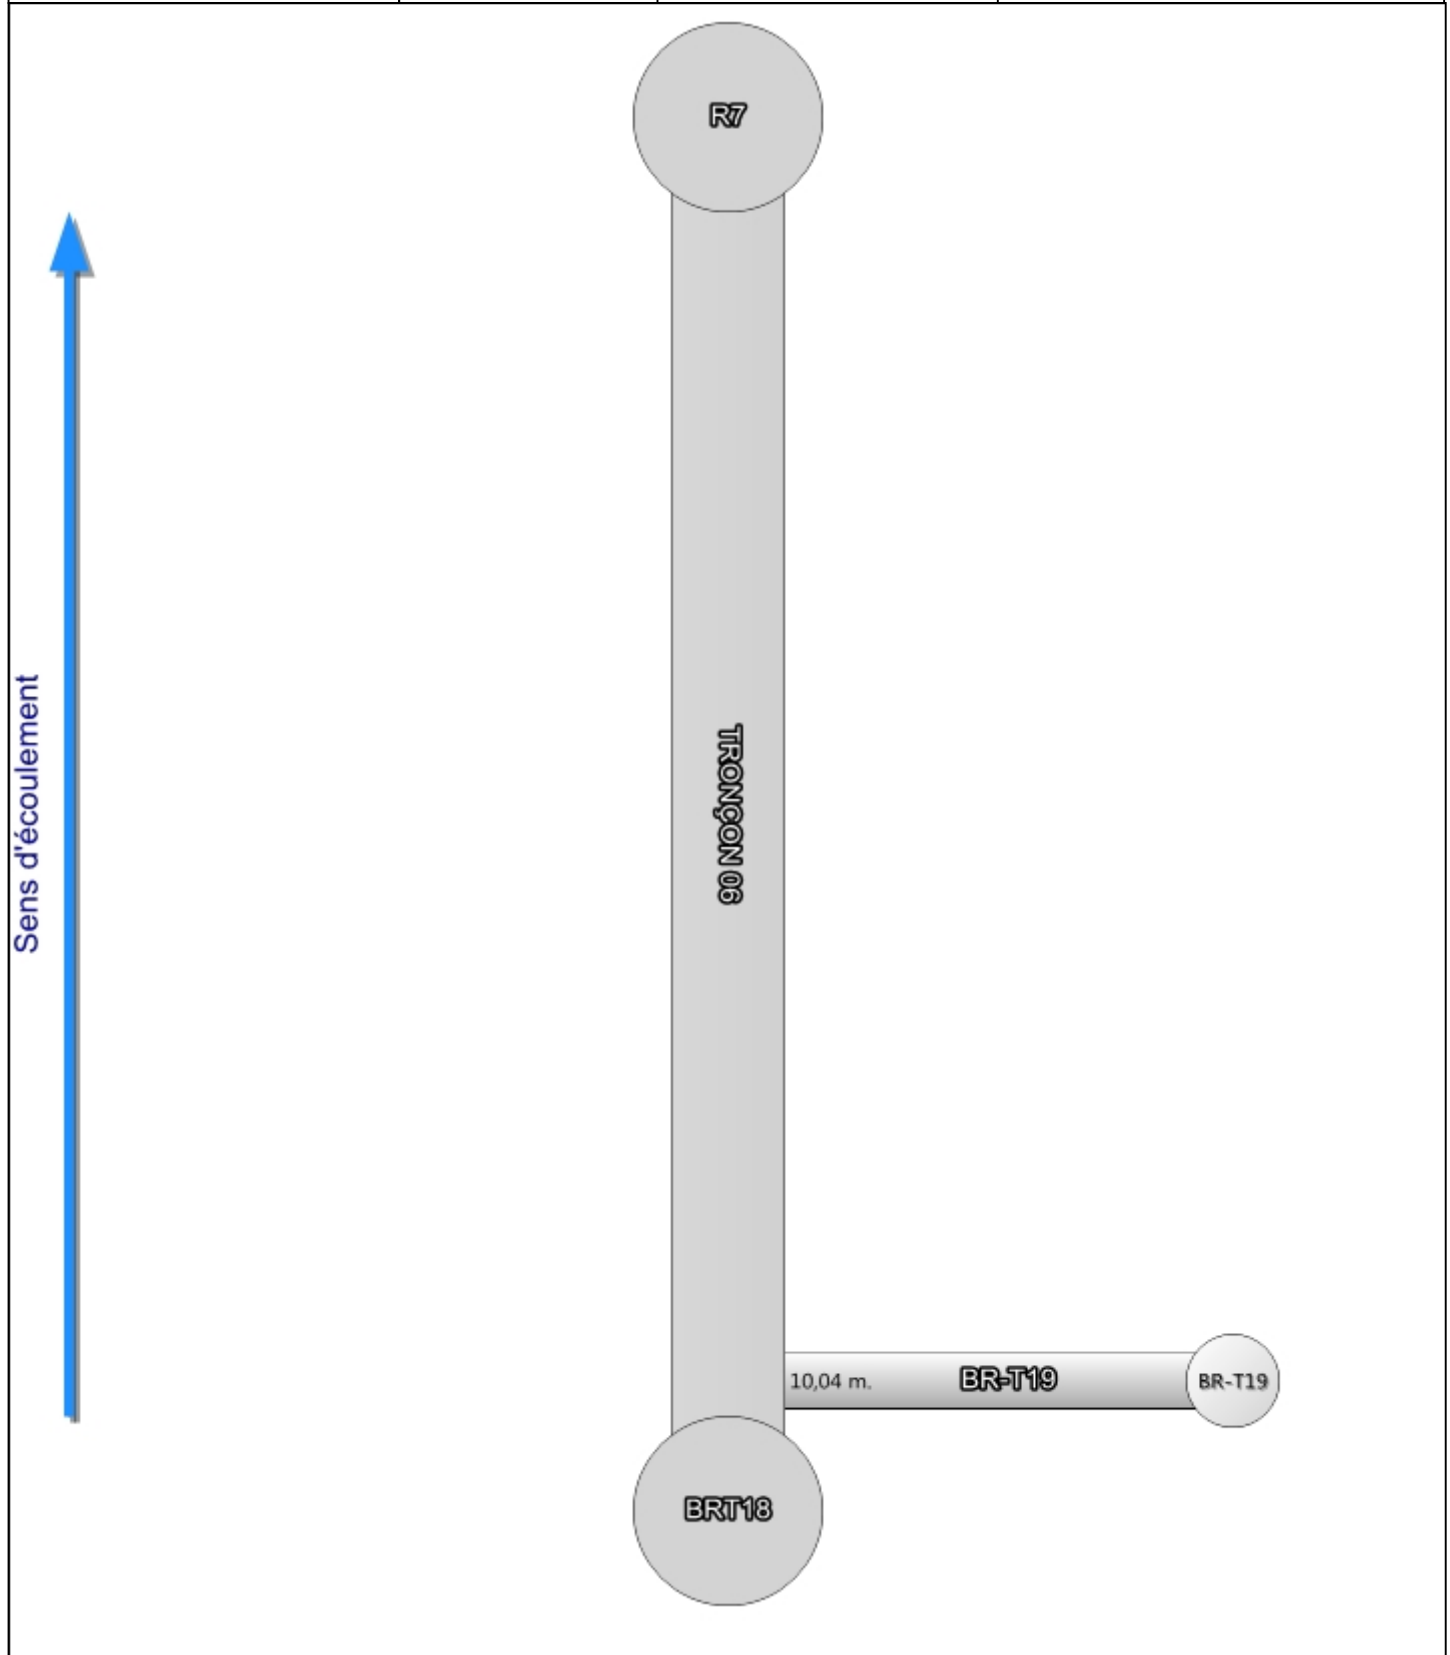


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail Entressen		

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: BRT18 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: R7 (1,3m) Vers BRT18 (0,0m)	Longueur inspectée: 10,35 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 10,35 m	

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 1,1°

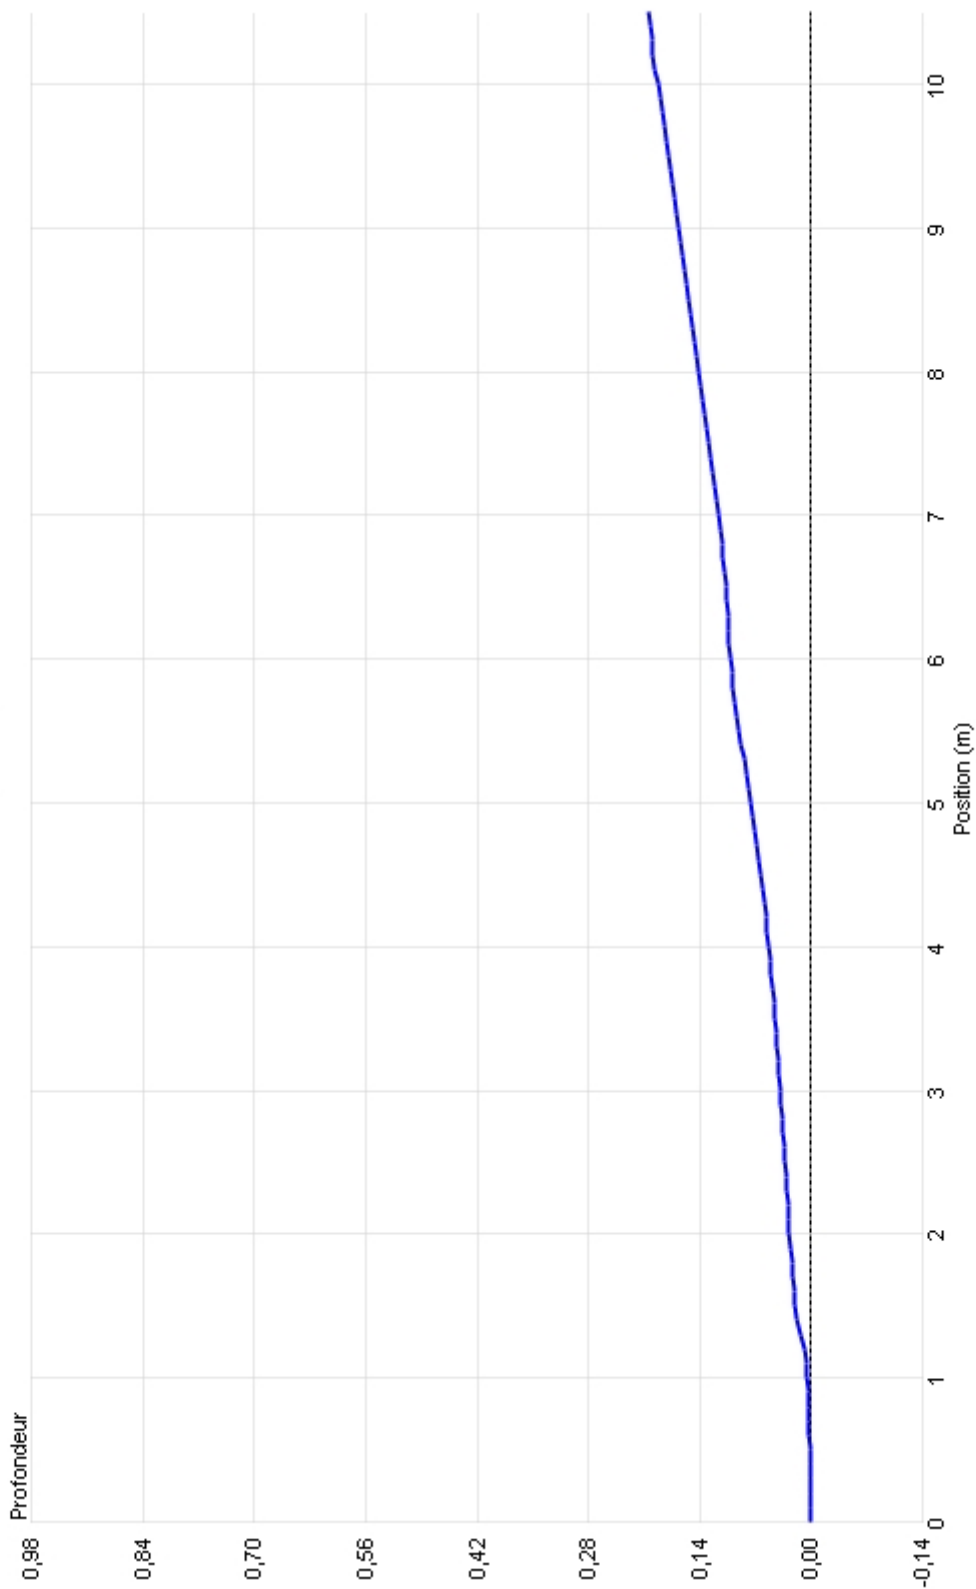

Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

BR-T19		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T19	Date d'inspection:	02/12/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 06	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T19 Vers TRONÇON 06	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	4,2 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	4,2 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202132053.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T19	Référence	TRONÇON 06
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:			
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue Pèbre D'Ail		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Entressen		

BR-T19		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T19 Vers TRONÇON 06	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T19 Vers TRONÇON 06	Longueur inspectée: 4,2 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 4,2 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BR-T19
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8397.jpg
	4,20		<u>00:00:18</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue Père D'Ail Entressen	MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
		Page 110 / 124

BR-T19		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T19 Vers TRONÇON 06	Date de l'inspection: 2020-12-02
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:		Sens de visite: BR-T19 Vers TRONÇON 06	Longueur inspectée: 4,2 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 4,2 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	
Rue Père D'Ail Entressen	

TRONÇON 07		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT18	Date d'inspection:	24/12/2020
Noeud d'arrivée:	R7	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT18 Vers R7	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue Pèbre D'Ail
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	15,25 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	15,25 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Delcorso	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201202131637.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT18	Référence	R7
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	1,3 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Entressen	

TRONÇON 07			Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT18 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-24
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT18 Vers R7	Longueur inspectée: 15,25 m
Matériau: PVC					Longueur mesurée: 15,25 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo		
	0,00				

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :BRT18

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8399.jpg
	15,25		<u>00:01:14</u>	

(BDC.Z.C) INSPECTION ABANDONNÉE

autre


l'inspection de la conduite totale est terminée.



Gravité


Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:		MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
		Rue Pèbre D'Ail	
		Entressen	
			Page 113 / 124

TRONÇON 07		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT18 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-24	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT18 Vers R7	Longueur inspectée:	15,25 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée:	15,25 m

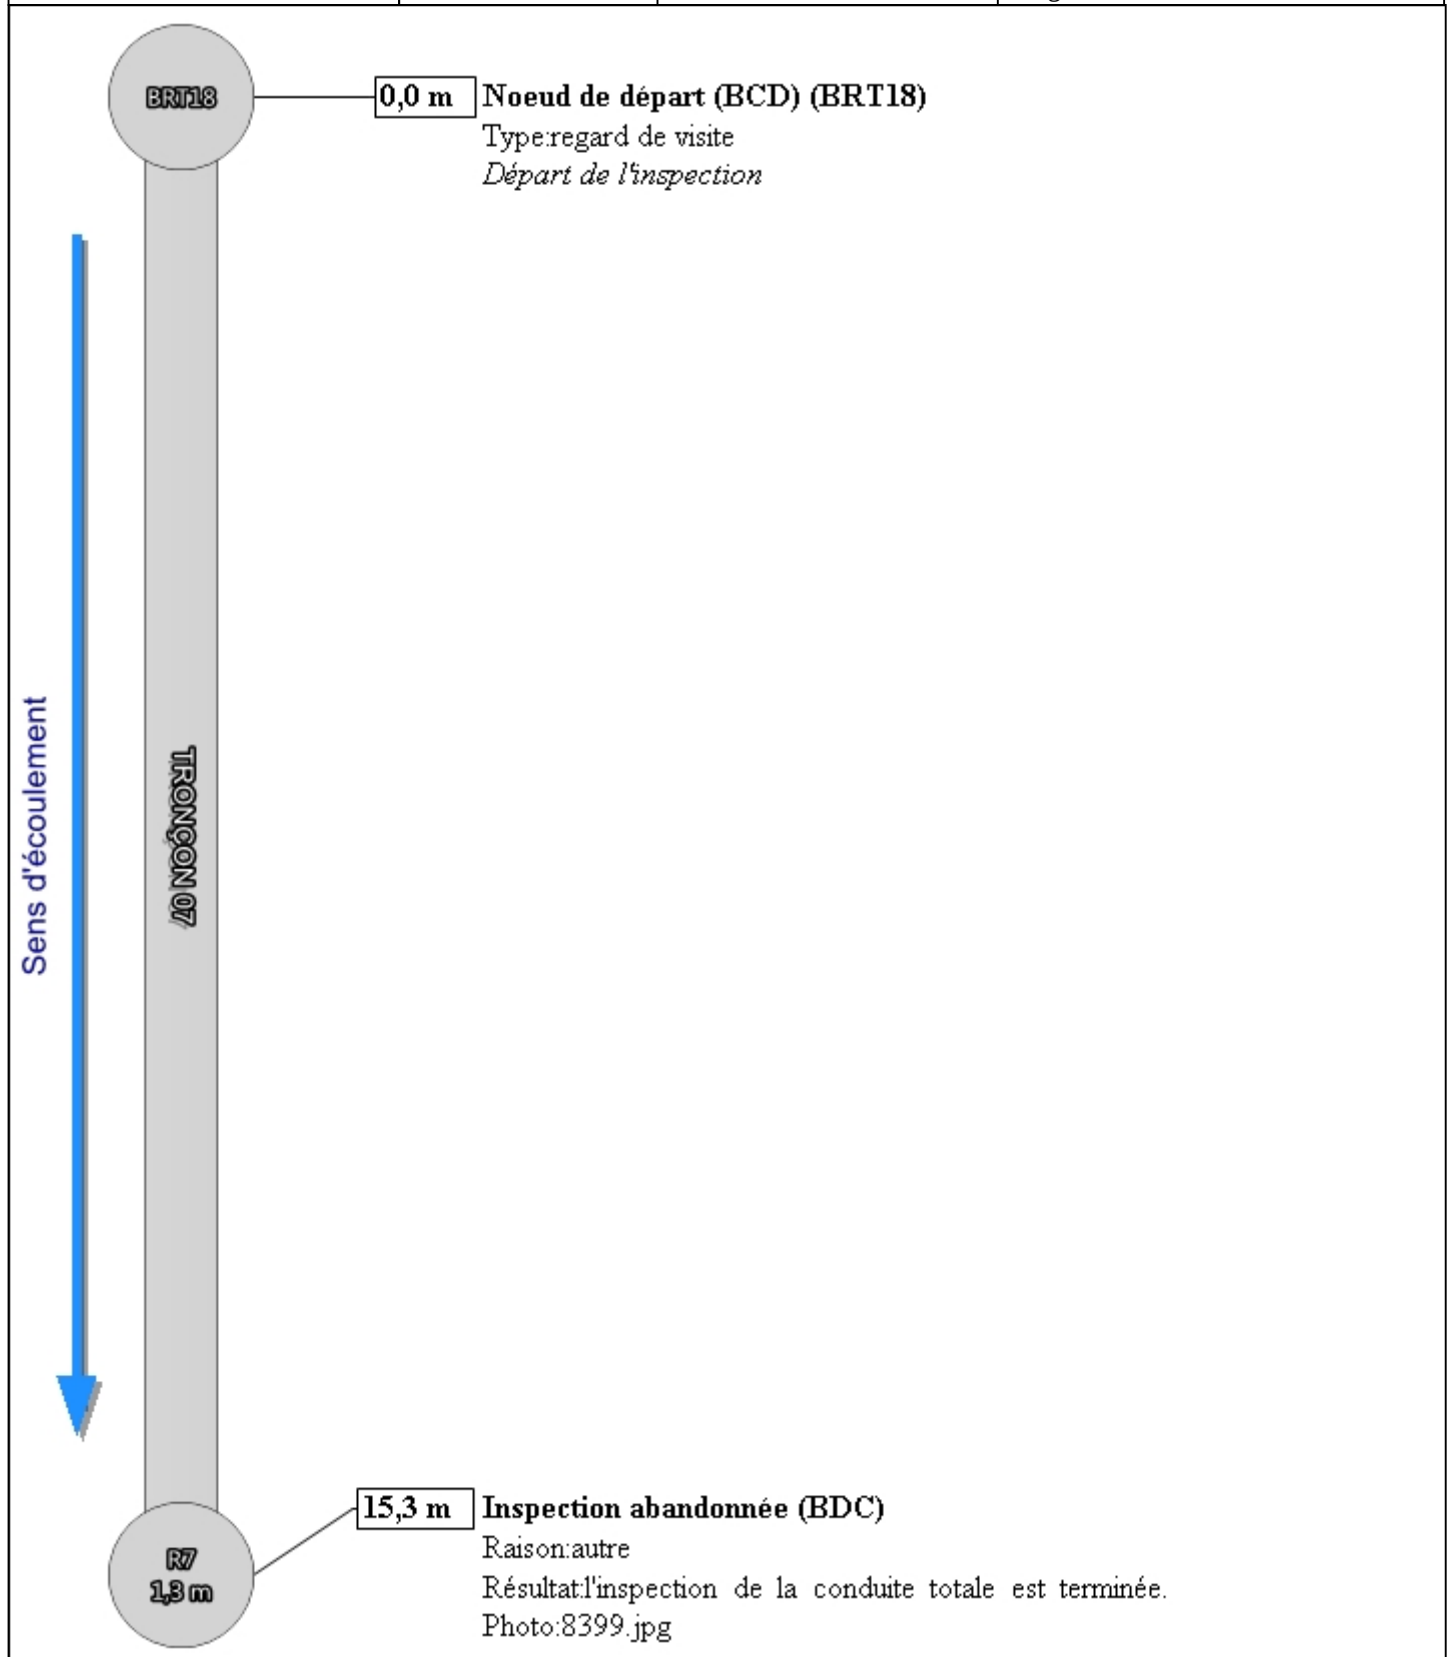

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier :	Rue Pèbre D'Ail Entressen		

TRONÇON 07		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT18 Vers R7	Date de l'inspection: 2020-12-24
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Longueur inspectée: 15,25 m	Sens de visite: BRT18 Vers R7	Longueur mesurée: 15,25 m
Matériau: PVC				

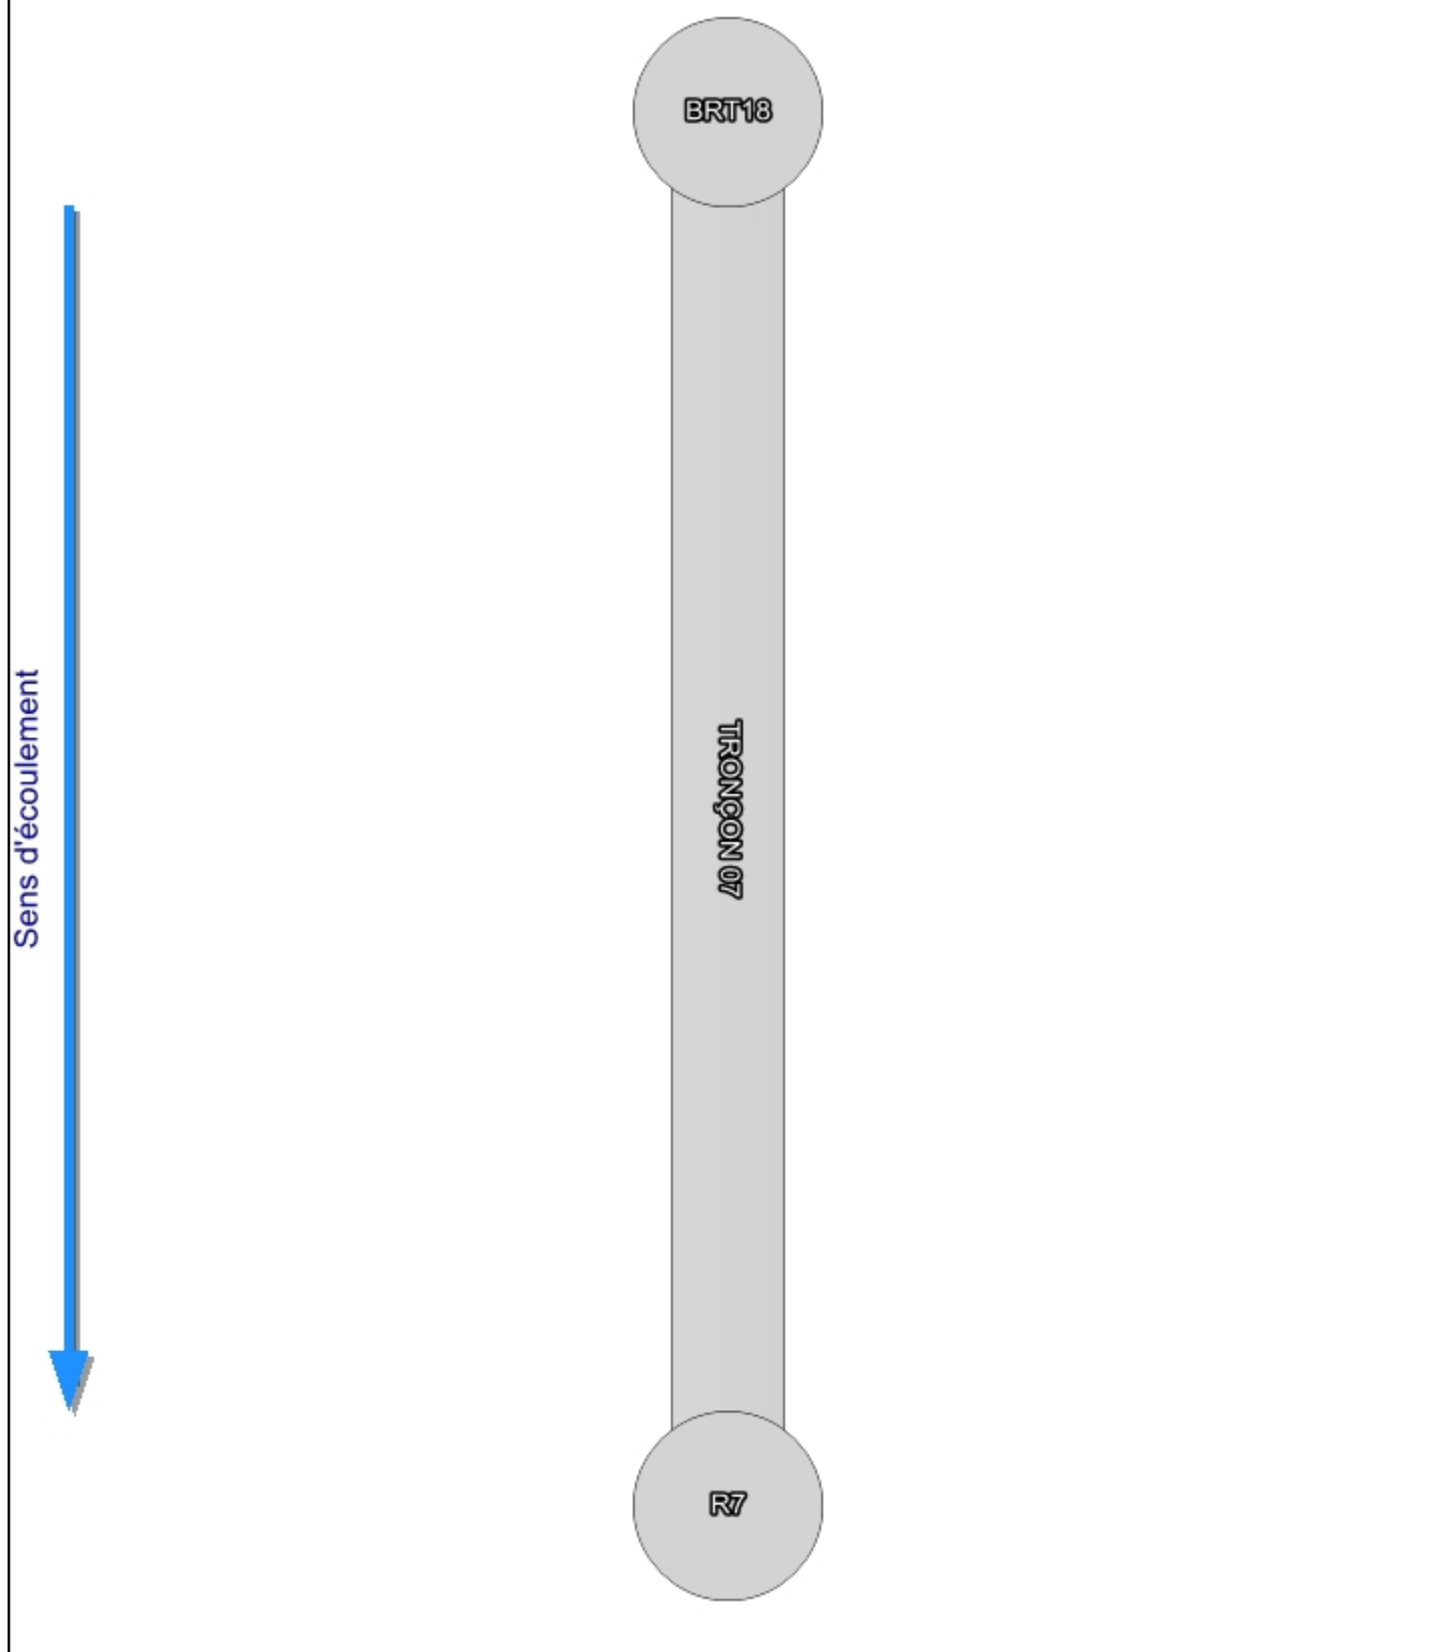

Client : MAMP	Rapport MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
Chantier : Rue Pèbre D'Ail	
Entressen	

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

Ouvrage	Longueur	Diamètre	Matériau	Nb Anomalies	Commentaire	Page
SECTION EU						
TRONÇON 01 R9 (1,4m) Vers R9B (1,5m)	5,88 m	200 mm	PVC	0		5
BR-T2 BR-T2 Vers TRONÇON 01	1,6 m	160 mm	PVC	0		12
TRONÇON 02 R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	20,94 m	200 mm	PVC	0		15
BR-T3 BR-T3 Vers TRONÇON 02	8,9 m	160 mm	PVC	0		25
BR-T4 BR-T4 Vers TRONÇON 02	21,3 m	160 mm	PVC	0		28
BR-T5 BR-T5 Vers TRONÇON 02	2,6 m	160 mm	PVC	0		31
BR-T6 BR-T6 Vers TRONÇON 02	7,9 m	160 mm		0		34
TRONÇON 03 R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	41,74 m	200 mm	PVC	0		37
BR-T7 BR-T7 Vers TRONÇON 03	2,7 m	160 mm	PVC	0		50
BR-T8 BR-T8 Vers TRONÇON 03	5,1 m	160 mm	PVC	0		53
BR-T9 BR-T9 Vers TRONÇON 03	2,3 m	160 mm	PVC	0		56
BR-T10 BR-T10 Vers TRONÇON 03	5,8 m	160 mm	PVC	0		59
BR-T11 BR-T11 Vers TRONÇON 03	2,7 m	160 mm	PVC	0		62
BR-T12 BR-T12 Vers TRONÇON 03	11,3 m	160 mm	PVC	0		65
TRONÇON 04 R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	36,28 m	200 mm	PVC	0		68
BR-T13 BR-T13 Vers TRONÇON 04	7 m	200 mm	PVC	0		80
BR-T14 BR-T14 Vers TRONÇON 04	21,8 m	200 mm	PVC	0		83
BR-T15 BR-T15 Vers TRONÇON 04	4,5 m	160 mm	PVC	0		86
BR-T16 BR-T16 Vers TRONÇON 04	1,9 m	160 mm	PVC	0		89
BR-T17 BR-T17 Vers TRONÇON 04	1,9 m	160 mm	PVC	0		92
TRONÇON 05 R9 (1,4m) Vers R10EXIST (1,4m)	1,8 m	200 mm	PVC	0		95
BR-T1 BR-T1 Vers TRONÇON 05	8,75 m	160 mm	PVC	0		101
TRONÇON 06 R7 (1,3m) Vers BRT18 (0,0m)	10,35 m	200 mm	PVC	0		104

Client : MAMP
Chantier :
Rue Pèbre D'Ail
Entressen

Rapport
MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS						
Ouvrage	Longueur	Diamètre	Matériau	Nb Anomalies	Commentaire	Page
BR-T19 BR-T19 Vers TRONÇON 06	4,2 m	160 mm	PVC	0		109
TRONÇON 07 BRT18 Vers R7	15,25 m	160 mm	PVC	0		112
Synthèse						

Client	:	MAMP	Rapport MAMP Père D'Ail Entressen 021220 I <
--------	---	------	--

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

SECTION EU

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 01 R9 (1,4m) Vers R9B (1,5m)	200	5,88 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 9908.jpg <i>Départ de l'inspection</i>
0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R9 9922.jpg <i>Liaison regard - canalisation</i>
3,03 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T2 Position: 03H 9904.jpg, 9905.jpg 00:00:22 3360.avi
5,58 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R9B 9906.jpg 00:01:09 3360.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
5,88 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 9907.jpg 00:01:37 3360.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T2 BR-T2 Vers TRONÇON 01	160	1,6 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T2 <i>Départ de l'inspection</i>
1,60 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8323.jpg 00:00:15 FormatFactoryT20201202121956.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 02 R9B (1,5m) Vers R8 (1,4m)	200	20,94 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 9910.jpg <i>Départ de l'inspection</i>
0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R9B 9911.jpg <i>Liaison regard - canalisation</i>
7,14 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T3 Position: 03H 9912.jpg, 9913.jpg 00:01:14 3361.avi
8,53 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T4 Position: 09H 9914.jpg, 9915.jpg 00:02:09 3361.avi

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Page 118 / 124

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

18,34 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T5 Position: 03H 9916.jpg, 9917.jpg 00:03:36 3361.avi
20,01 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T6 Position: 09H 9918.jpg, 9919.jpg 00:04:23 3361.avi
20,64 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R8 9920.jpg 00:05:01 3361.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
20,94 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 9921.jpg 00:05:28 3361.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T3	160	8,9 m		
BR-T3 Vers TRONÇON 02				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T3 <i>Départ de l'inspection</i>		
	8,90 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8325.jpg 00:00:46 FormatFactoryT20201202122138.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T4	160	21,3 m	eaux usées	
BR-T4 Vers TRONÇON 02				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T4 <i>Départ de l'inspection</i>		
	21,30 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8327.jpg 00:03:59 FormatFactoryT20201202122425.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T5	160	2,6 m		
BR-T5 Vers TRONÇON 02				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T5 <i>Départ de l'inspection</i>		
	2,60 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8333.jpg 00:00:15 FormatFactoryT20201202123301.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T6	160	7,9 m	eaux usées	
BR-T6 Vers TRONÇON 02				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T6 <i>Départ de l'inspection</i>		

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

7,90 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
8331.jpg
00:00:42 FormatFactoryT20201202123110.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 03 R8 (1,4m) Vers R7 (1,3m)	200	41,74 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 9923.jpg <i>Départ de l'inspection</i>
0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R8 9924.jpg <i>Liaison regard - canalisation</i>
3,39 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T7 Position: 03H 9925.jpg, 9926.jpg 00:00:29 3362.avi
9,68 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T8 Position: 09H 9927.jpg, 9928.jpg 00:01:34 3362.avi
10,61 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T9 Position: 03H 9929.jpg, 9930.jpg 00:02:06 3362.avi
15,32 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T10 Position: 03H 9931.jpg, 9932.jpg 00:03:03 3362.avi
24,72 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T11 Position: 09H 9933.jpg, 9934.jpg 00:04:15 3362.avi
33,05 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T12 Position: 03H 9935.jpg, 9936.jpg 00:05:33 3362.avi
41,44 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R7 9937.jpg 00:06:53 3362.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
41,74 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 9938.jpg 00:07:33 3362.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T7 BR-T7 Vers TRONÇON 03	160	2,7 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T7 <i>Départ de l'inspection</i>
2,70 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8335.jpg 00:00:20 FormatFactoryT20201202123451.avi

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS				
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T8 BR-T8 Vers TRONÇON 03	160	5,1 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T8 <i>Départ de l'inspection</i>		
	5,10 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8337.jpg 00:00:57 FormatFactoryT20201202123610.avi		
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T9 BR-T9 Vers TRONÇON 03	160	2,3 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T9 <i>Départ de l'inspection</i>		
	2,30 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8339.jpg 00:00:21 FormatFactoryT20201202123756.avi		
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T10 BR-T10 Vers TRONÇON 03	160	5,8 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T10 <i>Départ de l'inspection</i>		
	5,80 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8341.jpg 00:00:39 FormatFactoryT20201202123948.avi		
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T11 BR-T11 Vers TRONÇON 03	160	2,7 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T11 <i>Départ de l'inspection</i>		
	2,70 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8383.jpg 00:00:20 FormatFactoryT20201202123946 -.avi		
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T12 BR-T12 Vers TRONÇON 03	160	11,3 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T12 <i>Départ de l'inspection</i>		
	11,30 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8381.jpg 00:00:41 FormatFactoryT20201202124139.avi		
Client : MAMP			Rapport	
Chantier :			MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I	
Rue Pèbre D'Ail				
Entressen			Page 121 / 124	

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 04 R7 (1,3m) Vers R6 (1,2m)	200	36,28 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 9939.jpg <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R7 9940.jpg <i>Liaison regard - canalisation</i>		
	7,97 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T13 Position: 03H 9941.jpg, 9942.jpg 00:01:02 3363.avi		
	11,66 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T14 Position: 09H 9943.jpg, 9944.jpg 00:02:00 3363.avi		
	30,45 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T15 Position: 09H 9945.jpg, 9946.jpg 00:04:07 3363.avi		
	30,81 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T16 Position: 03H 9947.jpg, 9948.jpg 00:04:47 3363.avi		
	34,17 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T17 Position: 03H 9949.jpg, 9950.jpg 00:05:42 3363.avi		
	35,98 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R6 9951.jpg 00:06:23 3363.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>		
	36,28 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 9952.jpg 00:06:57 3363.avi <i>Fin de l'inspection</i>		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T13 BR-T13 Vers TRONÇON 04	200	7 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T13 <i>Départ de l'inspection</i>		
	7,00 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8385.jpg 00:00:30 FormatFactoryT20201202124421.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T14 BR-T14 Vers TRONÇON 04	200	21,8 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T14 <i>Départ de l'inspection</i>		

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Page 122 / 124

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

9,40 m (BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H
8389.jpg
00:01:46 FormatFactoryT20201202124643.avi

21,80 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
8387.jpg
00:04:00 FormatFactoryT20201202124643.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T15	160	4,5 m	eaux usées	
BR-T15 Vers TRONÇON 04				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T15 <i>Départ de l'inspection</i>
4,50 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8391.jpg 00:00:32 FormatFactoryT20201202125257.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T16	160	1,9 m	eaux usées	
BR-T16 Vers TRONÇON 04				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T16 <i>Départ de l'inspection</i>
1,90 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8393.jpg 00:00:17 FormatFactoryT20201202125519.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T17	160	1,9 m	eaux usées	
BR-T17 Vers TRONÇON 04				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T17 <i>Départ de l'inspection</i>
1,90 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8395.jpg 00:00:13 FormatFactoryT20201202125810.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 05	200	1,8 m	eaux usées	
R9 (1,4m) Vers R10EXIST (1,4m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 9953.jpg <i>Départ de l'inspection</i>
0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R9 9954.jpg <i>Liaison regard - canalisation</i>
1,66 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T1 Position: 03H 9955.jpg, 9956.jpg 00:00:22 3364.avi

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

1,80 m (BDC.Z.C) INSPECTION ABANDONNÉE autre l'inspection de la conduite totale est terminée.
9957.jpg
00:00:55 3364.avi
Raccordement sur existant

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T1 BR-T1 Vers TRONÇON 05	160	8,75 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

0,00 m (BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T1
Départ de l'inspection

8,75 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
8321.jpg
00:01:33 FormatFactoryT20201202121720.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 06 R7 (1,3m) Vers BRT18 (0,0m)	200	10,35 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

0,00 m (BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R7
9958.jpg
Départ de l'inspection

10,04 m (BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T19 Position: 09H
9959.jpg
00:01:01 3365.avi

10,35 m (BDC.Z.D) INSPECTION ABANDONNÉE autre l'inspection de la conduite totale n'est pas terminée.
(AEC.A) CHANGEMENT - SECTION TRANSVERSALE circulaire Quantification: 160 mm
9960.jpg
00:01:35 3365.avi
Reprise en sens inverse

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T19 BR-T19 Vers TRONÇON 06	160	4,2 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

0,00 m (BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T19
Départ de l'inspection

4,20 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
8397.jpg
00:00:18 FormatFactoryT20201202132053.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 07 BRT18 Vers R7	160	15,25 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

0,00 m (BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT18
Départ de l'inspection

15,25 m (BDC.Z.C) INSPECTION ABANDONNÉE autre l'inspection de la conduite totale est terminée.
8399.jpg
00:01:14 FormatFactoryT20201202131637.avi

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue Pèbre D'Ail Entressen	MAMP Pèbre D'Ail Entressen 021220 I
	Page 124 / 124
