




Plan Pluriannuel de Restauration des Milieux Aquatiques du bassin versant de l'Agly 2022 - 2027

Bilan des travaux de l'année 3 **2024-2025**

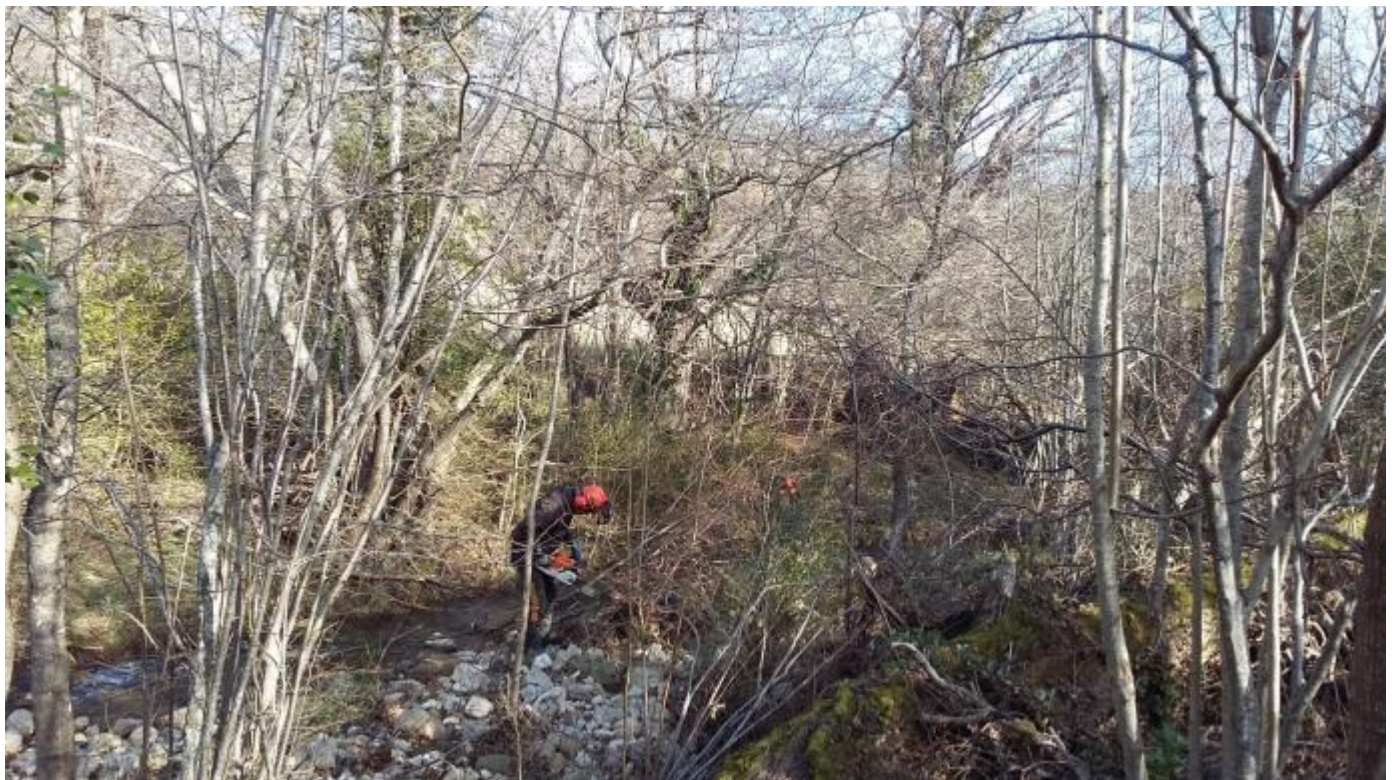

Sommaire

1.	Présentation des chantiers	3
2.	Préparation et suivi des chantiers	4
	• Dossier de déclaration d'Intérêt Général et Déclaration loi sur l'Eau.....	4
	• Non Intervention Controlée (NIC)	4
	• Contact avec les propriétaires.....	4
	• Consultation des entreprises.....	5
	• Autres préparatifs	5
	• Suivi des chantiers.....	6
	• Communication	6
3.	Description des travaux réalisés	7
	• NIC	8
4.	Bilan des travaux.....	8

ANNEXE : Cartographie et photos des chantiers

Ce rapport présente le bilan des chantiers du SMBVA (coût, contenu des chantiers ...) effectués dans le cadre de la troisième année de travaux du Plan Pluriannuel de Restauration des milieux aquatiques du bassin versant de l'Agly 2022-2027.

1. Présentation des chantiers


Le SMBVA a mis en œuvre la seconde année de travaux de son programme d'actions en 2024-2025.

Ce programme prévoit différentes catégories de travaux :

- Travaux sur la végétation des berges : abattages sélectifs, débroussaillages ponctuels, gestion des embâcles.
- Des interventions ponctuelles, appelées NIC ou Non Interventions Controlées,
- Travaux de traitement des atterrissements dans l'objectif de favoriser la remobilisation des sédiments et permettre le transport solide

Ainsi, le SMBVA a mené cette année :

- 23 chantiers de restauration de ripisylve ou de traitement d'atterrissements
- 7 chantiers d'intervention ponctuelle (NIC),

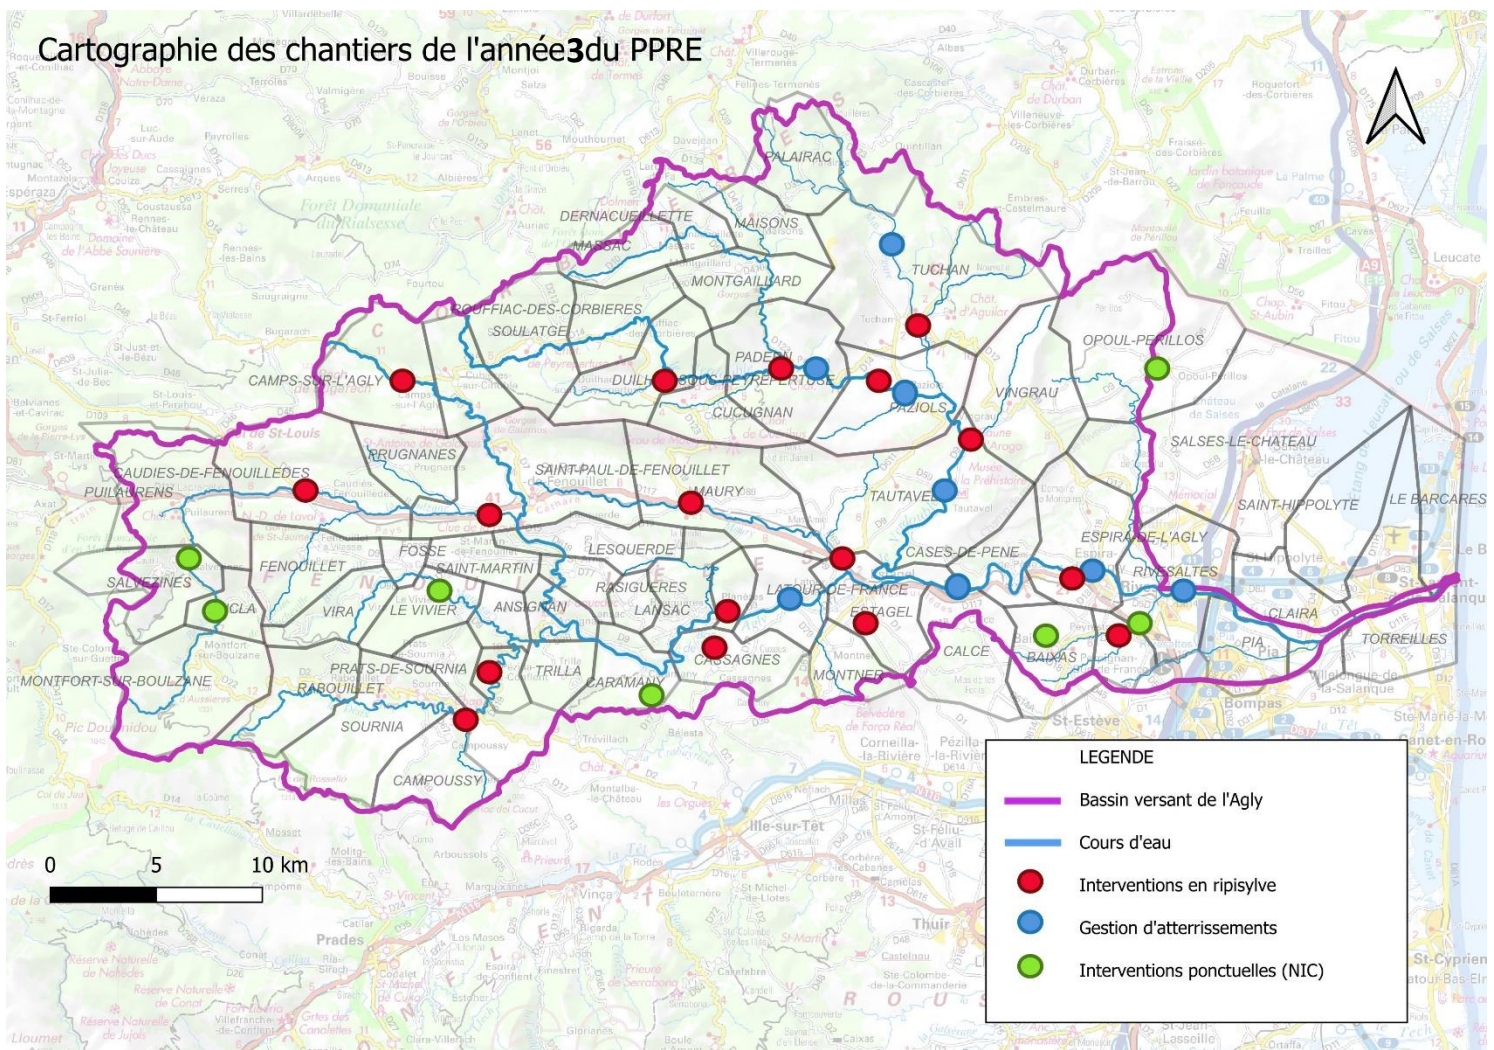

2. Préparation et suivi des chantiers

- [Dossier de déclaration d'Intérêt Général et Déclaration loi sur l'Eau](#)

Un dossier de Déclaration d'Intérêt Général et de Déclaration loi sur l'Eau a été déposé en 2022 à la DDTM des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en juin 2022. Cette DIG permet de réaliser les travaux du plan pluriannuel jusqu'en 2027 sans avoir à faire des DIG ponctuelles pour chaque chantier.


De plus, des dossiers de déclaration loi sur l'eau (DICTR) ont été adressés pour différents chantiers à la DDTM des Pyrénées Orientales.

- [Non Intervention Contrôlée \(NIC\)](#)

Outre les chantiers définis dans la programmation du plan pluriannuel, des travaux en non-intervention contrôlée ont été réalisés. Ces opérations visent à intervenir rapidement sur des problèmes ponctuels. Les communes du bassin versant ont été consultées par courrier à ce propos, en amont de la période de travaux. Parmi les communes qui ont répondu, les travaux paraissant les plus urgents ont été sélectionnés. Le choix s'est ainsi porté sur 7 communes : Salvezines, Gincla, Caramany, Baixas, Rivesaltes, Opoul et Périllos et Le Vivier.

- [Contact avec les propriétaires](#)

Les adresses de chacun des propriétaires des parcelles concernées par les travaux ont été collectées directement via le cadastre fourni par OPENIG. Une convention leur a ensuite été envoyée afin de savoir s'ils autoriseraient les travaux et s'ils souhaitaient ou non garder le bois à l'issue de ces travaux. Au retour des conventions signées, les réponses ont été classées dans un tableur et cartographiées sous SIG.

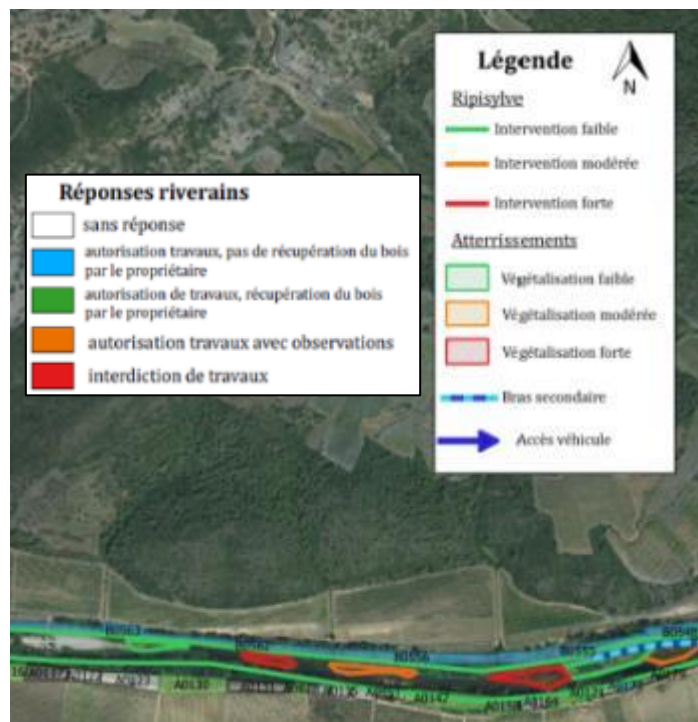

Cartographie des autorisations d'accès aux parcelles

- Consultation des entreprises

Un accord cadre a été publié pour la réalisation des travaux du PPR. Cet accord cadre divise la prestation en 3 lots différents en fonction de la typologie des travaux et de leur répartition géographique. Cet accord cadre est passé pour la durée du reste du programme à savoir 4 ans. Une commission MAPA a été organisée pour l’attribution du marché.

- Les lots 1 et 3, qui portaient sur les travaux à réaliser sur l’Aude et l’aval du bassin versant et portaient aussi bien sur des travaux manuels que mécaniques, ont été attribués à l’entreprise ARF.
- Le lot 2 qui correspond aux travaux à réaliser sur l’amont du bassin versant, avec des travaux manuels, a été attribué à l’entreprise ROCA.

- Autres préparatifs

Au-delà des éléments exposés ci-dessus, les préparatifs associés à la réalisation des travaux de l’année 3 ont requis un travail de terrain afin de définir précisément la nature des travaux à réaliser et réaliser les marquages nécessaires.

Des demandes de subvention pour financer le projet ont été réalisées auprès des organismes suivants : Agence de l’Eau, Région et Département de l’Aude.

Par ailleurs, avant chaque chantier, des déclarations de travaux ont été effectuées auprès des gestionnaires de réseaux concernés.

Des panneaux de chantier ont été imprimés et affichés sur les sites durant les travaux.



Exemples de panneaux de chantier

- Suivi des chantiers

Avant les travaux, les chantiers ont été marqués. Chaque chantier a fait l'objet de plusieurs visites de terrain pour suivre l'avancée des travaux et appréhender les difficultés éventuellement rencontrées par les entreprises durant le chantier (accès, relation propriétaires, ...).

Des réunions de chantiers ont été organisées. Les services de l'Etat et un représentant de la commune concernée étaient systématiquement conviés. Une réception des travaux était organisée à la fin de chaque chantier.

- Communication

Tout au long de la phase de travaux, le syndicat a communiqué sur les chantiers via son site Internet et sa page Facebook.



Extrait d'article Facebook

3. Description des travaux réalisés

COURS D'EAU	COMMUNE	OBJECTIFS	ACTION	LINEAIRE DE COURS D'EAU CONCERNE (ML)	SURFACE D'ATTERDISSEMENT CONCERNE (m ²)	MONTANT (EUROS HT)	NUMERO DE BON DE COMMANDE	PERIODE D'INTERVENTION	ENTREPRISE CHARGEE DU CHANTIER	SECTEUR D'INTERVENTION	COMMENTAIRE
Agly	Camps-sur-l'Agly	Favoriser la biodiversité, Faciliter les écoulements	Abattage sélectif	700		1244,2	BDC3 et 8 LOT1	novembre 2024	SARL ARF	Agly et affluent en contrebas du village	
Rec de Riben	Duilhac-sous-Peyrepertuse	Limiter la formation d'embâcles et favoriser les habitats	Abattage sélectif, débroussaillage	1500		3704	BDC4 LOT1	janvier 2025	SARL ARF	secteur amont de la confluence avec le Verdoube	
Verdoube et Torgan	Padern	Faciliter les écoulements, favoriser les habitats et le transport solide	Abattage sélectif, débroussaillage, traitement d'atterdissement	1600	3650	7022,5	BDC5 LOT1	février à mars 2025	SARL ARF	Traversée et aval du village	
Verdoube et ruisseau de la Coume	Paziols	Faciliter les écoulements, favoriser les habitats et le transport solide	Abattage sélectif, débroussaillage, traitement d'atterdissement	1650	3050	5668,2	BDC2 LOT1	mars 2025	SARL ARF	amont et traversée du village	
Ruisseau du Noyer et Petit Verdoube	Tuchan	Faciliter les écoulements, favoriser les habitats et le transport solide	Abattage sélectif, débroussaillage, traitement d'atterdissement	3700	6600	13098,4	BDC6 LOT1	février à avril 2025	SARL ARF	amont et traversée du village	
Boulzane	Caudiès-de-Fenouillèdes	Favoriser la biodiversité, Faciliter les écoulements	Abattage sélectif, débroussaillage	350		1750	BDC6 LOT2	novembre 2024	SARL ROCA	traversée du village	
Boucheville	Fosse										Ce secteur n'a pas fait l'objet d'une intervention car la prospection de terrain préalable au chantier a révélé le bon état du cours d'eau et de ses berges
Désix	Pezilla-de-Conflent	Favoriser la biodiversité, Faciliter les écoulements	Abattage sélectif, débroussaillage	650		2605	BDC7 LOT2	octobre 2024	SARL ROCA	traversée du village	
Désix	Sournia	Favoriser la biodiversité, Faciliter les écoulements	Abattage sélectif, débroussaillage	150		2033	BDC11 et 12 LOT2	octobre 2024	SARL ROCA	Pont romain, route RD 619	
Boulzane	Saint-Paul-de-Fenouillet	Favoriser la biodiversité, Faciliter les écoulements, limiter le risque d'embâcles	Abattage sélectif	2000		6292	BDC5 LOT2	octobre 2024	SARL ROCA	amont confluence avec l'Agly	L'intervention prévue initialement sur le secteur de l'Agly n'a pas eu lieu car la prospection de terrain préalable au chantier a révélé le bon état du cours d'eau et de ses berges
Rec de Vira	Vira										Ce secteur n'a pas fait l'objet d'une intervention car la prospection de terrain préalable au chantier a révélé le bon état du cours d'eau et de ses berges
Agly	Cases-de-Pène	Favoriser le transport sédimentaire	Abattage sélectif, traitement d'atterdissement	400	2500	1082	BDC 14 LOT3	mars 2025	SARL ARF	Secteur mas de Jau	L'entreprise a pris du retard sur le chantier et n'a pas pu l'assurer dans sa totalité avant la fin de la période réglementaire. L'intervention est reportée lors de la prochaine campagne de travaux
Ruisseau	Cassagnes	Faciliter les écoulements, favoriser les habitats	Abattage sélectif, débroussaillage	1450		3729	BDC13 et 27 LOT3	octobre et novembre 2024	SARL ARF	Traversée et aval du village	
Agly	Espira-de-l'Agly	Faciliter les écoulements, limiter le risque d'embâcles et favoriser le transport sédimentaire	Abattage sélectif, traitement d'atterdissement	2000	33200	55001,6	BDC 15 et 25 LOT3	janvier et février 2025	SARL ARF	amont et traversée du village	
Uinas	Estagel	Faciliter les écoulements, favoriser les habitats	Abattage sélectif, débroussaillage	1450		1330	BDC 17 LOT3	septembre 2024	SARL ARF	amont de la station AEP	
Agly	Estagel	Faciliter les écoulements, limiter le risque d'embâcle	Abattage sélectif	450		1155	BDC 12 LOT3	décembre 2024	SARL ARF	Amont de la traversée du village	
Agly	Latour-de-France	Favoriser le transport sédimentaire et limiter le risque d'embâcles	Abattage sélectif, débroussaillage, traitement d'atterdissement	2000	1550	4449	BDC 18 LOT3	février et mars 2025	SARL ARF	traversée du village	L'entreprise a pris du retard sur le chantier et n'a pas pu l'assurer dans sa totalité avant la fin de la période réglementaire. L'intervention est reportée lors de la prochaine campagne de travaux
Maury	Maury	Faciliter les écoulements, limiter le risque d'embâcle	débroussaillage, abattage sélectif	1250		3980	BDC 23 LOT3	janvier 2025	SARL ARF	traversée du village	
Maury	Maury et Estagel	Faciliter les écoulements, favoriser les habitats	Abattage sélectif	1300		7413,48	BDC 9 LOT3	septembre 2024	SARL ARF	Confluence Agly-Maury	
Correçs	Peyrestortes	Faciliter les écoulements, favoriser les habitats	Abattage sélectif, débroussaillage, desemâcllement	2350		4091	BDC 11 et 26 LOT3	septembre 2024	SARL ARF	traversée du village	
Agly et ruisseau Cassagnes	Planèzes	favoriser le transport sédimentaire et les habitats	Abattage sélectif, traitement d'atterdissement	1000	2600	4646	BDC 19 LOT3	mars et avril 2025	SARL ARF	Traversée et aval du village	
Agly	Rivesaltes	Favoriser le transport sédimentaire et limiter le risque d'embâcles	Abattage sélectif et traitement d'atterdissement	2900	24100			septembre à décembre 2024	SARL ARF	Traversée du village	
Llobère	Rivesaltes	Faciliter les écoulements et favoriser les habitats	débroussaillage	600		50850	BDC 16 et 24 LOT3	septembre 2024	SARL ARF	Traversée du village	
Roboul	Rivesaltes	Faciliter les écoulements et favoriser les habitats	Abattage sélectif, débroussaillage	310				septembre 2024	SARL ARF	Traversée du village	
Verdoube, ruisseaux de Vingrau et Coumija	Tautavel	Faciliter les écoulements, limiter le risque d'embâcles et favoriser le transport sédimentaire	Abattage sélectif, débroussaillage, traitement d'atterdissement	1400	6500	3698,4	BDC 10 LOT3	février 2025	SARL ARF	Site des Goulerous et traversée du village	
Agouilles	Salses-le-Château										Cette commune a intégré le SMBVA en 2025. L'intégration de ce territoire ayant mis plus de temps que prévu, l'intervention n'a pas pu être réalisée et sera programmée lors de la campagne suivante
	Cucugnan, Caramany, Salvezines, Gincla, Le Vivier, Rivesaltes, Baixas, Opoul-Perillos	Non interventions contrôlées (NIC)	Interventions ponctuelles d'abattage sélectif, débroussaillage ou enlèvement d'embâcles	3850		10845	BDC7 LOT1 BDC 8, 9, 10, 13 LOT2 BDC 20, 21, 28 LOT3	septembre 2024 à mars 2025	SARL ARF et ROCA		Cucugnan (780 ml), Caramany (740 ml), Salvezines, Gincla (1070ml), Le Vivier (210 ml), Baixas (370ml), Opoul-Perillos (680ml), Rivesaltes
			TOTAL	35010	83750	195687,78					

La cartographie et des photos de chaque chantier sont présentées en annexe

- **NIC**

Les chantiers réalisés, correspondant aux NIC, sont les suivants :

- Le Verdoble à Cucugnan : abattage d'arbres en travers du cours d'eau et menaçants et débroussaillage d'un atterrissement végétalisé à proximité d'un gué
- La Boulzane à Gincla et Salvezines : abattage d'arbres en travers du cours d'eau et menaçants et enlèvement d'embacles,
- Ruisseau au Vivier : abattages ponctuels d'arbres en travers et débroussaillage du lit fermé par la végétation,
- Rec des Amandiers à Baixas : débroussaillage et abattages ponctuels dans le ruisseau fermé par la végétation,
- Ruisseaux d'Opoul et Perillos : débroussaillage et abattages ponctuels dans le ruisseau fermé par la végétation,
- Les ruisseaux de Caramany : abattages ponctuels d'arbres en travers et débroussaillage du lit fermé par la végétation,
- La Llobère à Rivesaltes : Desembâchement d'un aqueduc suite à une crue

4. Bilan des travaux

Les travaux mis en œuvre dans le cadre de la troisième année du PPR 2022-2027 ont permis d'intervenir sur 35 km de cours d'eau au droit d'une vingtaine de chantiers. Des opérations d'abattages sélectifs, de débroussaillage, de desembâchement et de scarification d'atterrissement ont ainsi été réalisées.


Pour cette campagne de travaux, les interventions ont été adaptées au contexte de sécheresse connu par le territoire depuis plusieurs années qui a provoqué une mortalité exceptionnelle d'arbres dans la ripisylve. Si tout le territoire a été impacté, c'est en particulier l'aval du bassin versant qui est le plus touché. Par ailleurs, la baisse des débits, voire les assecs de certains cours d'eau prolongés, ont favorisé l'implantation de végétation dans le lit des cours d'eau ce qui a contribué à la fermeture du milieu.

Par ailleurs, certains chantiers n'ont pas pu être achevés suite au retard pris par les entreprises. Les interventions seront donc reportées lors de la prochaine campagne du programme.


L'année 2025 marquera le démarrage de la quatrième année de travaux portée par le SMBVA dans le cadre de son plan pluriannuel de travaux 2022 - 2027.

ANNEXE : Cartographies et photos des chantiers

○ Chantiers de l'Agly à Camps-sur-l'Agly

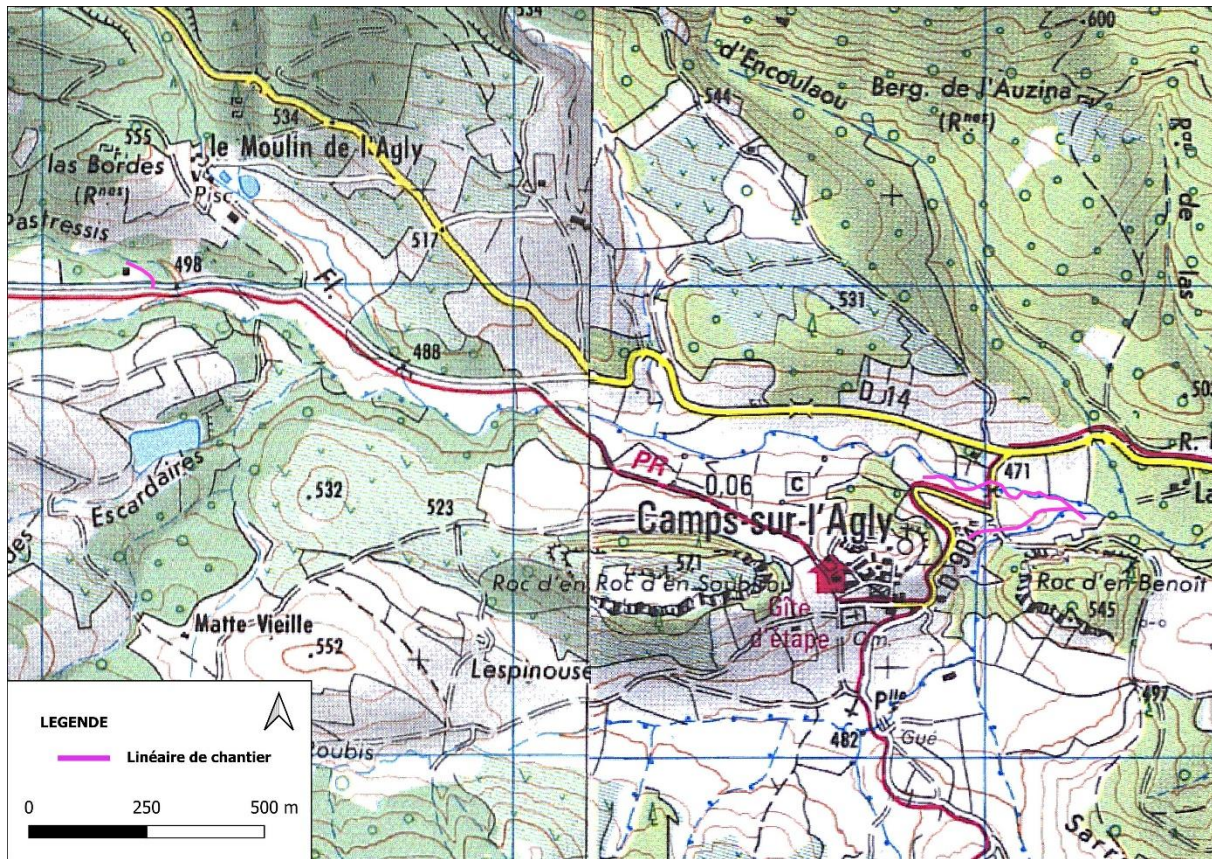


Cartographie du linéaire de chantier

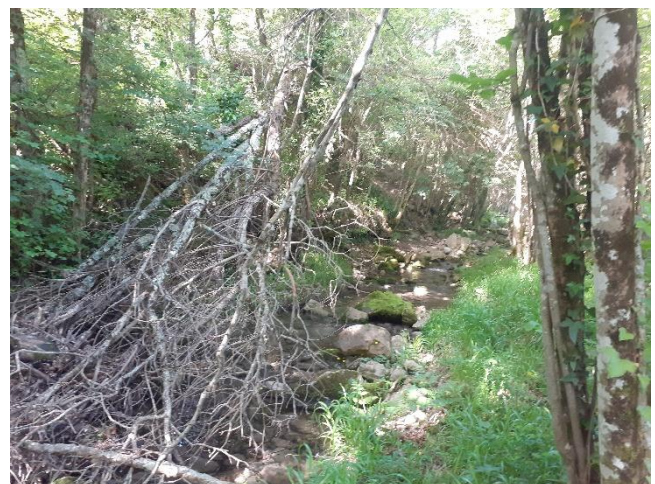

Photographies avant et après travaux

○ Chantier du Rec de Riben à Duilhac-sous-Peyrepertuse

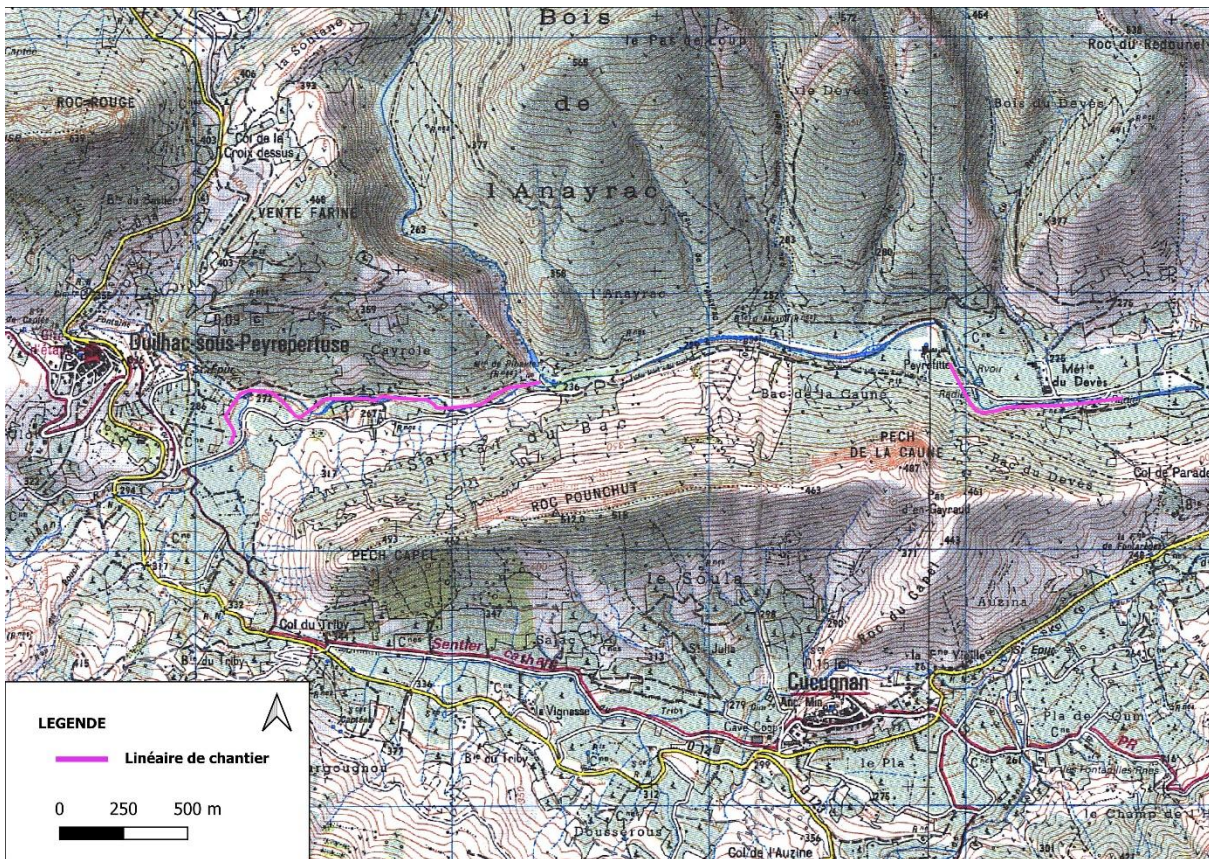


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantiers du Verdoble et du Torgan à Padern

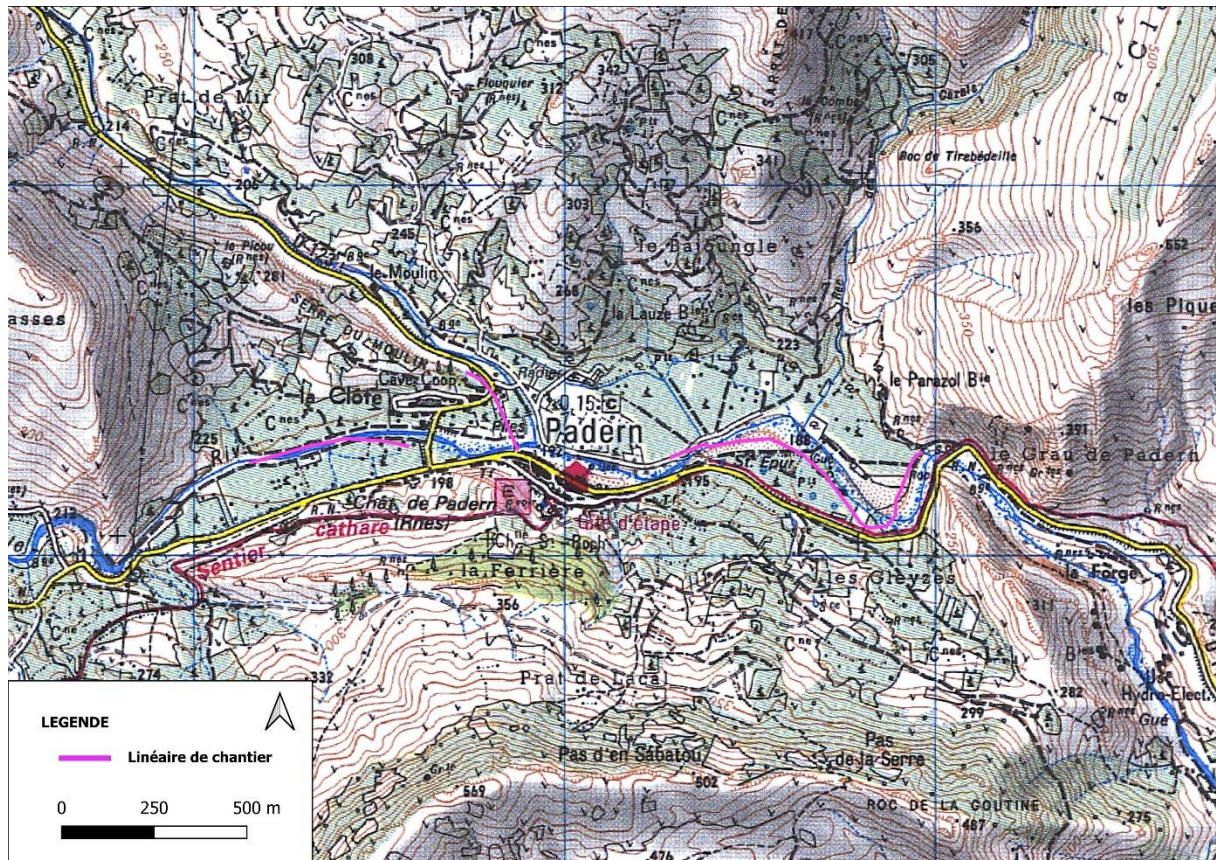


Cartographie du linière de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier du Verdoble et ruisseau de la Coume à Paziols

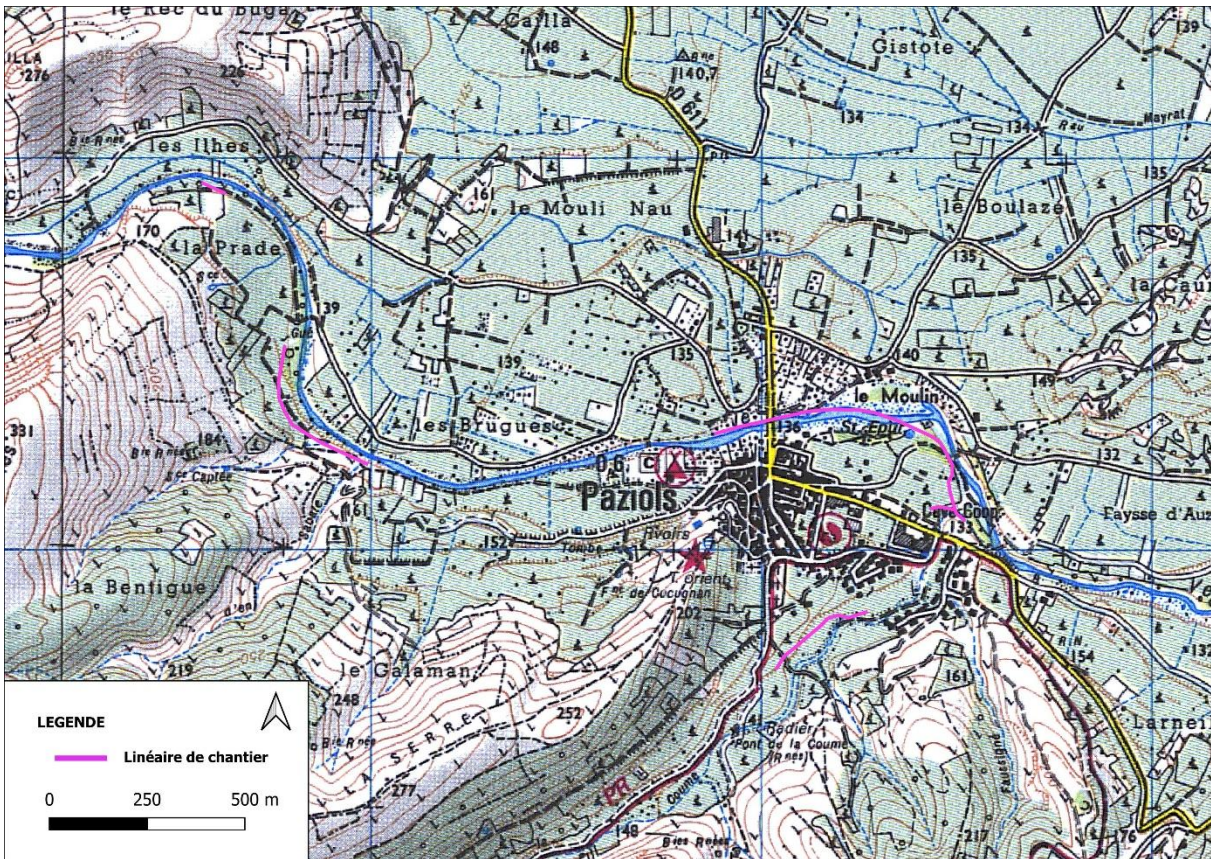


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier du ruisseau du Noyer et du Petit Verdoble

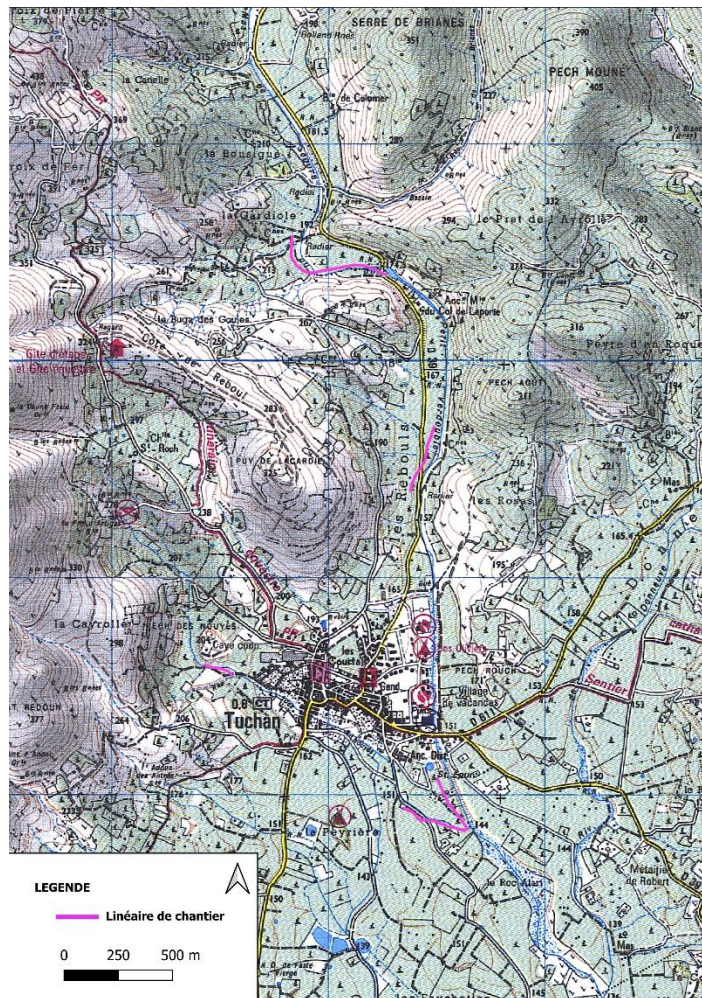


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier de la Boulzane à Caudiès-de-Fenouillèdes

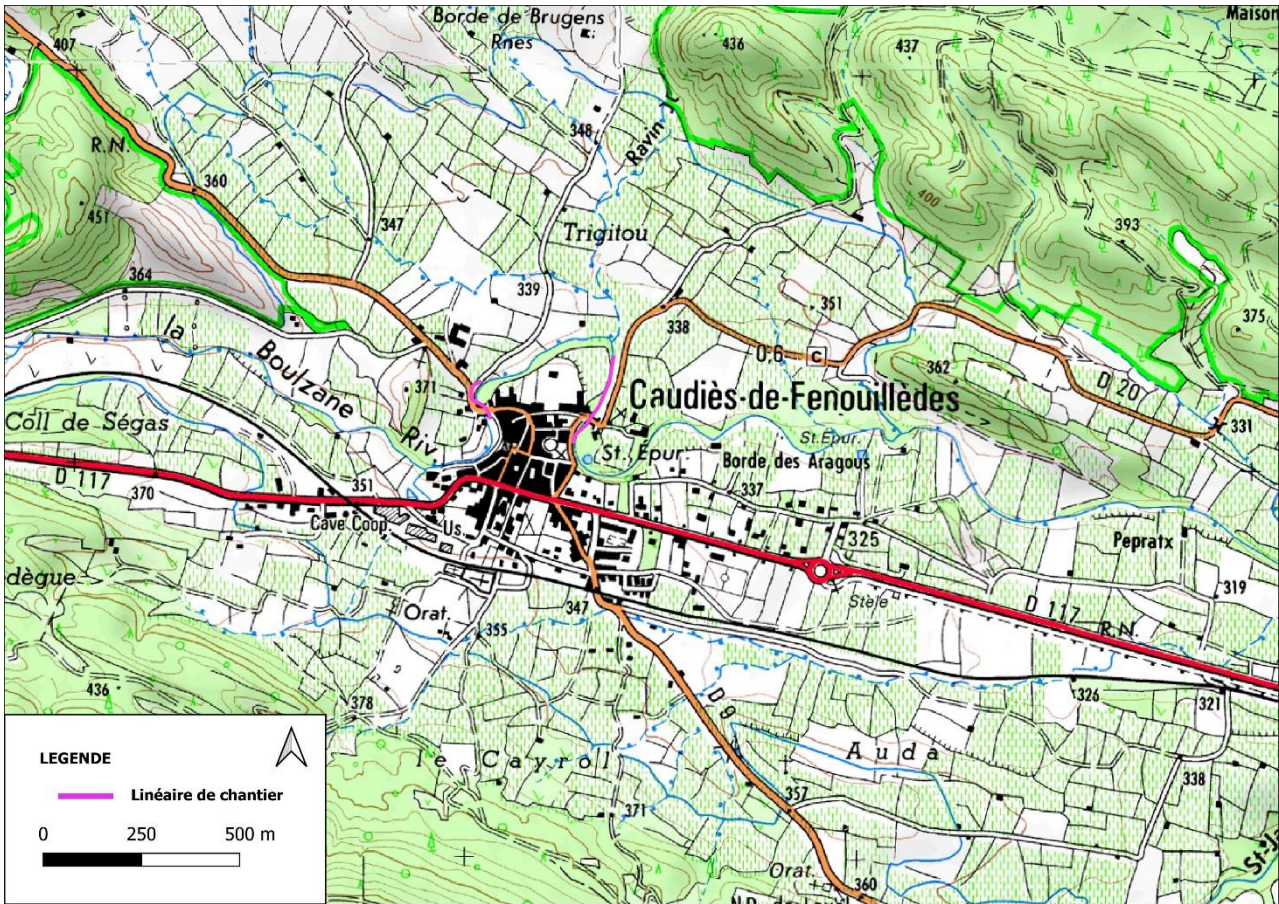


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier de la Désix à Pézilla-de-Conflent

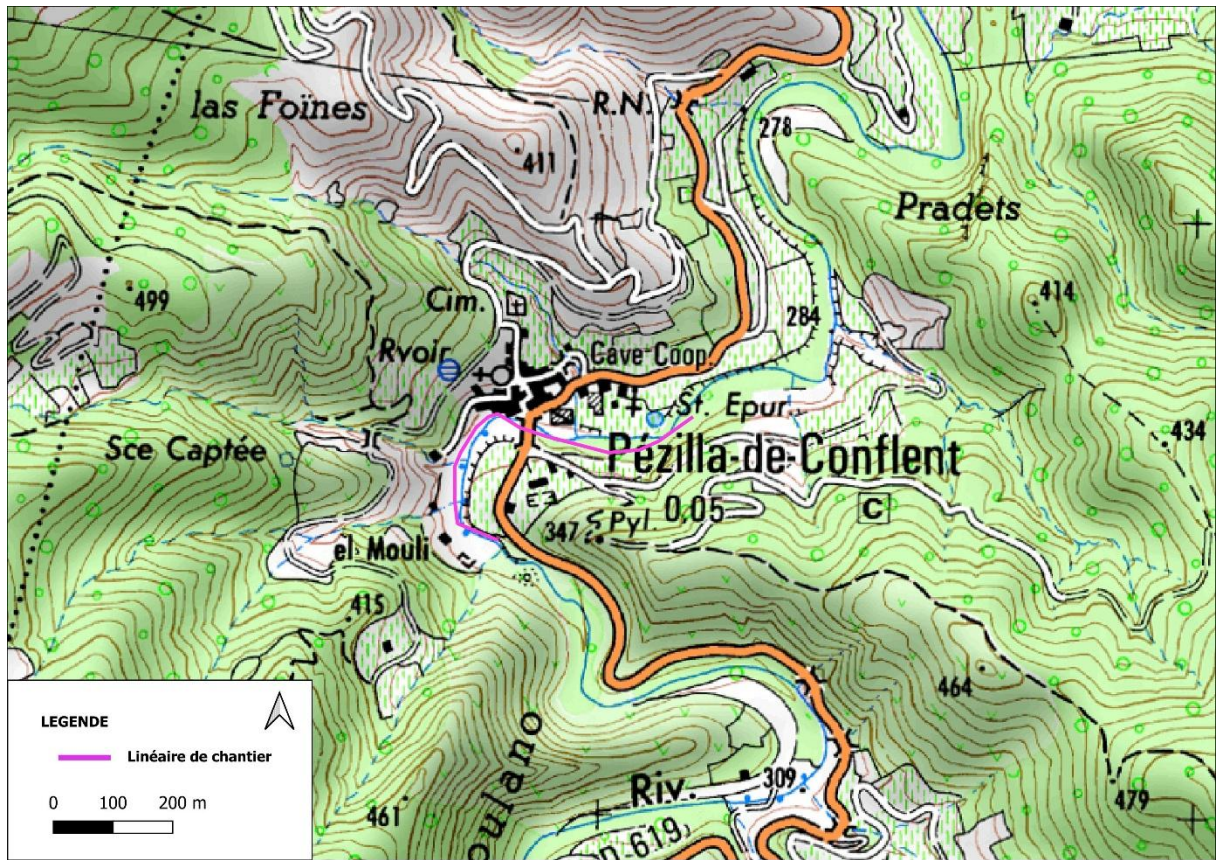


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier de la Désix à Sournia

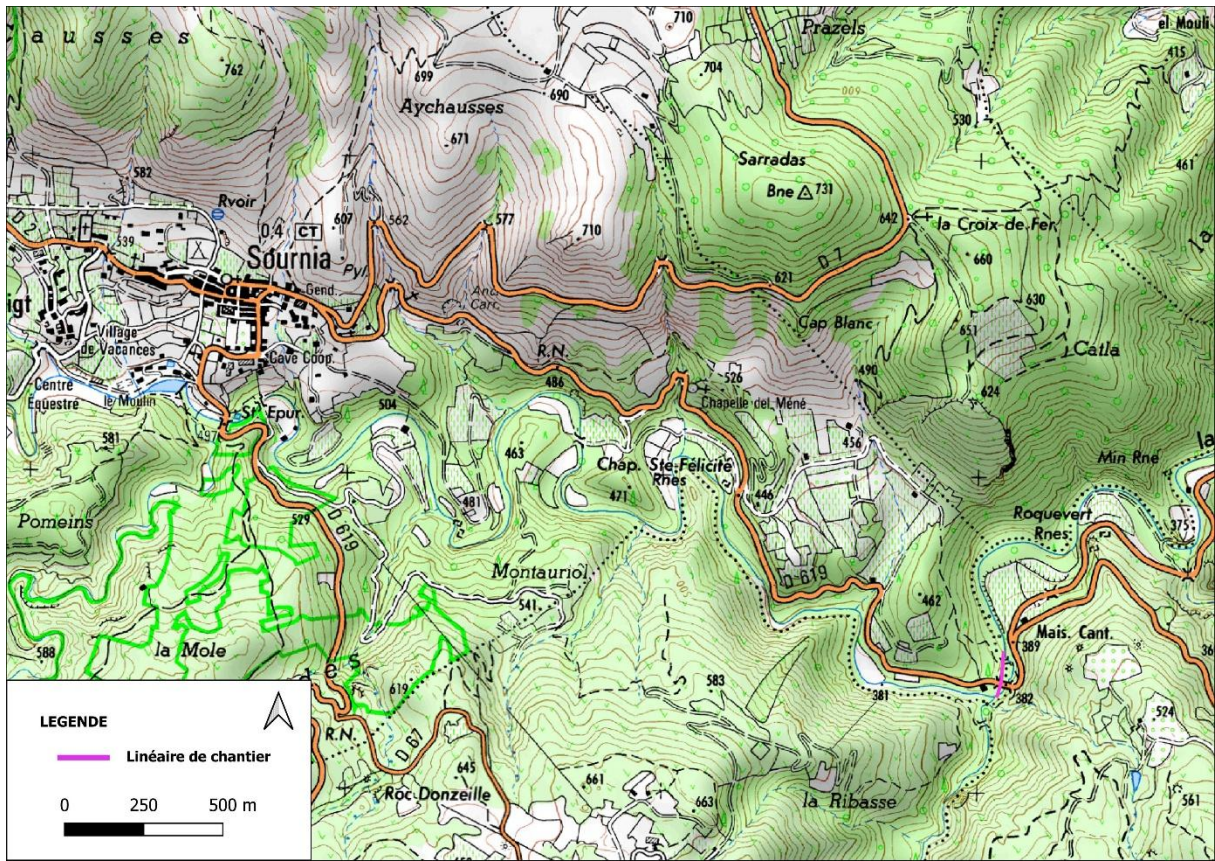


Cartographie du linéaire de chantier




Photographies avant et après travaux

○ Chantier de la Boulzane à Saint-Paul-de-Fenouillet

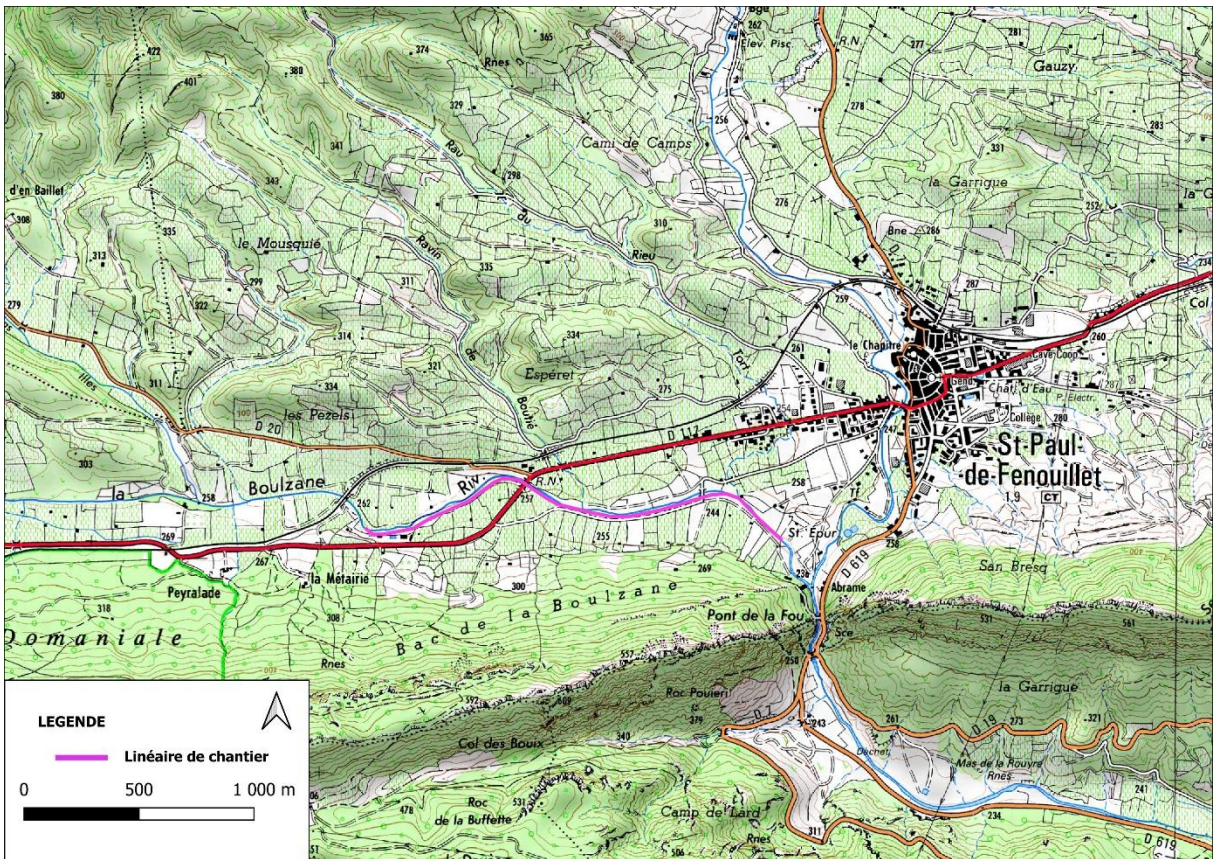


Cartographie du linéaire de chantier

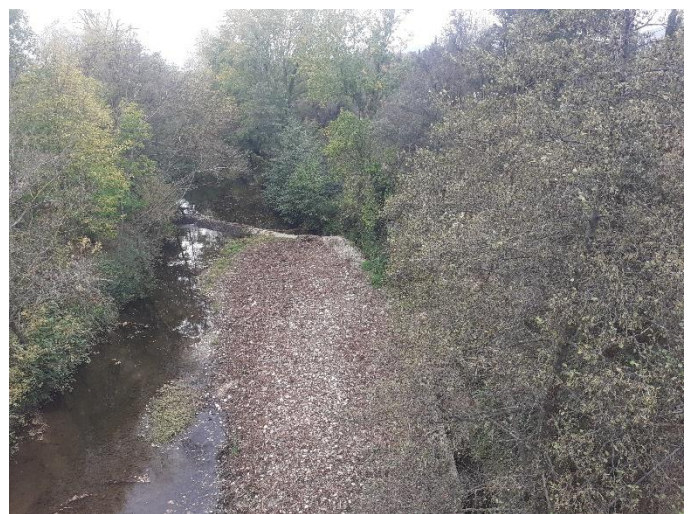

Photographies avant et après travaux

○ Chantier de l'Agly à Cases-de-Pène

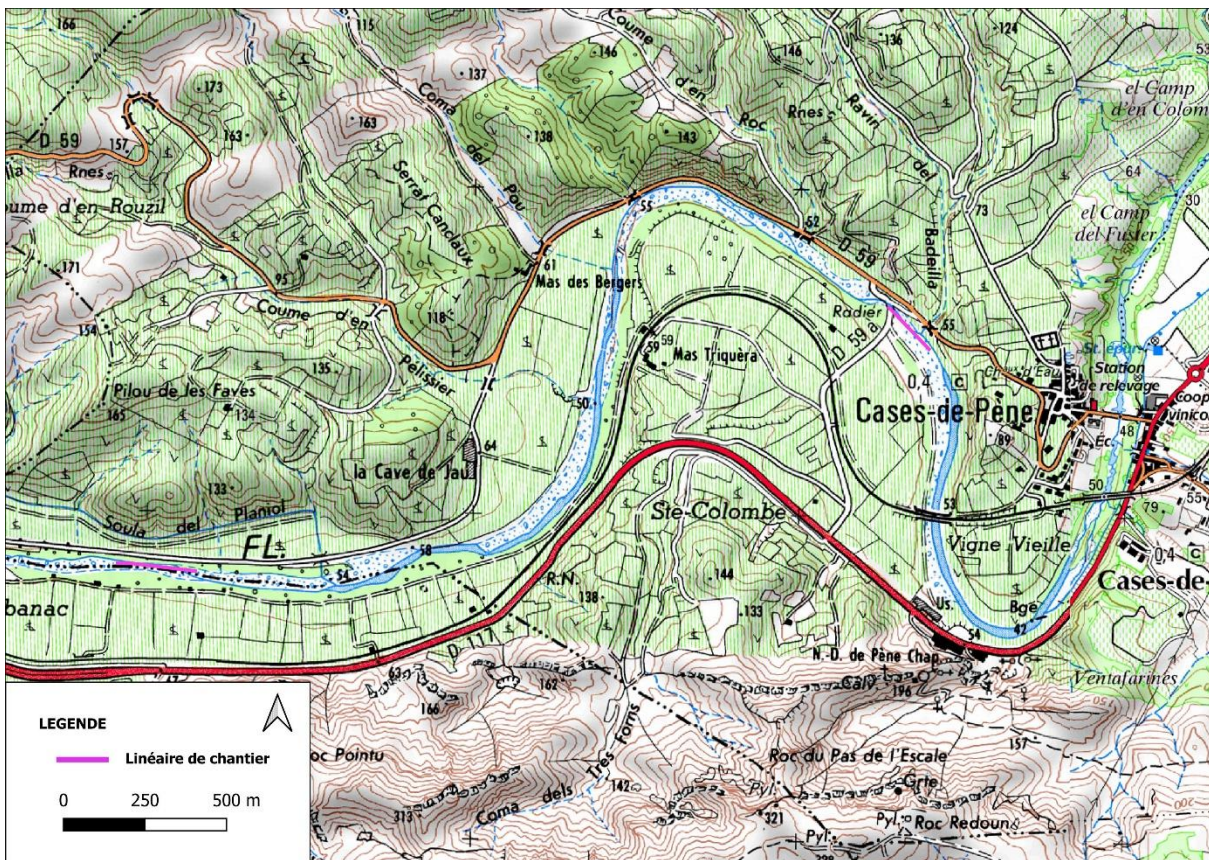


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier du Ruisseau de Cassagnes

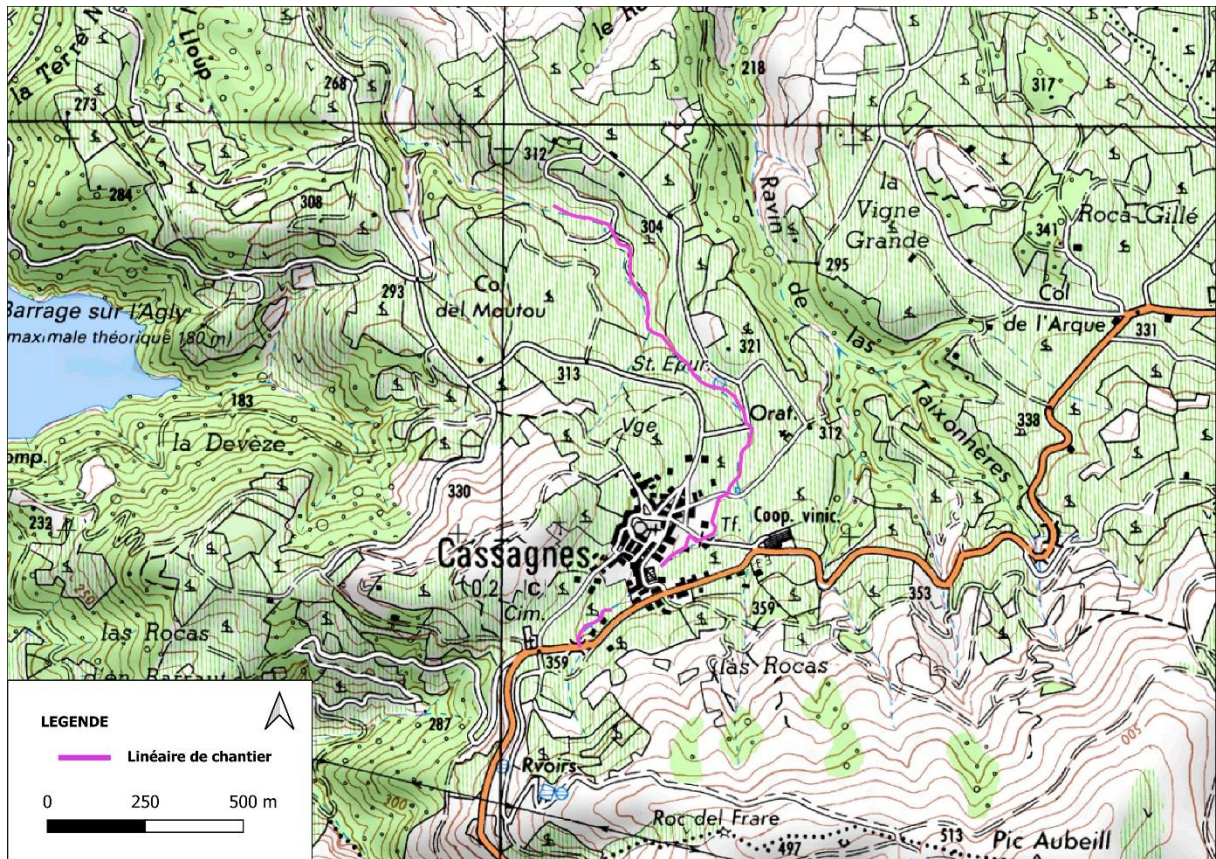


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier de l'Agly à Espira-de-l'Agly

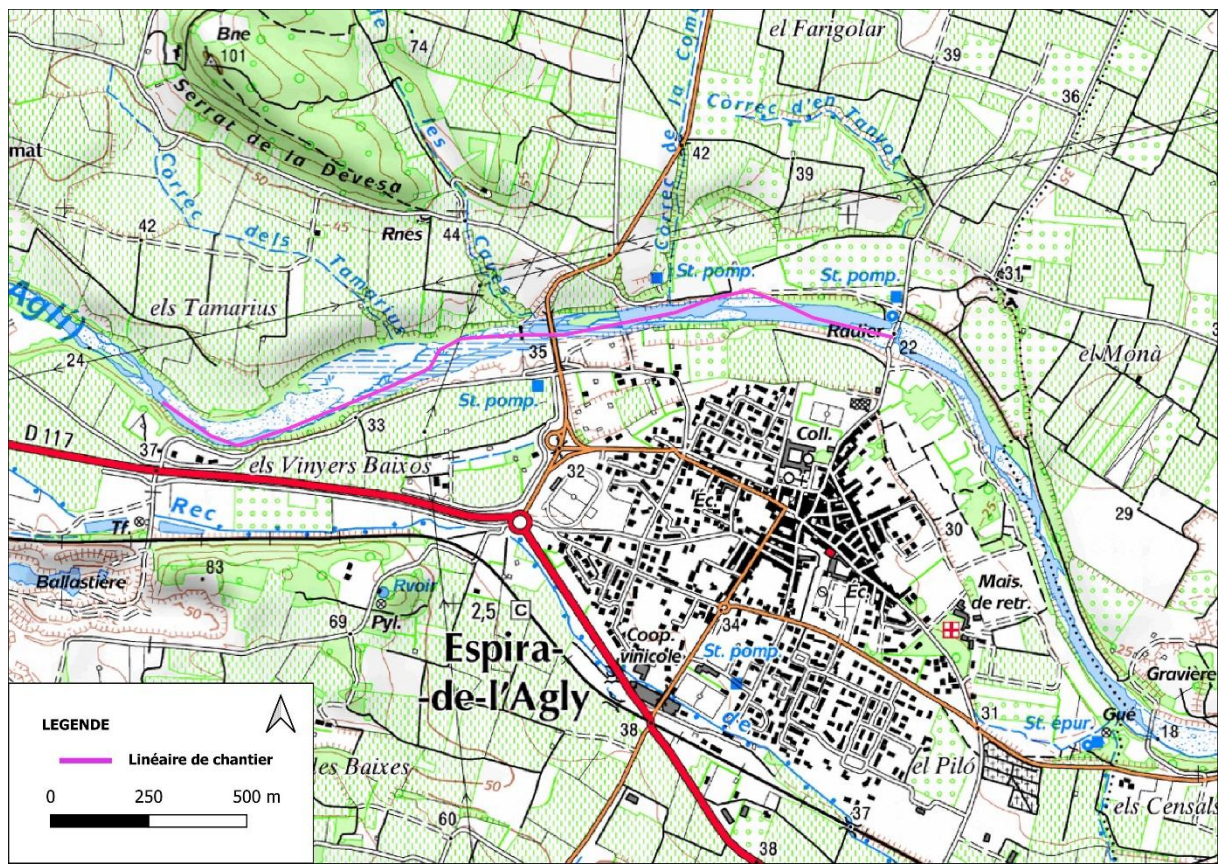


Cartographie du linéaire de chantier




Photographies avant et après travaux

○ Chantier du Llinas à Estagel

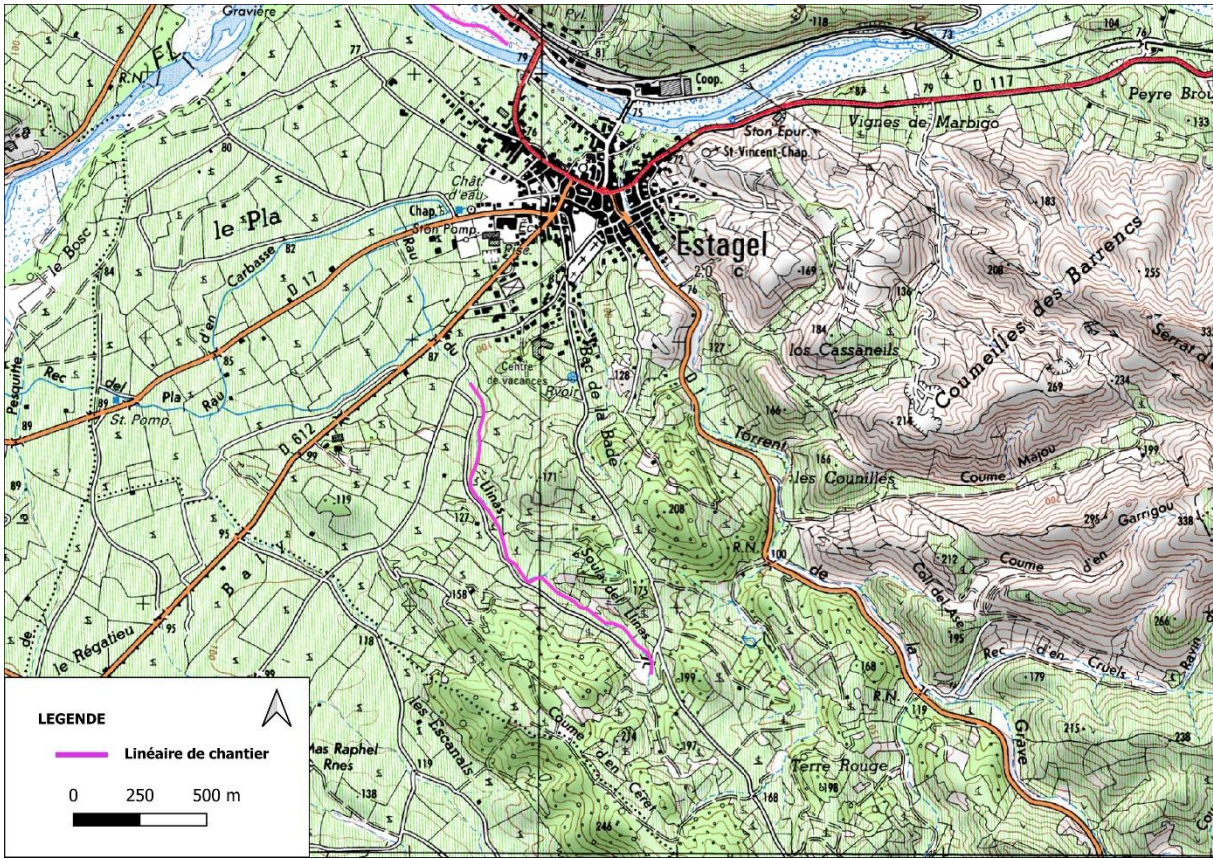


Cartographie du linéaire de chantier

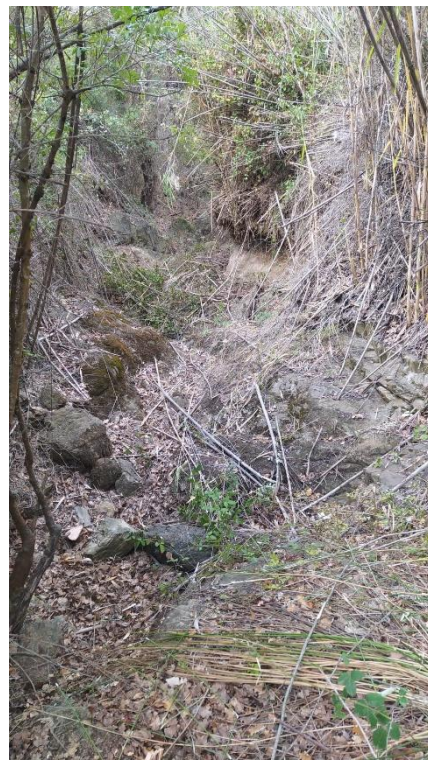

Photographies avant et après travaux

○ Chantier de l'Agly et du Maury à Estagel

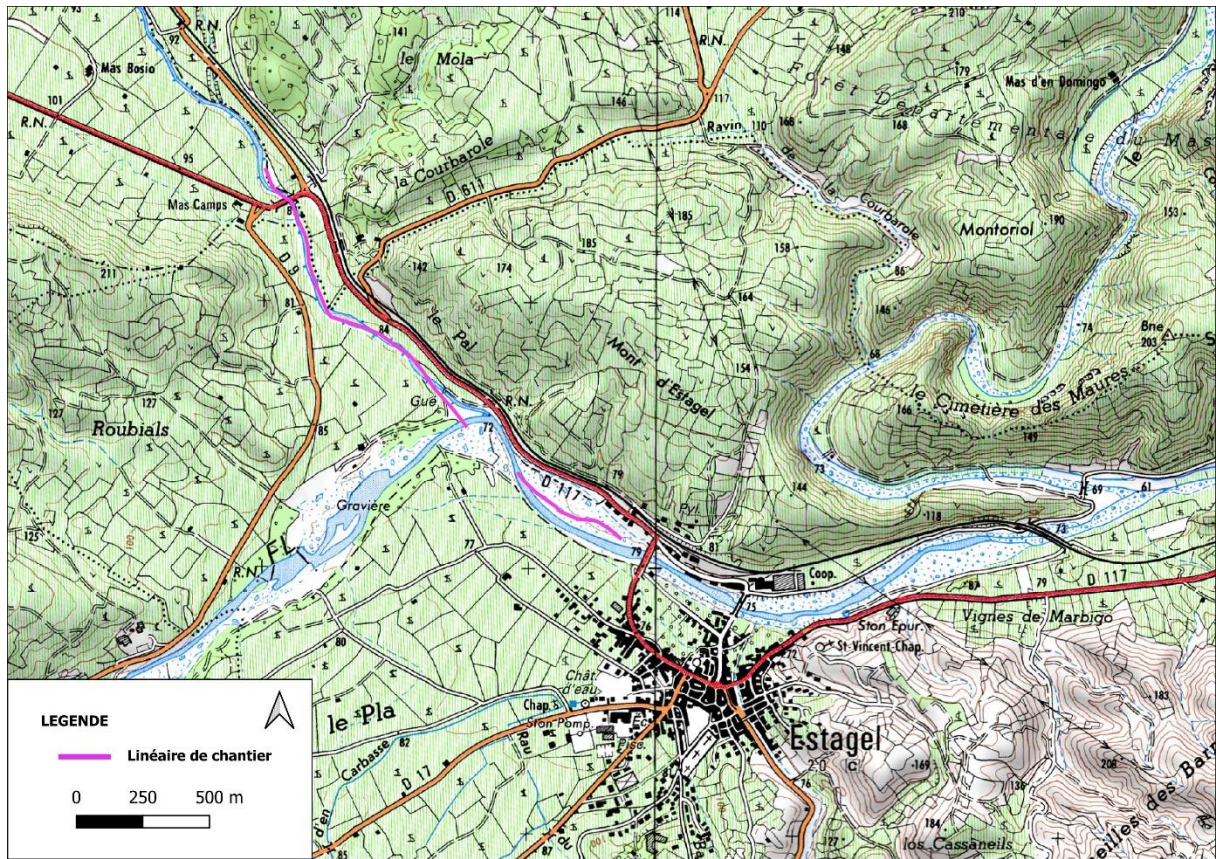


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier de l'Agly à Latour-de-France

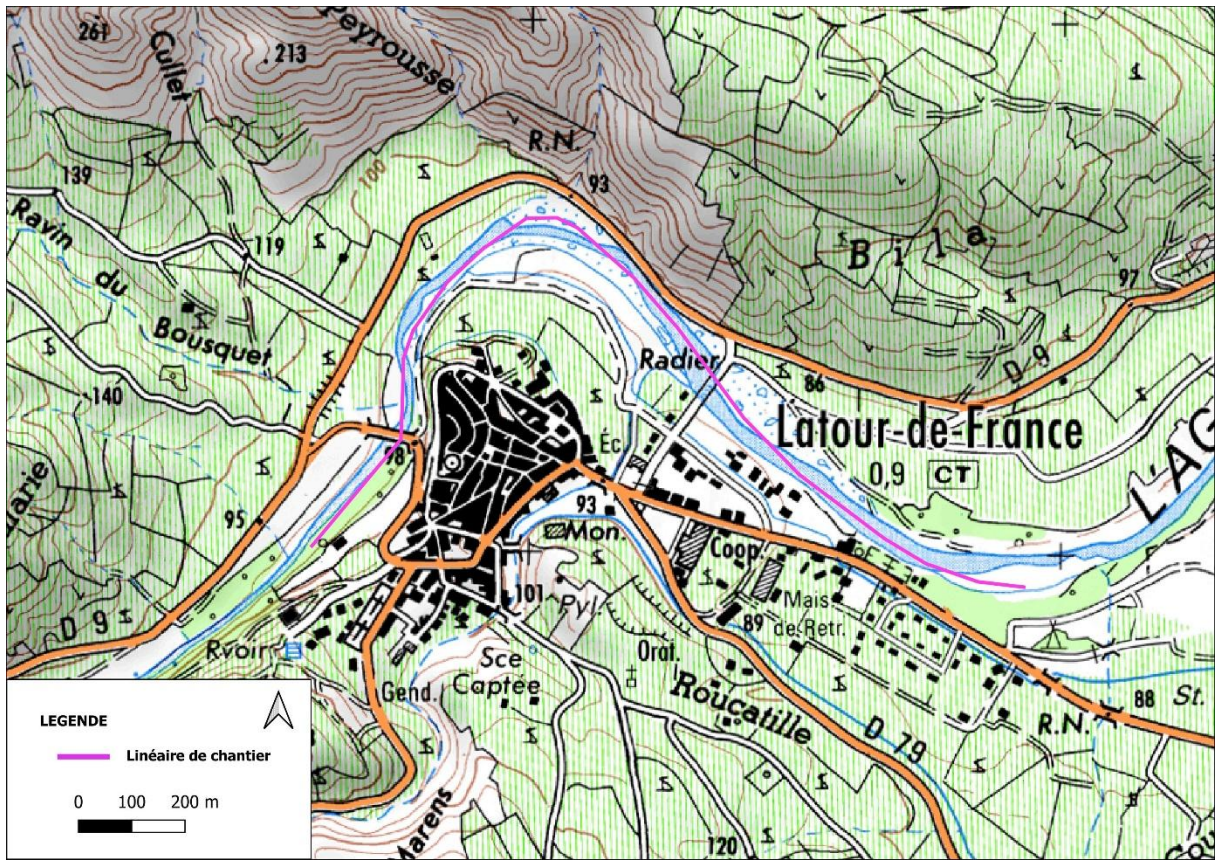


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier du Maury à Maury

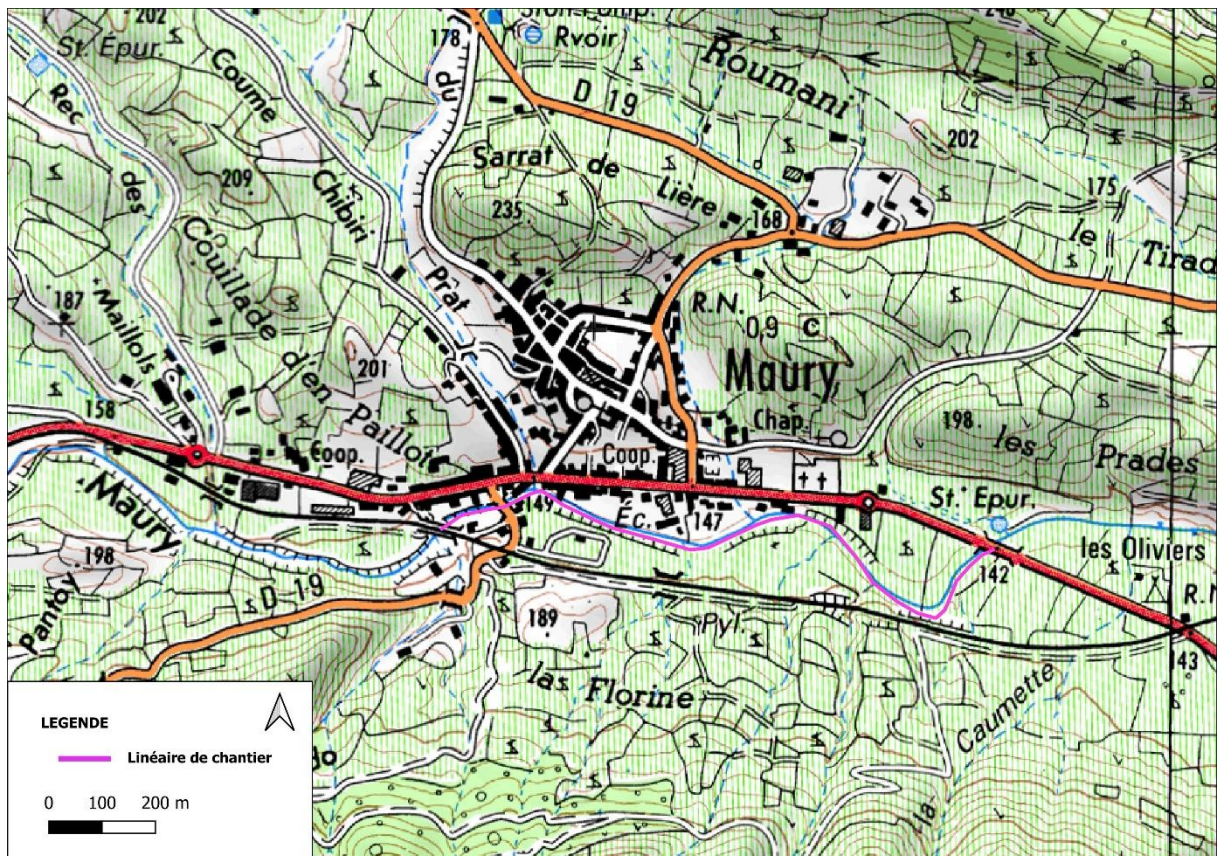


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier des Correcs de Peyrestortes

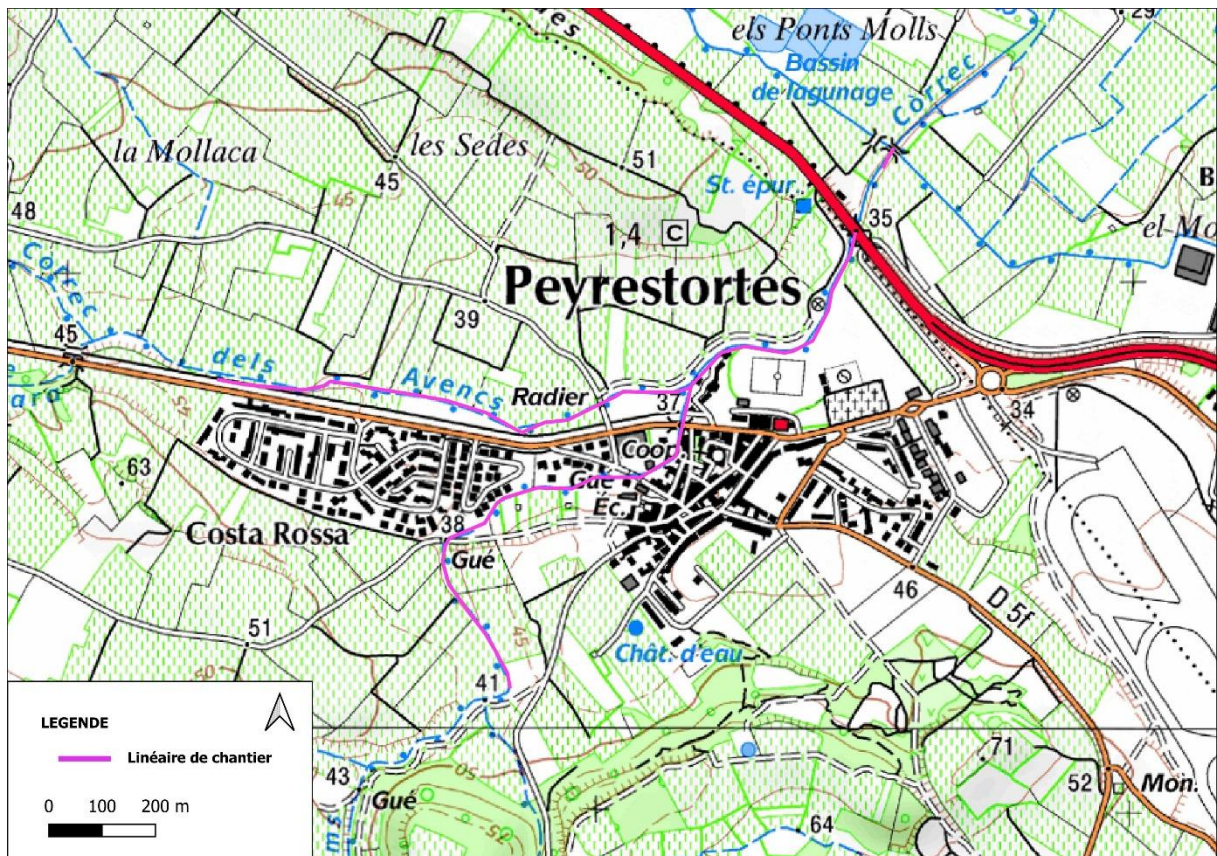


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier de l'Agly à Planèzes

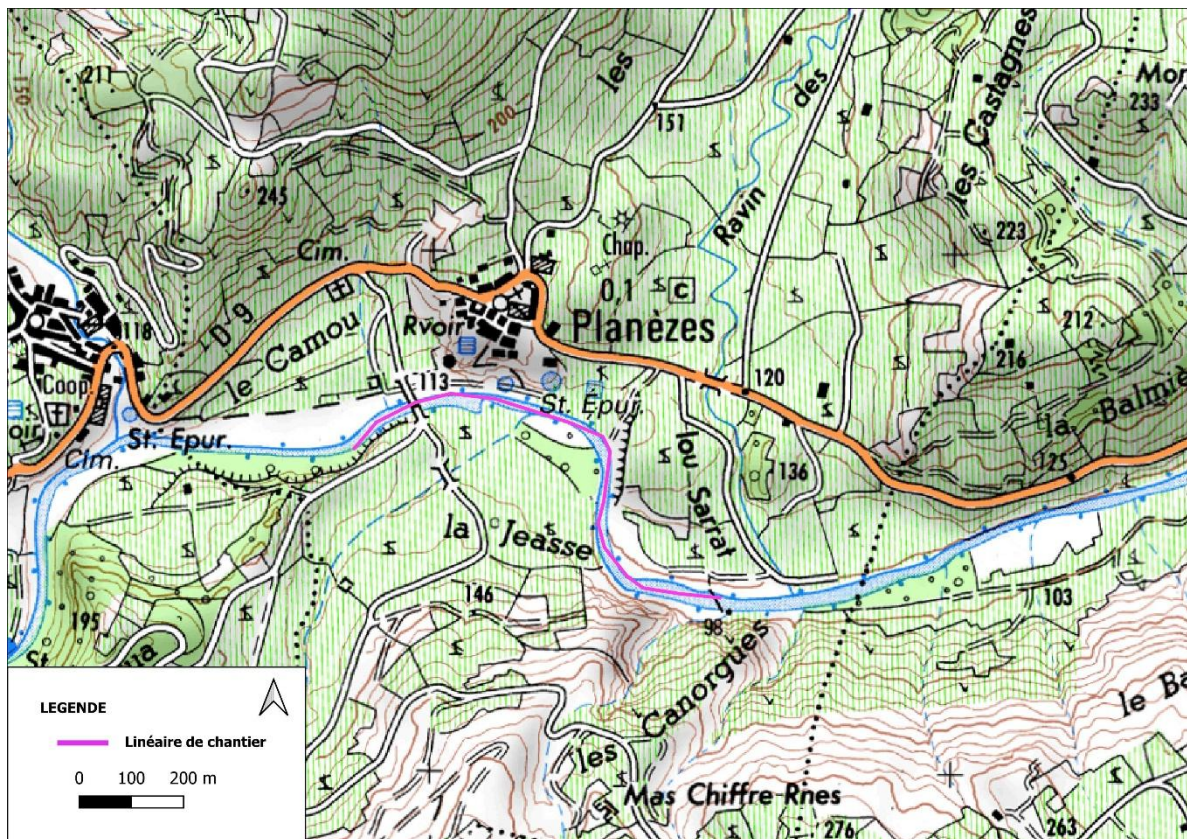


Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux

○ Chantier de l'Agly, la Llobère et le Roboul à Rivesaltes

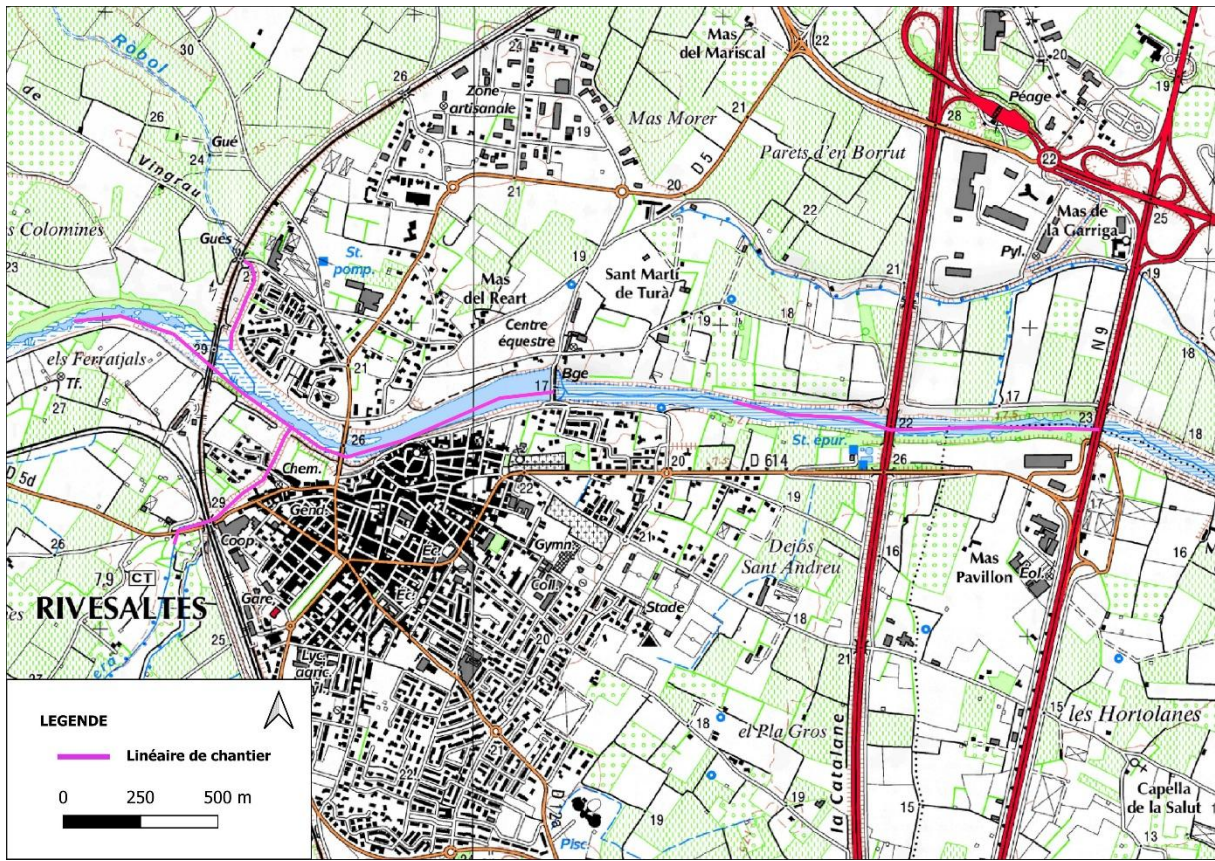

Cartographie du linéaire de chantier




Photographies avant et après travaux sur l'Agly



Photographies avant et après travaux sur la Llobère

- Chantier de du Verdoble, la Coumija et le ruisseau de Vingrau à Tautavel

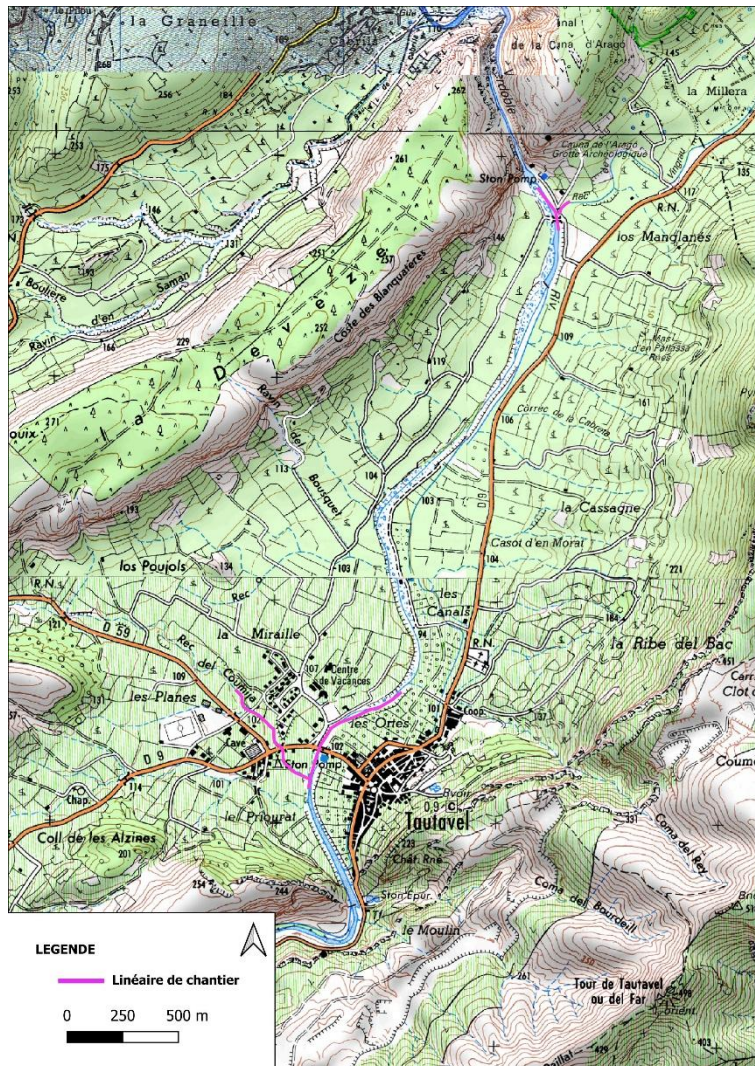

Cartographie du linéaire de chantier



Photographies avant et après travaux
