


N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Noms ressources	Tri 1, 2018				Tri 2, 2018		Tri 3, 2018			Tri 4, 2018		
						Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov
1	Période possible pour la réalisation des travaux vis-à-vis des enjeux environnementaux	87 jours	Ven 01/06/18	Dim 30/09/18													
2																	
3	COPIL	0 jour	Mer 24/01/18	Mer 24/01/18	COPIL												
4	Remise rapport PRO définitif	0 jour	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	SCP												
5	Finalisation des dossiers réglementaires	20 jours	Mer 31/01/18	Mar 27/02/18	SCP												
6	Dépôt des dossiers réglementaires	0 jour	Mar 27/02/18	Mar 27/02/18	ASA des Listes												
7	Instruction des dossiers réglementaires	50 jours	Mer 28/02/18	Mar 08/05/18	Autorité environnementale												
8	Obtention des autorisations réglementaires	0 jour	Mar 08/05/18	Mar 08/05/18	Autorité environnementale												
9	Consultation pour les travaux (procédure adaptée)	15 jours	Mer 09/05/18	Mar 29/05/18	ASA des Listes												
10	Choix de l'entreprise, période de préparation, réalisation des travaux	10 jours	Mer 30/05/18	Mar 12/06/18	Entreprise												



Projet : Planning Seuil Pesquier
Date : Mer 17/01/18

Tâche

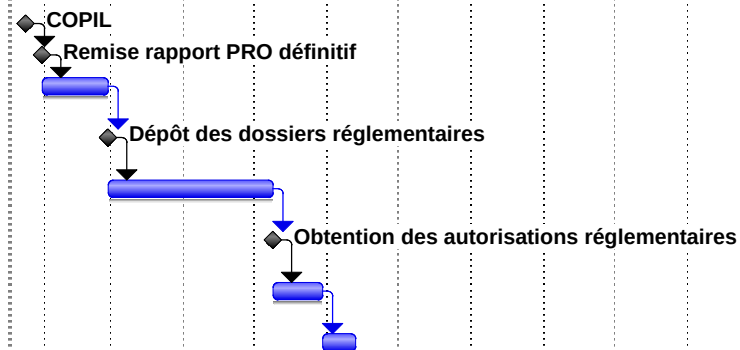

Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement



Récapitulatif du projet



Échéance

